

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1146	Chief of Operations Validation Date	10/25/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Neighborhood Improvement Program III	Loan Number	4651/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	ADLER, VERONICA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Falta de documentación que evidencia la gestión socioambiental. La UCP no cuenta con los especialistas necesarios para gestionar los aspectos sociales del Programa y no se realiza una adecuada articulación con los equipos sociales territoriales (pertenecientes a los gobiernos departamentales) El Programa carece de un Plan de Comunicación Social que permita tener una comunicación adecuada con la población beneficiaria que se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Existen sitios con suelos contaminados con plomo donde es necesario realizar medidas de remediación y en algunos casos realojos y estos no se han ejecutado. Retrasos significativos en la implementación de realojos que involucran a 840 familias aproximadamente.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1146	70,000,000	70,000,000	30,000,000	0	100,000,000	70,000,000	2,055,000	2.94%	67,945,000
Aggregated	70,000,000	70,000,000	30,000,000	0	100,000,000	70,000,000	2,055,000	2.94%	67,945,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

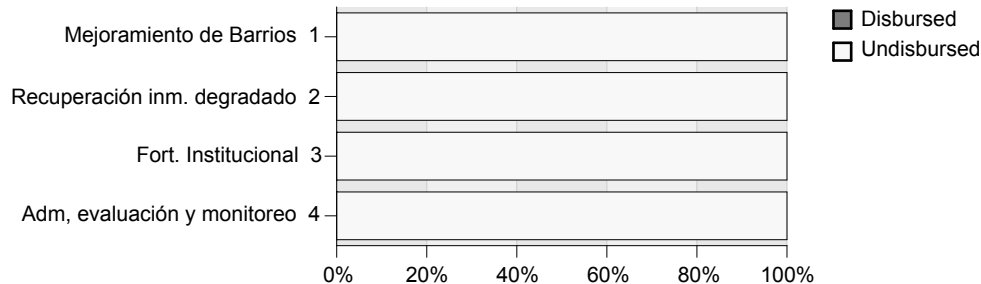

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Indicadores de Impacto

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Diferencial del logaritmo del precio del metro cuadrado promedio estimado en las viviendas del entorno de los asentamientos tratados y no tratados	%	0.00	2018	2025	P	6.00
						A	

Details

Means of verification: Evaluación de impacto del programa (Plan de Monitoreo y Evaluación).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)	No		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Diferencial del logaritmo del precio promedio de venta de las viviendas antes y después en los asentamientos tratados	%	0.00	2018	2025	P	20.00
						A	

Details

Means of verification: Censos de inicio-cierre.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)	No		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Hogares que consideran que el barrio es un lugar bueno para vivir	%	59.00	2018	2025	P	67.00
						A	

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Means of verification: Encuesta de censo de inicio y de cierre.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
Objective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Existencia de un programa de vivienda pública en alquiler a nivel nacional	Programa	0.00	2018	2025	P	1.00
						A	

Details

Means of verification: El objetivo es mostrar si el piloto fue tomado en cuenta para expandir la iniciativa en mayor escala. La lógica del piloto es ensayar en un marco reducido y bajo una mirada atenta una nueva forma de acceso a la vivienda para sectores de bajos ingresos, poniendo a prueba la capacidad del estado de ejecutar y sobre todo gestionar el sistema.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
Objective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivos de evaluabilidad 1. Integración urbana: infraestructura básica, equipamientos urbanos y equipamientos sociales con consideraciones de cambio climático

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
0.0	Porcentaje de viviendas que toman el agua para beber y cocinar de la red general, por cañería dentro de la vivienda y con servicio en forma regular del OSE respecto al total de las viviendas censados en los asentamientos intervenidos	%	55.00	2018	P			81.00
					A			

Details

Means of verification: Levantamientos de los censos de inicio y de cierre del programa (preguntas de la sección 2. DATOS DE LA VIVIENDA 12,13 y 14 con código de respuesta =1).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
0.2	Porcentaje de viviendas con servicio intradomiciliario formal de saneamiento	%	20.00	2018	P			95.00
					A			

Details

Means of verification: Levantamientos de los censos de inicio y de cierre del programa (preguntas de la sección 2. DATOS DE LA VIVIENDA 18, 19 y 20 con código de respuesta =1).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
0.3	Porcentaje de viviendas que cuenta con servicio de electricidad formal de UTE respecto al total de las viviendas censadas en los asentamientos intervenidos	%	43.00	2019	P			88.00
					A			

Details

Means of verification: Levantamiento de los censos de inicio y cierre del programa (pregunta de la sección 2. DATOS DE LA VIVIENDA 17=1).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
0.4	Porcentaje de hogares en los asentamientos que reportan haber usado al menos uno de los equipamientos barriales construidos por el programa al menos una vez en el último mes	%	0.00	2018	P			30.00
					A			

Details

Means of verification: Relevamiento para la evaluación de cierre del programa.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
0.6	Porcentaje de hogares en los asentamientos que reportan haber usado al menos uno de los espacios públicos construidos por el programa al menos una vez en el último mes	%	0.00	2018	P		30.00
					A		

Details

Means of verification: Relevamiento para la evaluación de cierre del programa

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
0.6	Número de medidas de mitigación y adaptación reportadas en el marco de la Contribución Determinada a Nivel Nacional que la entidad ejecutora reportara ante la Dirección de Cambio Climático del MVOTMA	# medidas de mitigación	0.00	2018	P		10.00
					A		

Details

Means of verification: Contabilidad de cambio climático (EEO#7)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo de evaluabilidad 2. Garantía de tenencia segura

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
1.0	Porcentaje de viviendas que reportan haber realizado reformas o mejoras en el último año en la vivienda o en el terreno (no financiadas por ningún programa)	%	45.00	2018	P		55.00
					A		

Details

Means of verification: Línea de base (LB) censo de inicio de la muestra y para el resultado final censo de cierre.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
1.2	Porcentaje de viviendas que reportan que disponen de heladera y calentador de agua	%	51.00	2018	P		81.00
					A		

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Para la LB es el levantamiento de la muestra, y para la meta final es el censo de cierre.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo de evaluabilidad 3. Mejora del capital social

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
2.0	Porcentaje de hogares que reportan que la relación entre los vecinos del asentamiento es buena o muy buena	%	64.00	2018	P			78.00
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de censo inicial y final de los asentamientos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
2.2	Porcentaje de hogares que reportan que el barrio es seguro o muy seguro	%	27.00	2018	P			30.78
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de censo inicial y final de los asentamientos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
2.2	Porcentaje de mujeres que reportan que el barrio es seguro o muy seguro sobre el total de mujeres que responden	%	0.00	2018	P			30.78
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de censo inicial y final de los asentamientos

Observations: Se planea levantar la información en los relevamientos de inicio de los asentamientos por intervenir.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: Objetivo de Evaluabilidad 4. Prevención de conformación de nuevos asentamientos con enfoque social

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
3.0	Porcentaje de hogares que habitan en las viviendas del programa después de seis meses, sobre el total de hogares a los que se les asignó	%	0.00	2018	P			100.00
					A			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	una vivienda	%	0.00	2018				
Details								
Means of verification: Evaluación de procesos del programa con base a [fuente]								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2026	EOP 2024
3.2	Porcentaje de morosidad en el pago de alquiler después de seis meses del total de hogares a los que se les ofreció la vivienda.	%	0.00	2018	P			10.00
					A			
Details								
Means of verification: Evaluación de procesos del programa con base a datos del Fondo de Garantía de Alquileres de DINAVI.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Mejoramiento de Barrios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
1.1	Número de anteproyectos integrales aprobados	# API	P	0	2	876,000	3,338,000
			P(a)	0	2	0	199,000
			A	0	0	0	0
1.2	Número de proyectos ejecutivos diseñados y aprobados	# PE	P	0	2	0	2,798,000
			P(a)	0	2	0	199,000
			A	0	0	0	0
1.3	Número de proyectos ejecutivos con obras iniciadas	#PE	P	4	14	8,417,000	75,784,000
			P(a)	1	12	605,000	28,533,338
			A	1	2	7,693	1,172,031
1.4	Proyectos de Mejoramiento de Barrios ejecutados	#PE	P	0	14	126,000	881,000
			P(a)	0	5	0	240,000
			A	0	0	0	0
1.5	Fondos de iniciativa barrial realizados	# fondos aproba-dos	P	3	14	66,000	275,000
			P(a)	2	9	129,000	339,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente II. Proyecto Piloto de Recuperación de Inmuebles Degradados en Áreas Centrales con Enfoque Social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
2.1	Proyectos Ejecutivos de Recuperación de inmuebles Aprobados	#PE	P	1	3	4,188,000	4,497,000
			P(a)	0	3	0	651,000
			A	0	0	0	0
2.2	Obras finalizadas	#Obras	P	0	3	0	5,455,000
			P(a)	0	1	0	1,164,000
			A	0	0	0	0
2.3	Diseño de los Modelos de Gestión de Alquileres finalizados	#Modelos	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
2.4	Número de unidades alquiladas por año.	# unidades	P	0	68	0	0
			P(a)	0	68	0	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2024	2021	EOP 2024
3.1	Número de talleres de capacitación realizados en la unidad ejecutora	# talleres	P	2	14	6,000	42,000
			P(a)	0	10	0	10,000
			A	0	0	0	0
3.2	Personas del organismo ejecutor capacitadas en temas de género	personas	P	0	45	0	0
			P(a)	0	45	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	Número de técnicos contratados	# contratos	P	65	390	1,201,000	6,930,000
			P(a)	0	100	0	1,561,000
			A	0	0	0	0
3.4	Página web reformulada y mostrando información básica a nivel de cada proyecto	# web	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración y monitoreo	P				
		P(a)			5,000	4,310,392
		A			341	733

Total Cost

	Total Cost	P			14,880,000	100,000,000
		P(a)			739,000	37,206,730
		A			8,034	1,172,764

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Número de proyectos ejecutivos con obras iniciadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	SOFIAH	10/21/2021
			Modify Financial Historical Actual	SOFIAH	10/21/2021

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Sustainability
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Political Environment
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		EXPLOIT	ACTIVE
	2.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation
