


# PMR Public Report

Operation Number	AR-L1258	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/08/22
Last Update	04/05/22	Country Representative Validation Date	05/04/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Water and Sanitation Services Development Program – Belgrano Plan	Loan Number	4312/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
	, MINISTERIO DEL INTERIOR		
Team Leader	GONNELLI, GUSTAVO VICTOR	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras en ejecución no cuentan con un Programa de información y consulta acordado ni que tenga la NO del Banco. Tampoco cuentan con un Programa de similares características para la gestión de quejas y reclamos.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1258	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	19,818,872	9.91%	180,181,128
Aggregated	200,000,000	200,000,000	70,000,000	0	270,000,000	200,000,000	19,818,872	9.91%	180,181,128
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

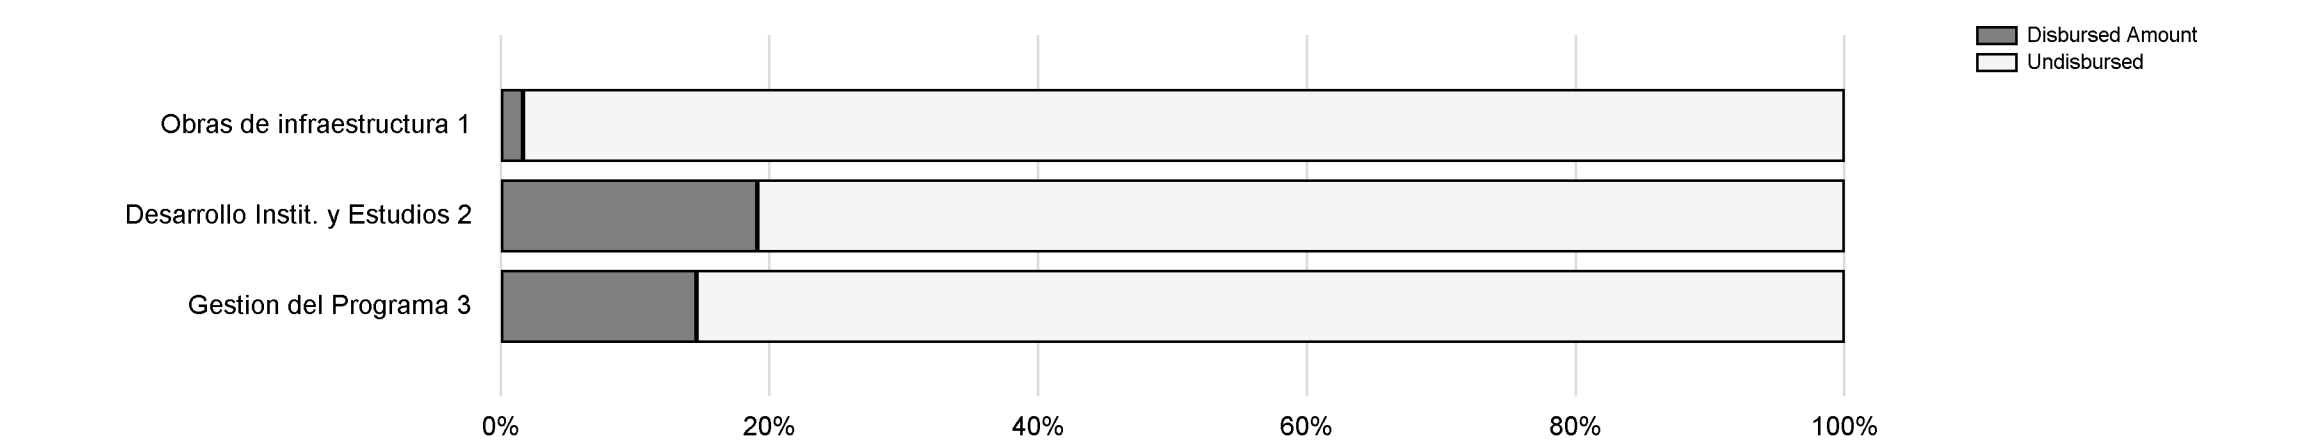

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Mejora de la Salud y el Bienestar de la Población

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	Incidencia de diarreas agudas en provincias del Plan Belgrano.	3415	2017	2023	P	2,732
						A	3,415

Details

Means of Verification: Boletín integrado de vigilancia de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Ministerio de Salud de la Nación.

Observations: Ninguna

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 1: Cobertura del servicio de agua potable ampliada												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Hogares con nuevo acceso a sistemas de agua potable por red en la región del Plan Belgrano.	# of households	0	2017	P	-	-	-	-	-	1,500	1,500
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto												
Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
0.1	Cobertura de agua potable en la región del Plan Belgrano.	%	92.4	2010	P	-	-	-	-	-	92.47	92.47
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 2: Cobertura del servicio de saneamiento ampliada												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Hogares con acceso a nuevas redes cloacales en la región del Plan Belgrano	# of households	0	2016	P	-	-	-	8,750	14,500	29,000	29,000
					A	-	-	-	-	24,241	-	-
Details												
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto;												
Observations: se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.1	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en la región del Plan Belgrano	Households (#)	100000	2017	P	-	-	-	200,000	219,000	219,000	219,000
					A	-	-	-	-	4,762	-	-
Details												
Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto												
Observations: Se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra, se reportará globalmente.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()							

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
1.2	Cobertura de saneamiento en la región del Plan Belgrano.	%	46.7	2010	P	-	-	-	-	48.14	-	48.14
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de Evaluación final del proyecto en base a datos de Censo de Población y Vivienda y Encuestas Permanentes de Hogares del INDEC

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Aguas de Formosa	%	87	2016	P	-	-	-	-	-	110	110
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.1	Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración). Agua Potable de Jujuy	%	92.7	2017	P	-	-	-	-	-	99.8	99.8
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2023	EOP 2023
2.2	Cobertura de micromedición en la región del Plan Belgrano (Hogares con micromedidores de agua instalados y en funcionamiento / Total de hogares con servicio de agua potable por red)	%	41	2016	P	-	-	-	-	41.3	-	41.3
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de evaluación final.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Obras de infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Sistemas de agua potable construidos	Sistema	P	-	1	8,021,538	15,000,000
			P (a)	-	1	8,021,538	15,000,000
			A	-	-	-	-
1.02	Sistemas de Saneamiento Construidos	Sistema	P	5	5	86,785,683	232,000,000
			P (a)	-	11	714,278	232,000,000
			A	1	1	4,086,871.53	4,579,238.74

Component Nbr. 2 Componente 2: Desarrollo institucional y estudios

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	No. de Planes	P	2	4	-	5,325,000
			P (a)	1	3	1,171,246.5	5,655,899.44
			A	-	2	-	5,655,899.44
2.02	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de micromedidores	P	11,250	25,000	4,500,000	9,675,000
			P (a)	5,625	25,000	1,537,500	9,344,100.56
			A	-	-	-	-
2.03	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	No. de macromedidores	P	72	160	2,250,000	5,000,000
			P (a)	36	160	431,250	5,000,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administracion del programa	P	300,000	1,500,000
		P (a)	300,000	1,499,999.6
		A	535,974.77	884,665.2
	Monitoreo, Evaluación y Auditorías	P	400,000	1,500,000
		P (a)	400,000	1,500,000.4
		A	246,134	246,134
Total Cost				
	Total Cost	P	102,257,221	270,000,000
		P (a)	12,575,812.5	270,000,000
		A	4,868,980.3	11,365,937.38

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Actividades realizadas por los prestadores priorizadas en los Planes de Gestión por Resultados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNACIOSA	3/23/2022
			Modify Financial Historical Actual	IGNACIOSA	3/23/2022
	Macromedidores instalados instalados en la región del Plan Belgrano.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNACIOSA	3/3/2022
	Micromedidores instalados en la región del Plan Belgrano.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNACIOSA	3/3/2022
	Sistemas de Agua Potable Construidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNACIOSA	3/23/2022
	Sistemas de Saneamiento Construidos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	IGNACIOSA	3/23/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	IGNACIOSA	3/23/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Active		Planning		
	Response Actions				
	1.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Sustainability
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Sustainability
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
10	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	10.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	



IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
