


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	04/17/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/22/22
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	04/25/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O Executor segue com dificuldades de engajamento das equipes sociais locais que implementam e acompanham as ações de reassentamento e pós reassentamento dos projetos em curso, o que representam um total de 465 famílias, especificamente as equipes dos CRAS municipais que priorizam as demandas ligadas à pandemia de covid-19 nos municípios. Da mesma forma, permanece a dificuldade de monitorar a implantação dos requisitos ambientais e sociais pelas empresas executoras, gerando o não cumprimento de medidas de boas práticas ambientais nas frentes de obras, tais como: gestão de resíduos, correção de processos erosivos e isolamento de áreas em obras. A implementação de medidas corretivas aos processos de erosões de solo que requerem novas soluções construtivas, exigem que o Executor defina e implemente um Plano de Ação bem alinhado entre equipes de obras e sociais para a conclusão a contento das obras e das etapas do reassentamento. Considerando a permanência das dificuldades já apontadas em outras missões - dificuldade de monitoramento dos aspectos ambientais e sociais, dificuldade de engajamento com as equipes municipais – e considerando-se a situação dos processos erosivos de solo em curso que ainda requerem solução, classifica-se a operação como Parcialmente Insatisfatória.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	35,866,000	0	95,866,000	60,000,000	54,552,746.82	90.92%	5,447,253.18
Aggregated	60,000,000	60,000,000	35,866,000	0	95,866,000	60,000,000	54,552,746.82	90.92%	5,447,253.18
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

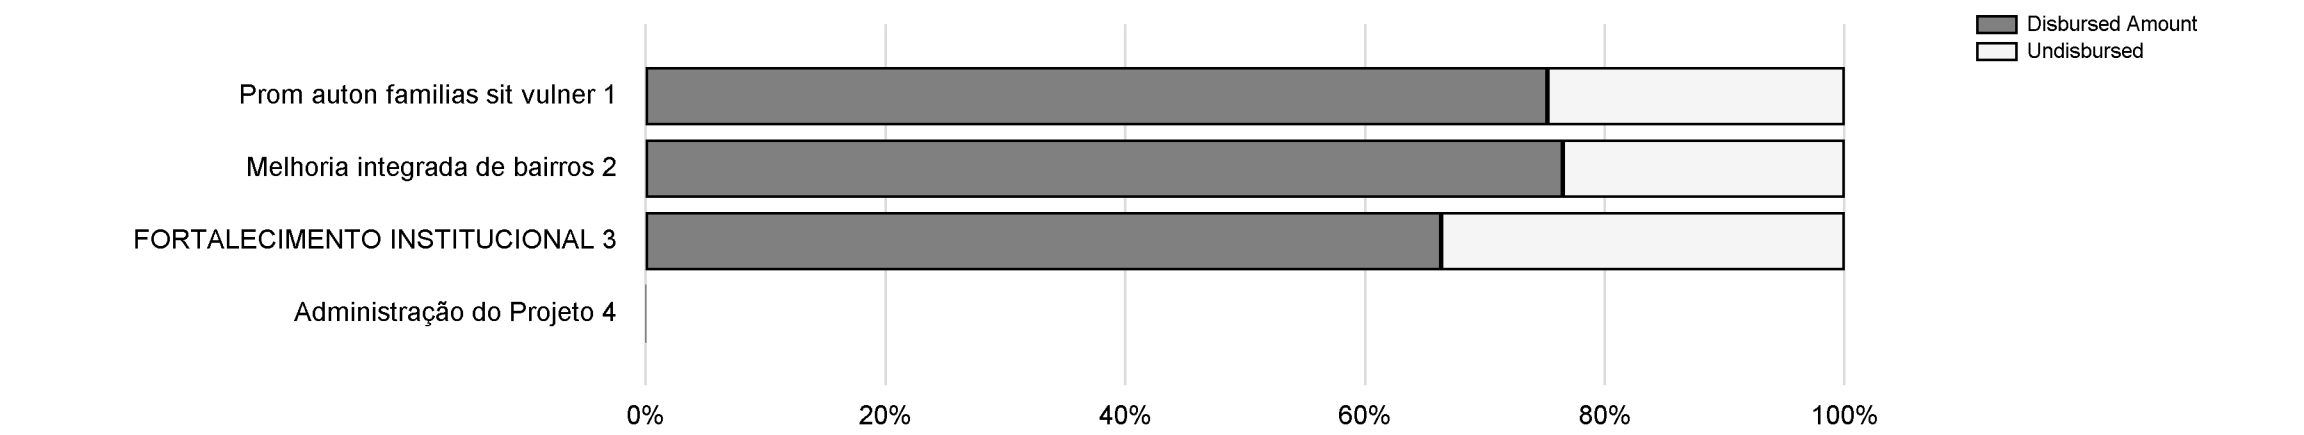

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 0: Condiçao de vida das familias mediante acoes do Governo melhoradas							
Observation:							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2023
0.0	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	%	30	2016	2022	P	60
						A	-
Details							
Means of Verification: Sistema de informação do Programa							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria			%	53	2016	2022	P	68.9
								A	-
Details									
Means of Verification: Sistema de informação do Programa									

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Familias vulneraveis melhorado

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Familias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%	0	2014	P	-	-	-	-	60
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de informação do Programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%	0	2014	P	-	-	-	-	60
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de informação do Programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%	0	2014	P	-	-	-	-	50
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de informação do Programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30	2014	P	-	-	-	-	100
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Relatorio semestral do Programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a água potável no domicílio	%	50	2014	P	-	-	-	-	100
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Relatório semestral do Programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Participantes da capacitação sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0	2014	P	-	-	-	-	90
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Testes de conhecimento

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	# of beneficiaries	P	-	22,000	-	14,410,366
			P (a)	800	23,735	1,032,194.33	10,084,484.29
			A	1,364	23,735	560,542.04	10,084,484.29
1.02	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	municípios	P	-	130	-	8,774,200
			P (a)	-	130	-	11,074,356.77
			A	24	-	286,833.8	11,074,356.77
1.03	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P	-	53	-	10,781,000
			P (a)	53	53	1,000,000	9,889,482.4
			A	67	406	245,424.11	9,889,482.4
1.04	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	famílias	P	-	40,000	-	10,000,000
			P (a)	20,000	40,000	650,000	14,791,103.75
			A	11,196	-	393,208.54	14,791,103.75
1.05	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	# of beneficiaries	P	-	3,480	-	2,522,478
			P (a)	900	3,480	100,000	706,088.81
			A	21	2,598	2,745.74	549,211.34
1.06	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P	-	5,600	-	7,256,760
			P (a)	70	6,294	600,197.53	4,989,060.77
			A	776	6,294	684,657.53	4,853,205.52
1.07	Familias participantes de novos projetos de inclusao socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Familias	P	-	560	-	2,522,154
			P (a)	560	560	448,000	449,717.74
			A	270	270	209,708.74	209,708.74
1.08	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	# of beneficiaries	P	-	-	-	-
			P (a)	150,000	150,000	4,500,000	4,500,000
			A	89,996	89,996	1,430,862.47	1,430,862.47
1.09	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	municípios	P	-	-	-	-
			P (a)	-	242	-	1,985,175.83
			A	-	242	-	1,985,175.83
1.10	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	Capacitações	P	-	-	-	-
			P (a)	2,500	3,500	440,000	622,529.64
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P	-	594	-	17,940,000
			P (a)	249	917	3,800,000	14,159,664.76
			A	301	846	4,831,649.72	13,076,850.56
2.02	Lotes regularizados	Lotes	P	-	328	-	6,560,000
			P (a)	188	535	2,940,000	14,359,904.31
			A	208	261	3,409,446.41	11,223,637.51
2.03	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P	-	22	-	6,361,544
			P (a)	2	22	375,000	3,647,251.71
			A	1	13	202,195.74	3,133,755.72
2.04	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P	-	8	-	3,238,498
			P (a)	1	8	166,000	1,704,179.22
			A	1	6	56,009.61	1,458,797.19

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
3.01	Investigações e estudos realizados	Estudos	P	-	7	-	1,620,000
			P (a)	1	7	35,900	368,830.72
			A	1	6	34,177.88	306,039.72
3.02	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P	-	12,300	-	2,113,000
			P (a)	1,000	12,300	524,060.3	1,945,403.16
			A	1,914	7,982	533,777.91	1,532,778.07
3.03	Módulos do Sistema de informações Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P	-	6	-	900,000
			P (a)	1	7	87,647.29	588,766.12
			A	1	6	17,413.37	329,766.12

Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Administração	P		4,000,000
		P (a)	0	0
		A		0
	Contingencia	P		1,000,000
		P (a)	0	0
		A		0
Total Cost				
	Total Cost	P		100,000,000
		P (a)	16,698,999.45	95,866,000
		A	12,898,653.61	85,929,216

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	CREAS construidos e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/16/2022
	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/14/2022
	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	FOCHOA	3/17/2022
	Famílias participantes de novos projetos de inclusao socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/16/2022
	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/14/2022
	Investigações e estudos realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/16/2022
	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	3/14/2022
	Participantes do Programa Capacitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/16/2022
	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	FOCHOA	3/17/2022
	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/16/2022
	Planos de Ação Familiar pactuados com a familia beneficiaria elaborados	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	FOCHOA	3/17/2022
	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/16/2022
	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/14/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Technical Design
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	8.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
