


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1487	Chief of Operations Validation Date	04/17/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/18/22
Last Update	03/25/22	Country Representative Validation Date	04/19/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Environmental Sanitation and Urban Development Program in the Mané Dendê River Basin	Loan Number	4302/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ? PMS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ? PMS		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Os documentos de planejamento social e ambiental estão aprovados, vigentes e em cumprimento, assim como o atendimento às legislações locais. O Programa iniciou a etapa 01 da obra, para a qual foram reassentadas 64 famílias. A PMS, buscando ocupar o Residencial Novo Mané Dendê já construído, avançou com o reassentamento de um total de 120 famílias oriundas das demais etapas de obras, que não contam com autorização para início de intervenção física. Essa decisão não reflete as melhores práticas, principalmente porque expõe o projeto a riscos de reocupação de áreas já desafetadas, representando um risco social e financeiro adicional a ser gerenciado pelo Programa. Não foram observados incumprimentos socioambientais diretamente nas frentes de obra em andamento.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1487	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	10,600,000	15.70%	56,900,000
Aggregated	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	10,600,000	15.70%	56,900,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

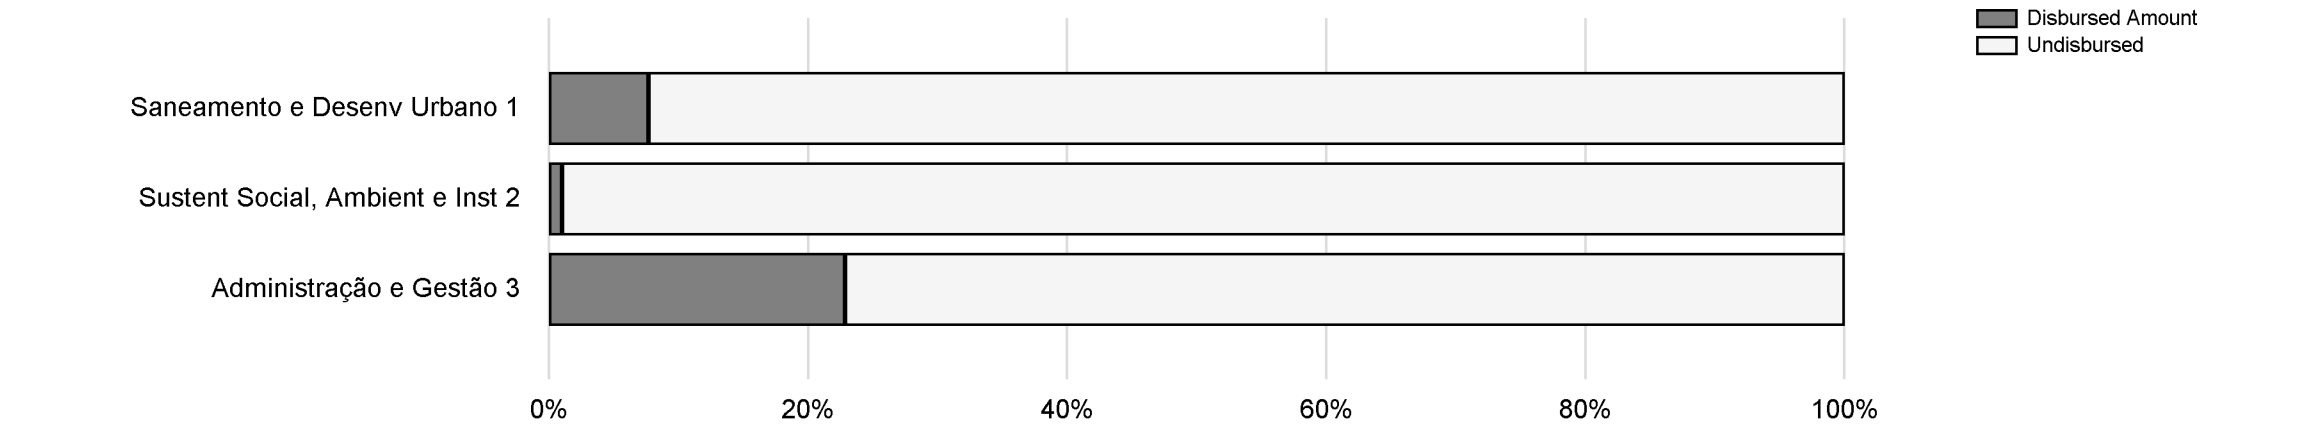

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir com a melhora do bem estar econômico e da qualidade de vida da população, por meio do melhoramento sustentável das condições socio-ambientais e de urbanização da bacia do Rio Mané Dendê

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Valor dos imóveis na área de intervenção	R\$/m²	750	2017	2023	P	937.5
						A	-

Details

Means of Verification: Dados Primários (investigação de campo)

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	Internações por ano por enfermidades diarréicas agudas (de transmissão hídrica) em menores de 5 anos (casa 100.000 habitantes) na área de intervenção do Programa e áreas vizinhas (Bairros: Itacaranha, Rio Sena, Alto da Terezinha e Plataforma)			Internações/ano	1483	2016	2023	P	300
								A	-
Details									

Means of Verification: Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica de Salvador

Observations: Responsável: SEINFRA através da Secretaria de Saúde.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX														
Specific Development Objectives														
Specific Development Objectives Nbr. 0: Risco de inundação e situação vulnerável reduzido na bacia do Rio Mané Dendê														
Observation:														
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.0	Residências inundadas na área de intervenção do Programa				# of households	290	2017	P	-	-	-	-	10	10
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Relatórios da Defesa Civil														
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.20.b Households with enhanced disaster and climate change resilience (# households) (C)									
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
0.1	Habitações habitadas em zona de deslizamento na área de intervenção do Programa				Habitações	107	2017	P	-	-	-	-	5	5
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Relatórios da Defesa Civil														
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
Specific Development Objectives Nbr. 1: Bacia do Rio Mané Dendê saneada social e ambientalmente														
Observation:														
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.0	Contribuições de águas residuais para o rio Mané Dendê				L/seg	10	2017	P	-	-	-	-	1	1
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Secretaria Municipal da Cidade Sustentável – SECIS														
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023	
1.1	Domicílios ligados a rede de esgotos na bacia do rio Mané Dendê				# of households	8256	2017	P	-	-	-	-	10,053	10,053
								A	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Relatórios da EMBASA														
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)									

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Resíduos sólidos coletados nos pontos de intervenção do programa piloto	t/dia	26	2016	P	-	-	-	-	21	21
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios da LIMPURB											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Resíduos sólidos recicláveis coletados nos pontos de intervenção do programa piloto	t/dia	1	2017	P	-	-	-	-	1.25	1.25
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios da LIMPURB											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Áreas recreativas estruturadas (praças, parques e paisagismo)	m2/hab	0.17	2017	P	-	-	-	-	.85	.85
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios de avanço do Programa											
Observations: A área considerada para linha base não considera os campos de futebol											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Famílias com acesso direto a novas vias na área do Programa	Famílias	0	2017	P	-	-	-	-	1,011	1,011
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios de avanço do Programa											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). Foram consideradas as famílias hoje existentes e que aumentarão com as famílias reassentadas.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.6	Famílias com acesso direto a vias melhoradas na área do Programa	Famílias	0	2017	P	-	-	-	-	1,854	1,854
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios de avanço do Programa											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). Foram consideradas as famílias hoje existentes e que aumentarão com as famílias reassentadas.											
Evaluation Methodology: -											

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.7	Índice de manutenção preventiva			reclamações/ano	1030	2016	P	-	-	-	500	500
							A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Ouvidoria Geral do Município de Salvador - OGMS

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA), através da OGMS

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Saneamento ambiental e urbanização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.01	Obras de Macrodrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	1,024	2,560	3,368,173	8,420,431
			P (a)	492	2,560	1,268,236.29	8,420,430.99
			A	512	512	1,166,282.72	1,166,282.72
1.02	Obras de Microdrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	2,181	6,712	1,514,039	3,785,097
			P (a)	287.66	6,712	478,857.42	3,785,096.99
			A	423	423	171,806.44	171,806.44
1.03	Obras de Contenção de Taludes na bacia do Rio Mané Dendê	m2	P	17,430	63,085	7,645,338	10,193,784
			P (a)	-	63,085	-	10,193,783.99
			A	-	-	-	-
1.04	Redes de água potável construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	980	3,213.5	200,352	400,704
			P (a)	152.36	3,213.5	9,830.19	400,703.99
			A	108	108	1,859.86	1,859.86
1.05	Redes de esgotamento sanitário construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	5,062	11,221	837,682	1,675,364
			P (a)	669.92	11,221	47,838.05	1,675,363.99
			A	960.54	960.54	62,389.05	62,389.05
1.06	Interceptores de águas residuais construídos na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	1,182	2,761	765,633	1,531,265
			P (a)	181.47	2,761	21,887.17	1,531,264.99
			A	576.54	576.54	69,064.56	69,064.56
1.07	Conexões domiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	679	1,500	153,859	307,719
			P (a)	-	1,500	-	307,718.99
			A	38	38	-	-
1.08	Conexões intradomiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	1,130.5	2,499	651,804	1,303,609
			P (a)	-	2,499	-	1,303,608.98
			A	-	-	-	-
1.09	Novas vias construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	3,382	6,765	5,215,759	11,817,216
			P (a)	-	6,765	-	11,817,215.99
			A	600	600	61,857.37	61,857.37
1.10	Vias melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	5,337	10,673	1,547,538	3,095,076
			P (a)	-	10,673	-	3,095,075.99
			A	-	-	-	-
1.11	Unidades Habitacionais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Households (#)	P	260	970	8,853,760	33,031,337
			P (a)	130	710	294,339.62	32,251,567.65
			A	-	-	-	-
1.12	Habitações melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	Households (#)	P	-	540	363,925	1,819,630
			P (a)	-	540	-	1,819,630
			A	-	-	-	-
1.13	Famílias reassentadas no marco do Programa (inclui: indenizações, alugueis, mudanças, equipe técnico-social)	famílias	P	436	1,034	8,936,460	21,193,349
			P (a)	162	1,034	1,373,283	21,193,348.99
			A	162	163	1,091,408.89	2,418,814.93
1.14	Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	un	P	6	24	972,586	3,191,207

1.14	Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	un	P (a)	-	24	-	3,191,206.99
			A	-	-	-	-
1.15	Equipamentos Urbanos (Mercado, Terminal Ônibus, Centro comunitário/Cultural e Creche/Escola) construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	1	5	1,291,773	6,458,867
			P (a)	-	5	-	6,458,867
			A	-	-	-	-
1.16	Mini-ecopontos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	4	5	45,832	533,192
			P (a)	-	5	56,603.77	533,191.99
			A	-	-	-	-
1.17	Pontos Verdes/Limpos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	7	10	2,057	197,364
			P (a)	-	10	-	197,364
			A	-	-	-	-
1.18	Galpão de separação de resíduos construído e equipado na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	1	2	58,952	1,046,364
			P (a)	-	2	-	1,046,364
			A	-	-	-	-
1.19	Projetos Executivos Elaborados para a bacia do Rio Mané Dendê	conjunto de projetos	P	-	3	-	1,085,110
			P (a)	-	4	-	1,085,110
			A	-	4	-	930,998.74
1.20	Unidades Habitacionais produzidas pelo Programa MCMV		P	-	-	-	-
			P (a)	-	260	-	779,769.34
			A	120	120	64,418.39	64,418.39

Component Nbr. 2 Sustentabilidade ambiental, social e institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.01	Plano integral de comunicação e educação do Programa elaborado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	-	1	-	46,025
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
2.02	Plano integral de comunicação e educação do Programa implementado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	-	1	266,638	888,793
			P (a)	-	1	142,926.39	934,818
			A	-	-	-	-
2.03	Programa de capacitação e assistência técnica para cooperativas de resíduos sólidos implantado	Programa	P	1	1	-	188,518
			P (a)	-	1	5,000	188,518
			A	-	-	-	-
2.04	Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais elaborados	Planos	P	1	2	69,037	138,075
			P (a)	-	2	-	138,075
			A	-	-	-	-
2.05	Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais implantados	Planos	P	2	6	2,086,465	5,216,164
			P (a)	-	6	14,346.91	5,216,164
			A	-	-	9,421.93	9,421.93
2.06	Programa de capacitação de organizações comunitárias do Programa implementado	Programa	P	-	1	38,354	76,708
			P (a)	-	1	38,354	76,708
			A	-	-	-	-
2.07	Projetos culturais para a preservação das práticas culturais afro-brasileiras no Parque São Bartolomeu implementados	Projetcos	P	-	1	46,025	92,050
			P (a)	-	1	-	92,050
			A	-	-	-	-
2.08	Plano de geração de trabalho e renda na bacia do Rio Mané Dendê elaborado	Plano	P	1	1	-	20,000
			P (a)	-	1	18,000	20,000
			A	-	-	-	-
2.09	Plano de geração de trabalho e renda na bacia do Rio Mané Dendê implementado	Plano	P	-	1	97,000	194,784
			P (a)	-	1	-	194,784
			A	-	-	-	-
2.10	Plano de monitoramento da qualidade da água do rio Mané Dendê implementado	Medições	P	6	30	18,576	92,883
			P (a)	6	30	46,858.71	92,883
			A	8	14	29,701.21	29,701.21
2.11	Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Cobre elaborado	Plano	P	-	1	-	306,000
			P (a)	-	1	-	306,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Supervisão das obras de saneamento e urbanização	P	1,062,994	3,543,316
		P (a)	445,582.21	3,543,315.99
		A	413,732.38	473,986.08
	Custos Financeiros	P	498,929	2,820,000
		P (a)	498,929	2,820,000
		A	373,735.77	1,129,927.47
	Admnistração, Auditoria e Avaliação (não inclui gerenciamento)	P	689,008	3,931,128
		P (a)	450,600	3,931,126.77

	Administração, Auditoria e Avaliação (não inclui gerenciamento)	A	295,352.99	1,110,756.11
	Apoio ao Gerenciamento	P	1,526,128	6,358,871
		P (a)	1,015,153.29	6,358,871
		A	952,380.4	1,780,237.99
Total Cost				
	Total Cost	P	48,824,676	135,000,000
		P (a)	6,226,626.02	134,999,998.61
		A	4,763,411.96	9,481,522.85

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Conexões domiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Conexões intradomiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Famílias reassentadas no marco do Programa (inclui: indenizações, alugueis, mudanças, equipe técnico-social)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Interceptores de águas residuais construídos na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Mini-ecopontos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Novas vias construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Obras de Contenção de Taludes na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Obras de Macrodrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Obras de Microdrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Redes de água potável construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Redes de esgotamento sanitário construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Unidades Habitacionais construídas na bacia do Rio Mané Dendê		Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	RAFAELRO	3/23/2022
	Unidades Habitacionais produzidas pelo Programa MCMV	Create Output	N/A	RAFAELRO	3/23/2022
	Vias melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	RAFAELRO	3/23/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	2.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Social Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	10.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Sustainability
	Response Actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Social Environment
	Response Actions		
	14.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Inactive		Planning
	Response Actions		
	16.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
19	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	19.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
22	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	22.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
24	Inactive		Political Environment		
	Response Actions				
	24.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
25	Active		Human Resources
	Response Actions		
	25.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
28	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	28.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
29	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	29.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
32	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	32.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Active		Technical Design
	Response Actions		
	33.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	36.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
38	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	38.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	39.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
41	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	41.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
43	Inactive		Environmental and Social Safeguards		
	Response Actions				
	43.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
46	Inactive		Natural Environment
	Response Actions		
	46.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	46.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
47	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	47.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
