


PMR Public Report

Operation Number	PE-L1246	Chief of Operations Validation Date	05/05/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/05/22
Last Update	05/05/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Investment Program to Improve the Historic Centers of Lima, Arequipa, Trujillo, and Ayacucho	Loan Number	4892/OC-PE
Executing Agency	MINCUL MINISTERIO DE CULTURA	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	ZAMBRANO-BARRAGAN, PATRICIO XAVIER	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A la fecha no se ha iniciado ninguna actividad relacionada con la operación, salvo la actualización de instrumentos operativos claves como el MOP, el mismo que ha incluido una actualización de gabinete de los PGAS de ambas CH. Asimismo, se ha venido trabajando en la definición de los perfiles de los especialistas socio ambientales para ambos Proyectos, que durante diciembre de 2021 contratados. Por el avance a la fecha, el desempeño de la operación es satisfactorio.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
PE-L1246	30,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000	30,000,000	-	0.00%	30,000,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	50,000,000	30,000,000	-	0.00%	30,000,000

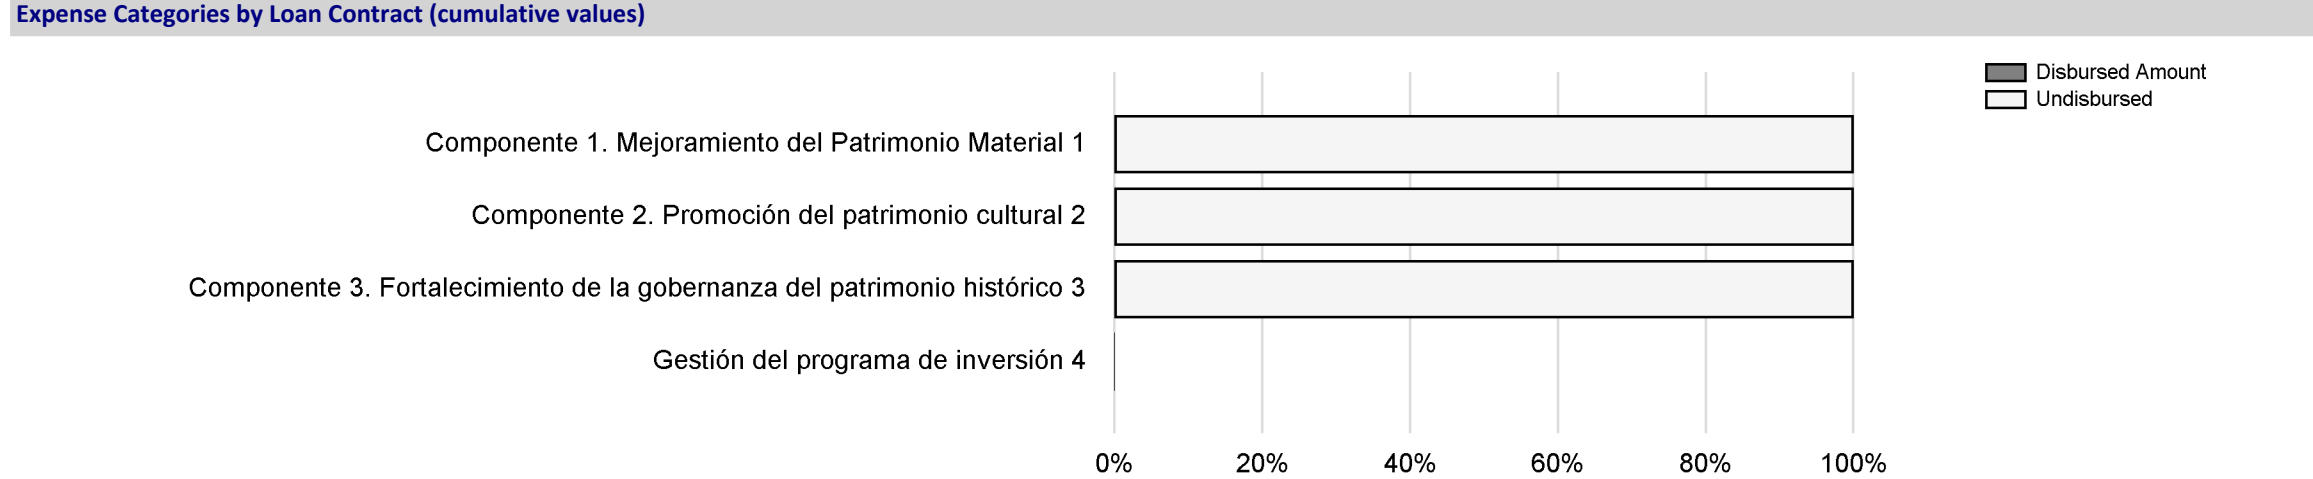

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Poner en valor el patrimonio cultural de los centros históricos de Ayacucho y Lima-Rímac.

Observation: Durante el primer año de ejecución se realizará el levantamiento de información para la definición de la línea de base y meta de indicadores relacionados con la satisfacción y apropiación con el patrimonio histórico.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Edificios Patrimoniales restaurados o en proceso de restauración	Número inmuebles patrimoniales	0	2022	2028	P	4
						A	-

Details

Means of Verification: Permisos otorgados por las Municipalidades y el Ministerio de Cultura

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX													
Specific Development Objectives													
Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar el entorno urbano y natural													
Observation:													
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Aumento en el valor del m2 de los inmuebles en las áreas de intervención de los centros históricos de Rímac y Ayacucho			Índice	100	2019	P	-	-	-	-	120	120
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Informe anual e informe final del programa. Catastros de Rímac y Ayacucho. En el PME se detallará la metodología utilizada para la construcción del Índice.													
Observations: Informe anual e informe final del programa.													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Áreas verdes ampliadas			Índice	100	2019	P	-	-	-	-	120	120
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Actas de entrega de obras revisadas por el Banco													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Specific Development Objectives Nbr. 1: Promover el desarrollo económico local													
Observation:													
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Emprendimientos cofinanciados activos después de 1 año/Total de emprendimientos cofinanciados por el programa			% emprendimientos activos/ total de emprendimientos	0	2019	P	-	-	-	-	20	20
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Informes semestrales de avance del programa. Base de datos e informes del Fondo Cultural Concursable													
Observations: Se hará seguimiento diferenciado por género, bien sea de la persona natural o del representante de la persona jurídica que reciba un financiamiento.													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Eventos culturales realizados en los CH de las ciudades intervenidas por el programa			Número de eventos anuales registrados	0	2019	P	-	-	-	-	45	45
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Permisos para eventos recibidos por las municipalidades distritales, complementado con registros de los administradores de cada espacio público													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Personas graduadas o capacitadas para la conservación del patrimonio cultural	Número de graduados o capacitados	0	2019	P	-	-	-	-	86	86	
					A	-	-	-	-	-	-	
Details												
Means of Verification: Informes semestrales de ejecución del programa aprobados por el Banco. Listado de personas graduadas por curso impartido en las Escuelas Taller												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecer las capacidades institucionales del MINCUL y de las municipalidades												
Observation:												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Presupuesto programado para la promoción de las actividades artisticas y culturales en Rímac	Miles de soles	600	2018	P	-	-	-	-	-	650	650
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Estadísticas de ingresos municipales reportadas por la municipalidad al portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Presupuesto programado para la promoción de las actividades artisticas y culturales en Huamanga	Miles de soles	300	2018	P	-	-	-	-	-	1,200	1,200
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Estadísticas de ingresos municipales reportadas por la municipalidad al portal de Transparencia del MEF.												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos	agencias	0	2019	P	-	-	-	-	-	3	3
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe anual e informe final del programa												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejoramiento del Patrimonio Material

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.01	Fachadas de inmuebles patrimoniales mejoradas	m2	P	-	32,576	-	13,840,696
			P (a)	-	32,576	-	13,840,696
			A	-	-	-	-
1.02	Espacios públicos conectores y emblemáticos mejorados	m2	P	-	58,919	-	11,213,875
			P (a)	-	58,919	-	11,213,875
			A	-	-	-	-
1.03	Paisaje histórico cultural mejorado	m2	P	-	25,742	-	834,088
			P (a)	-	25,742	-	834,088
			A	-	-	-	-
1.04	Espacios culturales mejorados	m2	P	-	16,542	-	14,231,341
			P (a)	-	16,542	-	14,231,341
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Promoción del patrimonio cultural

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.01	Escuelas Taller implementadas	Módulo	P	-	12	-	325,581
			P (a)	-	12	-	325,581
			A	-	-	-	-
2.02	Fondo Cultural Concursable para planes de negocio	US\$ (miles)	P	-	300	-	320,000
			P (a)	-	300	-	320,000
			A	-	-	-	-
2.03	Fondo Cultural Concursable para Emprendimientos culturales y creativos	US\$ (miles)	P	-	900	-	920,000
			P (a)	-	900	-	920,000
			A	-	-	-	-
2.04	Fondo para la gestión de Hub Culturales	US\$ (miles)	P	-	1,000	-	1,000,000
			P (a)	-	1,000	-	1,000,000
			A	-	-	-	-
2.05	Concursos de diseño de proyectos culturales simbólicos realizados	Concursos	P	-	14	-	250,000
			P (a)	-	14	-	250,000
			A	-	-	-	-
2.06	Estudios de aplicación tecnologías Smart City elaborados	Estudios	P	-	2	-	615,850
			P (a)	-	2	-	615,850
			A	-	-	-	-
2.07	Estudios de interpretación cultural de los CH elaborados	Estudios	P	-	2	-	246,120
			P (a)	-	2	-	246,120
			A	-	-	-	-
2.08	Programa Descubre tu Patrimonio diseñado e implementado	Programa	P	-	2	-	98,449
			P (a)	-	2	-	98,449
			A	-	-	-	-

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
3.01	Base de datos sobre conservación del patrimonio creada	base de datos	P	-	1	-	450,000
			P (a)	-	1	-	450,000
			A	-	-	-	-
3.02	Catastros y valoración de inmuebles actualizados en Rímac y Ayacucho	Catastro	P	-	4	-	992,114
			P (a)	-	4	-	992,114
			A	-	-	-	-
3.03	Planes de Gestión de Riesgos formulados	Plan	P	-	2	-	172,284
			P (a)	-	2	-	172,284
			A	-	-	-	-
3.04	Guía metodológica sobre conservación y restauración de inmuebles elaborada	Guía	P	-	1	-	258,427
			P (a)	-	1	-	258,427
			A	-	-	-	-
3.05	Talleres sobre metodología para la conservación y restauración de inmuebles realizados	Taller	P	-	6	-	230,000
			P (a)	-	6	-	230,000
			A	-	-	-	-
3.06	Observatorio del patrimonio cultural creado, incluyendo estadísticas diferenciadas por género	Observatorio	P	-	1	-	600,000
			P (a)	-	1	-	600,000
			A	-	-	-	-
3.07	Plan de Comunicación Estratégica del Programa elaborado	Plan	P	-	1	-	560,000
			P (a)	-	1	-	560,000
			A	-	-	-	-
3.08	Sistemas de información y comunicación instalados	Sistema	P	-	1	-	41,175
			P (a)	-	1	-	41,175
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Equipo de Gestión - Fortalecimiento de recursos humanos UE 008	P		1,387,665
		P (a)		1,387,665
		A	0	0
4.2. Equipo de Gestión - Fortalecimiento de recursos humanos de la Dirección Desconcentrada de Ayacucho		P		372,335
		P (a)		372,335
		A	0	0
4.3. Auditorías		P		280,000
		P (a)		280,000
		A	0	0
4.4. Evaluaciones		P		500,000
		P (a)		500,000
		A	0	0
4.5. Adquisición de hardware y software para el equipo de gestión y adaptación de puestos de trabajo		P		260,000
		P (a)		260,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P		50,000,000

	Total Cost	P (a)		50,000,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Internal Processes		
	Response Actions				
	2.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	2.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	2.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	2.4	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Political Environment		
	Response Actions				
	4.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	4.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	4.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	4.4	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Technical Design		
	Response Actions				
	6.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	6.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Sustainability
	Response Actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	7.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	7.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	9.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	9.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Sustainability
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	12.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	12.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Sustainability
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE
	14.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this Section
