


PMR Public Report

Operation Number	RG-L1131	Chief of Operations Validation Date	05/06/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	05/06/22
Last Update	05/06/22	Country Representative Validation Date	05/06/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	COMPREHENSIVE SANITATION PROGRAM FOR THE CITIES OF THE URUGUAY RIVER BASIN – PROVINCE OF ENTRE RÍOS	Loan Number	4822/OC-RG
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Regional
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE ENTRE RIOS		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación comenzó su ejecución en febrero de 2021 y aún no hay obras en ejecución. La UCP y los municipios contrataron especialistas que realizan el seguimiento socioambiental. Al momento se está avanzando con la identificación de predios y en algunos casos con los trámites de expropiación y cesión de otros predios. Los EIAS presentados hasta el momento para Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay presentan un adecuado abordaje de los temas y medidas de mitigación. Se cuenta con autorizaciones ambientales para Concordia y Gualeguaychú. Para los demás proyectos está en trámite. Los proyectos verterán al río Uruguay, o a alguno de sus afluentes, se requiere que la Comisión Administradora del Río Uruguay les otorgue aprobación.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
RG-L1131	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	2,624,447.02	3.28%	77,375,552.98
Aggregated	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	2,624,447.02	3.28%	77,375,552.98
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

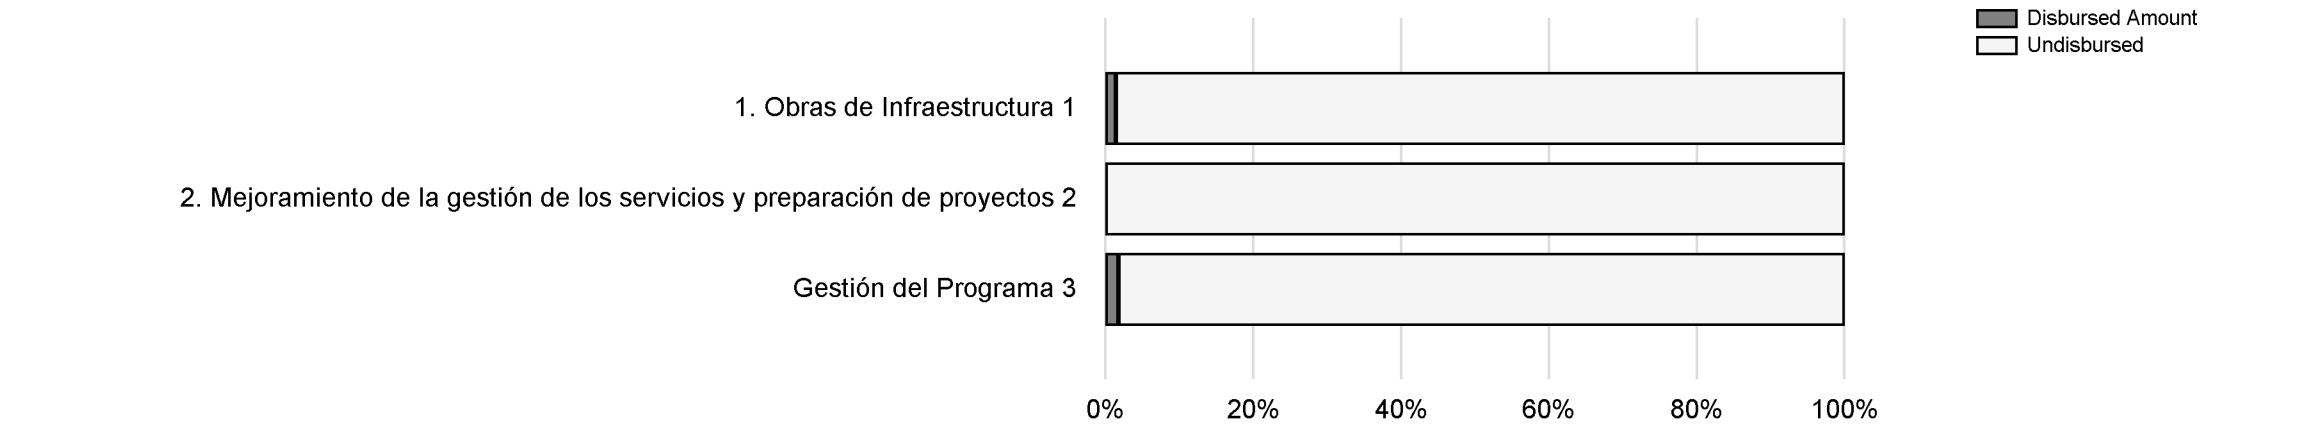

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo Específico 1: ampliar la cobertura de desagües cloacales y el tratamiento de las aguas residuales												
Observation:												
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	Caudal medio anual efectivo de aguas residuales tratado		m3/seg	0.39	2021	P	-	-	-	.48	1.36	1.36
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.												
Observations: se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento (pretratamiento/tratamiento primario y/o secundario, según corresponda). El caudal estimado para las metas será el caudal medio anual según diseño de las obras												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year <td></td> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>EOP 2025</th>		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Cantidad de materia orgánica removida de los vertidos al río Uruguay		DBO(ton/año)	2091	2021	P	-	-	-	-	6,637	6,637
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year <td></td> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>EOP 2025</th>		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Hogares con acceso efectivo a sistemas de saneamiento en las ciudades de intervención del Programa		# of households	63403	2021	P	-	-	-	-	116,336	116,336
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe emitidos por los Municipios / Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente												
Observations: La rehabilitación comprende reconstrucción, reparación, y mejoramiento de las condiciones del sistema cloacal.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)							
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year <td></td> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>EOP 2025</th>		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.3	Hogares cuyos efluentes cloacales son tratados en las ciudades de intervención del Programa		# of households	24268	2021	P	-	-	-	-	116,336	116,336
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Informe emitidos por los Municipios / Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente												
Observations: corresponde a hogares que cuentan con acceso al sistema de tratamiento adecuado												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)							

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo Especifico 2: mejorar la capacidad de gestión de los servicios.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Operadores con Autosuficiencia financiera (ingresos operativos/costos de operación, mantenimiento y administración >= 1).	(oper con autosuf finan) / (total operad programa)	0	2021	P	-	-	40	60	80	80
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes emitidos por los Municipios

Observations: Estados financieros auditados anuales de los operadores y PGRs de los operadores.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Porcentaje de Operadores que implementan al menos una acción de mejora prevista en la estrategia de Genero.	(oper que implem al men 1 acción gén) / (tot oper prog)	0	2021	P	-	-	-	-	40	40
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Mediante la Estrategia de Género validada y aprobada por las autoridades de la empresa.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Porcentaje de mujeres que concluyen satisfactoriamente las capacitaciones de inserción laboral	(Mujeres que concl capac/Tot mujeres Inscrip en capac)	0	2021	P	-	-	-	-	60	60
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Planilla de asistencia de las capacitaciones dictadas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de Infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
1.01	Colectores principales operando adecuadamente	km	P	-	51.16	150,603.52	12,516,044.7
			P (a)	-	51.16	150,603.52	12,524,560
			A	-	-	131,456	131,456
1.02	Redes cloacales finas operando adecuadamente	km	P	-	27	8,290.85	2,180,583.14
			P (a)	-	27	8,290.85	2,181,052
			A	-	-	7,237	7,237
1.03	Estaciones de bombeo operando adecuadamente	Estaciones	P	-	40	204,102.32	11,141,537.38
			P (a)	-	40	204,102.32	11,153,077
			A	-	-	178,153	178,153
1.04	Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes cloacales construidos (planta) y Emisario	Sistema	P	-	5	806,376.06	46,512,528.94
			P (a)	-	5	806,376.06	46,558,115
			A	-	-	703,853	703,853

Component Nbr. 2 Mejoramiento de la gestión de los servicios y preparación de proyectos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2025	2021	EOP 2025
2.01	Planes de Gestión por Resultados de los operadores de servicios implementados	Planes	P	-	5	-	2,300,000
			P (a)	-	5	-	2,300,000
			A	-	-	-	-
2.02	Estudios de fortalecimiento provincial y municipal desarrollados	Estudios	P	-	3	-	1,450,000
			P (a)	-	3	-	1,450,000
			A	-	-	-	-
2.03	Proyectos ejecutivos elaborados/Estudios complementarios de factibilidad y diseño elaborados	Proyectos	P	-	3	-	500,000
			P (a)	-	3	-	500,000
			A	-	-	3,156	3,156
2.04	Diagnóstico y Estrategia de Género para empresas operadoras elaborada, validada y aprobada	Diagnóstico	P	-	5	-	25,000
			P (a)	-	5	-	25,000
			A	-	-	-	-
2.05	Capacitaciones de inserción laboral realizadas	# capacitaciones	P	-	5	-	25,000
			P (a)	-	5	-	25,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración del Programa	P	195,983.45	2,800,000
		P (a)	195,983.45	2,800,000
		A	69,930	69,930
	Auditorías y Evaluaciones	P	0	400,000
		P (a)	0	400,000
		A	0	0
	Imprevistos	P	0	149,305.84
		P (a)	0	83,198

	Imprevistos	A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	1,365,356.2	80,000,000
		P (a)	1,365,356.2	80,000,002
		A	1,093,785	1,093,785

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Colectores principales operando adecuadamente	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIAPES	3/15/2022
			Modify Output to measure progress using Output	VANIAP	3/29/2022
	Estaciones de bombeo operando adecuadamente	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIAPES	3/15/2022
			Modify Output to measure progress using Output	VANIAP	3/29/2022
	Redes cloacales finas operando adecuadamente	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIAPES	3/15/2022
			Modify Output to measure progress using Output	VANIAP	3/29/2022
	Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes cloacales construidos (planta) y Emisario	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARIAPES	3/15/2022
			Modify Output to measure progress using Output	VANIAP	3/29/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Planning		
	Response Actions				
	2.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	2.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	2.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Active		Technical Design		
	Response Actions				
	3.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	3.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Active		Governance Framework		
	Response Actions				
	5.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	5.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	5.3	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Human Resources
	Response Actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	



Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	14.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Political Environment
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	INACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
