


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1260	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	FIRST OPERATION OF THE URBAN INTEGRATION AND SOCIAL AND EDUCATIONAL INCLUSION PROGRAM IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES	Loan Number	4303/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	VERA BENITEZ, LUIS FELIPE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La unidad ejecutora posee los profesionales clave para llevar adelante la gestión socioambiental del programa. Deben mejorar el detalle de las quejas que reportan. Las demoliciones y reasentamientos pendientes a cargo de banco Mundial podría llevar un PS por las normativas locales.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1260	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	97,523,443.51	97.52%	2,476,556.49
Aggregated	100,000,000	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	100,000,000	97,523,443.51	97.52%	2,476,556.49

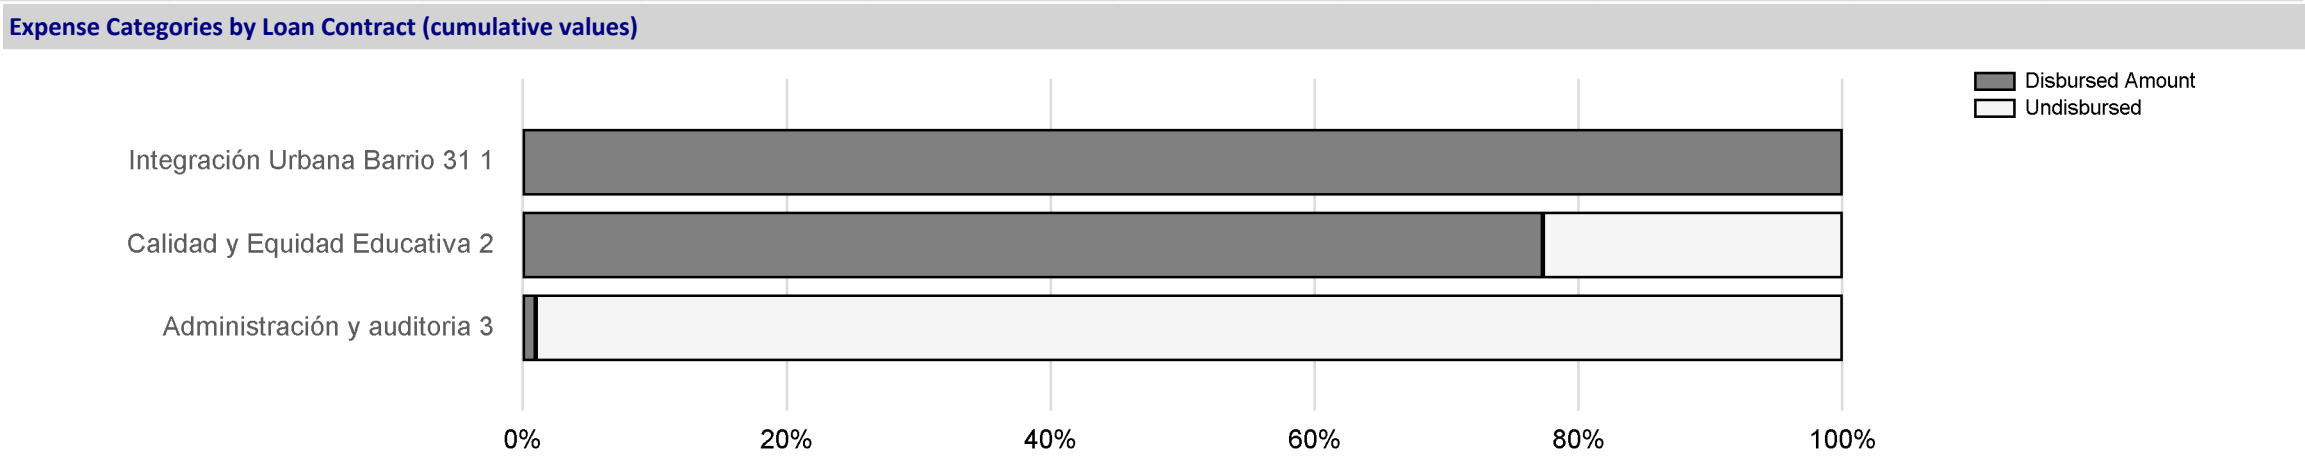

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Componente 1 Integracion urbana del Barrio 31

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
0.0	Hogares con hacinamiento crítico (más de 3 miembros por habitación exclusiva para dormir)	hogares	0	2018	2023	P	.01
						A	-
Details							

Means of Verification: Datos de encuesta de actividad económica en B31

Observations: Implementado por SECISYU y Centro de Investigación de Políticas Urbanas y Vivienda (CIPUV) Universidad Torcuato di Tella

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

General Development Objectives Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa en la CABA

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.0	Deserción escolar promedio en Secundarias estatales	%	2.5	2017	2023	P	1.7
						A	-
Details							

Means of Verification: Datos del Relevamiento Anual 2020

Observations: Implementado por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.1	Puntaje promedio en Matemática en 7º grado de Primarias estatales			puntaje promedio	480.7	2018	2023	P	510
								A	-
Details									

Means of Verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.2	Puntaje promedio en Prácticas del Lenguaje en 7º grado de Primarias estatales			puntaje promedio	458.4	2018	2023	P	500
								A	-
Details									

Means of Verification: Resultados de la Prueba FEPBA.

Observations: Las pruebas FEPBA y TESBA son aplicadas por el Ministerio de Educación de CABA. Responsable: ME

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.3	Puntaje promedio en Lengua y Literatura en 3º año de secundarias estatales			puntaje promedio	464.6	2018	2023	P	500
								A	-
Details									

Means of Verification: Resultados de la Prueba TESBA.

Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.4	Puntaje promedio en Matemática en 3° año de secundaria			puntaje promedio	484	2018	2023	P	510
								A	-
Details									

Means of Verification: Resultados de la Prueba TESBA.

Observations: La prueba TESBA se aplicará por primera vez en 2017. Luego del análisis de los resultados se definirá línea de base y metas.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Componente 1 Integracion urbana de B31. Incremento en el acceso a servicios educativos de calidad, infraestructura urbana de calidad y resiliente al cambio climático. La disminución de problemas de salud relacionados a enfermedades infectocontagiosas entre los residentes de viviendas mejoradas.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Alumnos matriculados en la escuela de nivel inicial financiada por el programa en condiciones de operar	# of students	0	2017	P	158	158
					A	-	-

Details

Means of Verification: Registros escuela inicial

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Alumnos matriculados en la escuela de nivel primario financiada por el programa en condiciones de operar	# of students	0	2017	P	185	185
					A	-	-

Details

Means of Verification: Registros escuela primaria

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)		

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Tiempo promedio de traslado diario a escuelas de alumnos	Numero de minutos	40	2017	P	20	20
					A	-	-

Details

Means of Verification: SECISYU. Encuesta a muestra significativa de alumnos del Polo Educativo

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Reducción en el consumo de energía	%	0	2017	P	28	28
					A	-	-

Details

Means of Verification: SECISYU/ Certificado provisto por el programa Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
0.5	Reducción en el consumo de agua	%	0	2017	P	47	47
					A	-	-
Details							
Means of Verification: SECISYU/EDGE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
0.6	Reducción en el consumo de energía incorporada en los materiales	%	0	2017	P	31	31
					A	-	-
Details							
Means of Verification: SECISYU/EDGE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
0.7	Reducción en emisiones de CO2 durante el uso del edificio	TCO2/año	0	2017	P	216	216
					A	-	-
Details							
Means of Verification: SECISYU/EDGE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
0.8	Hogares del B31 con acceso formal a agua potable	Porcentaje	0	2017	P	100	100
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Relevamiento SECISYU							
Observations: El programa financia la construcción de un acueducto que será operado por la empresa proveedora de agua ysaneamiento (AySA) y conecta el servicio formal de agua de CABA a una red de distribución interna en el B31 que se ejecuta con fondos BIRF.							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
0.12	Comerciantes y feriantes inscriptos al monotributo/monotributo social	%	8.33	2017	P	75	75
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Encuesta actividad económica SECISYU							
Observations: Desagregar por género del comerciante. Línea de base y meta consideran todos los comercios del barrio.							

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Componente 2 Calidad y Equidad Educativa. mejora en el acceso a nuevos equipamientos tecnológicos, mobiliario y laboratorios de informática en las escuelas de la Ciudad de Buenos aires y en el acceso a nuevas plataformas digitales de aprendizaje y evaluación. Mejora en el acceso a sistemas informatizados de gestión de datos para la planificación educativa.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
1.1	Estudiantes que utilizan el nuevo equipamiento entregado por el Plan Sarmiento Fase II: conectividad y nuevo equipamiento/notebooks	# of students	82000	2019	P	168,000	168,000
					A	241,430	-

Details

Means of Verification: Reporte Plan Sarmiento

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
1.2	Docentes capacitados en el uso de la plataforma de aprendizaje de matemática	docentes	1500	2019	P	4,000	4,000
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes anuales de la plataforma de aprendizaje.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
1.3	Alumnos de escuelas de Primaria y Secundaria que utilizan en los espacios digitales	alumnos	9000	2019	P	24,000	24,000
					A	102,840	-

Details

Means of Verification: Informes anuales de la Dirección de Tecnologías ME.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2022		EOP 2022
1.4	Escuelas de gestión estatal y unidades centrales del ME que operan la plataforma de gestión educativa integral	Escuelas	500	2019	P	800	800
					A	1,059	-

Details

Means of Verification: Informes anuales de acceso del sistema de gestión.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

</							

Means of Verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.6	Escuelas secundarias estatales en las que sus directivos y docentes reciben informes con datos de indicadores educativos a través de la Plataforma Mi Escuela	Escuela	0	2018	P	607	607
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Informes anuales de la plataforma de evaluación.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.7	Estudiantes de 2° año de secundaria que realizan la evaluación de habilidades socioemocionales a través de la plataforma de evaluación	Estudiantes	0	2017	P	2,500	2,500
					A	857	-
Details							

Means of Verification: Informes de la anuales de la plataforma de evaluación.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.8	Profesionales técnicos certificados en gestión e innovación educativa.	Profesionales	0	2017	P	480	480
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Informe confirmando asistencia de profesionales y numero de certificados entregadas.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Integración Urbana del Barrio 31

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
1.01	Subcomponente 1.1. Polo Educativo. Nuevo edificio Ministerio de Educación de Gobierno de la CABA construido (incluye escuelas de nivel inicial, primario y un centro de terminalidad educativa)	edificio	P	-	1	-	43,896,324
			P (a)	-	1	-	53,219,162
			A	-	1	-	52,361,332
1.02	Subcomponente 1.2. Proyecto 1 Acueducto. Nuevo acueducto construido	metro lineal	P	-	2,893	-	5,171,334
			P (a)	-	2,893	-	6,405,223
			A	-	2,893	-	6,405,223
1.03	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Espacio público por habitante en el B31	m2/hab	P	-	1.34	-	5,475,286
			P (a)	-	1.34	-	5,459,371
			A	-	1.34	-	5,459,371
1.04	Subcomponente 1.2. Proyecto 2 Espacios Públicos. Nuevas calles arborizadas	Metros lineales	P	-	3,040	-	4,000,000
			P (a)	-	3,040	-	1,130,000
			A	-	3,040	-	1,130,000
1.05	Subcomponente 1.3. Viviendas mejoradas por algún abordaje del PMV (iniciadas)	número de viviendas	P	-	1,022	-	24,600,000
			P (a)	215	475	-	22,169,806
			A	-	260	-	22,169,806
1.06	Subcomponente 1.4. Estudios de consultoría y/o de supervisión para dar soporte a la intervención realizada	número de planes y estudios	P	-	2	-	1,500,000
			P (a)	-	7	-	855,206
			A	-	7	-	855,206

Component Nbr. 2 Componente 2: Calidad y Equidad Educativa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
2.01	Subcomponente 2.1. Netbooks y tablets del Plan Sarmiento Fase II entregados a estudiantes y docentes.	Netbooks y tablets	P	-	40,000	-	17,475,750
			P (a)	7,220	91,220	-	12,103,296
			A	7,220	91,220	730,476	12,833,772
2.02	Subcomponente 2.1. Aulas equipadas con nuevo mobiliario.	Aulas	P	-	60	-	2,700,000
			P (a)	90	715	-	5,859,077
			A	90	715	-	5,961,488
2.03	Subcomponente 2.1. Escuelas equipadas con aulas y/o espacios digitales equipados y en funcionamiento.	Escuelas	P	-	60	-	5,524,250
			P (a)	-	60	4,890,709	10,164,595
			A	-	60	-	5,273,886
2.04	Subcomponente 2.1. Plataforma de gestión educativa implementada en el ME.	Plataforma	P	-	1	-	2,844,810
			P (a)	-	1	-	2,844,810
			A	-	1	-	2,844,810
2.05	Subcomponente 2.1. Plataforma de aprendizaje de matemáticas diseñada y disponible en el sistema.	Plataforma	P	-	1	-	3,500,000
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	Subcomponente 2.2. Plataformas de evaluación digital y formativa FEPSA y TESBA, y de evaluación socioemocionales diseñadas y disponibles en línea.	Plataforma	P	-	2	145,000	1,200,000
			P (a)	1	1	533,184	1,057,064
			A	-	-	114,765.97	638,645.97
2.07	Subcomponente 2.3. Cursos de capacitación diseñados e implementados.	cursos	P	-	4	-	600,000
			P (a)	-	4	-	4,882
			A	-	4	-	4,882
2.08	Subcomponente 2.3. Plan de implementación del Centro de Formación Docente en Nuevas Tecnologías finalizado.	Plan	P	-	1	-	500,000
			P (a)	-	1	-	148,794
			A	-	1	-	148,794

Other Cost

	Administración y monitoreo	P	0	4,000,000
		P (a)	0	126,003
		A	7,164	133,167

Total Cost				
	Total Cost	P	145,000	122,987,754
		P (a)	5,423,893	121,547,289
		A	852,405.97	116,220,382.97

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Subcomponente 1.1. Polo Educativo. Nuevo edificio Ministerio de Educación de Gobierno de la CABA construido (incluye escuelas de nivel inicial, primario y un centro de terminalidad educativa)	Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	MARES	9/29/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Social Environment
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Technical Design
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Social Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions
