


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1306	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Social and Urban Integration Program	Loan Number	4804/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	VERA BENITEZ, LUIS FELIPE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	No se ha licitado ninguna obra aún. El taller de arranque de la operación se realizó en junio de 2021. Para los proyectos de la muestra se realizaron los AAS, PRI y consultas significativas en 2019 que podrían requerir actualización. Se preparó un MGAS para los proyectos que se encuentran fuera de la muestra.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1306	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	20,566,145.93	41.13%	29,433,854.07
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	20,566,145.93	41.13%	29,433,854.07
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

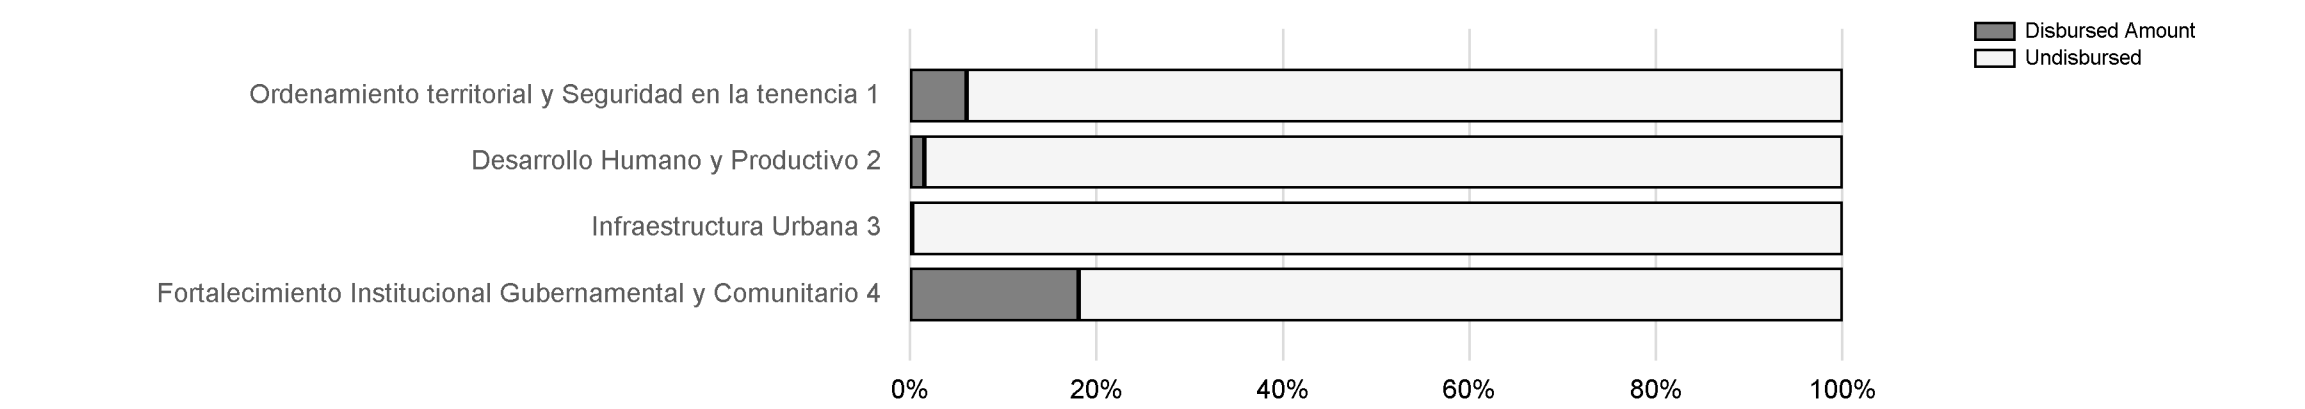

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Disminución del Índice de vulnerabilidad barrial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Índice de vulnerabilidad barrial	Desviaciones estándar	0	2019	2025	P	(20)
						A	-

Details

Means of Verification: Datos de la Ficha Social de SIEMPRO

Observations: Índice de vulnerabilidad sintético en base al CB (SISFAM AMPLIADO)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Ordenamiento Territorial y Seguridad en la Tenencia: incorporar los polígonos de los Barrios Populares (BP) a los procesos de ordenamiento territorial para su inclusión en la planificación urbana, garantizando la seguridad en la tenencia y promoviendo la regularización dominial.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
0.0	Polígonos Barriales incorporados a los instrumentos de ordenamiento territorial municipal	% poligonos	0	2021	P	-	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe USE (plancheta catastral u ordenanza municipal)

Observations: .

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
0.2	Familias residentes en los polígonos intervenidos por el programa que reciben el Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP que da inicio al proceso de regularización dominal.	% familias	0	2021	P	-	80
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes de RENABAP de Certificado de Vivienda Familiar

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
0.3	Familias encabezadas por mujeres residentes en los polígonos intervenidos por el programa que reciben un Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP que da inicio al proceso de regularización dominial.	% familias	0	2021	P	-	65
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes de RENABAP de Certificado de Vivienda Familiar

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Desarrollo Humano: mejorar la presencia de las áreas de gobierno y Organizaciones de la Sociedad Civil en el barrio, ampliando la cobertura y la participación en los programas sociales por parte de la comunidad.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.0	Personas con cobertura de servicios sociales (de cuidado y crianza de la primera infancia, sobre consumo problemático, de deserción escolar, y sobre violencia de género)	% población	0	2021	P	-	30
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes USE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
1.2	Espacios fortalecidos vinculados a servicios de cuidado y crianza para la primera infancia (de 45 días a 4 años) en centros públicos, privados o comunitarios y acompañamiento comunitario y familiar.	% de espacios fortalecidos	0	2021	P	-	30
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informes USE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
1.3	Espacios vinculados a la temática sobre el consumo problemático	% de espacios fortalecidos	0	2021	P	-	20
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informes USE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
1.4	Consultas sobre consumo problematico atendidas por los espacios fortalecidos	% de aumento de consultas	0	2021	P	-	20
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informes USE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
1.5	Tutorías finalizadas por jóvenes en edad escolar con riesgo de deserción o que hayan abandonado los estudios en el ciclo obligatorio de la enseñanza básica.	% tutorías finalizadas sobre el total de jovenes	0	2021	P	-	15
					A	-	-
Details							
Means of Verification: Informes USE							
Observations:							
Evaluation Methodology: -							
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
1.6	Espacios fortalecidos vinculados a la temática sobre violencia de género	% de espacios fortalecidos	0	2021	P	-	20
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Informes USE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Desarrollo Productivo: promover el desarrollo de capital humano y las actividades económicas del barrio, con foco en la vinculación con actividades económicas de la ciudad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.0	Unidades productivas creadas o fortalecidas que se mantienen operativas al cierre del programa	% de unidades productivas	0	2021	P	-	50
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes USE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.2	Unidades productivas que mitigan riesgos laborales	% unidades productivas	0	2021	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes USE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.3	Unidades productivas que mitigan riesgos ambientales	% de unidades productivas	0	2021	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes USE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.4	Proyectos socio productivos ejecutados que promueven actividades económicas con impacto de mitigación y/o adaptación al cambio climático.	% de proyectos socio productivos ejecutados	0	2021	P	-	30
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes USE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

Specific Development Objectives Nbr. 3: Infraestructura urbana: (i) promover la conexión de las familias a los servicios públicos formales, (ii) mejorar la accesibilidad y conectividad de las redes urbanas viales y peatonales, (iii) fortalecer el capital social a través de equipamiento comunitario y espacios públicos que garanticen la inserción de los barrios en las estructuras de sus ciudades.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
3.0	Viviendas con conexión al servicio de saneamiento	% de viviendas con conexión al servicio de saneamiento	0	2021	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Certificaciones de obra

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
3.2	Viviendas con conexión a servicio formal de red de agua potable	% de viviendas con conexión	0	2021	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Certificaciones de obra

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
3.3	Viviendas con conexión a servicio formal de energía eléctrica	% de viviendas con conexión	0	2021	P	-	40
					A	-	-

Details

Means of Verification: Certificaciones de obra

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
3.4	Viviendas habilitadas para realizar conexión a servicio formal de telecomunicaciones	% de viviendas	0	2021	P	-	30
					A	-	-

Details

Means of Verification: Certificaciones de obra

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.4	Redes viales y peatonales mejoradas y/o construidas	% redes	0	2021	P	-	15
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de avance de obra

Observations: .

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.5	Famillias con accesibilidad a espacios publicos verdes y recreativos de calidad	% de familias	0	2021	P	-	40
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de avance de obra

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Fortalecimiento Institucional, Gubernamental y Comunitario: promover mayor eficiencia en la implementación de los Planes de Integración Barrial (PIB). Para ello se buscará mejorar las capacidades institucionales y los vínculos entre los actores gubernamentales y de la sociedad civil.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
4.0	Aumento de cantidad de representantes vecinales que participan en forma activa y regular de las MISU	% de aumento de representantes vecinales	0	2021	P	-	25
					A	-	-

Details

Means of Verification: Actas de mesas participativas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
4.2	Unidades subejecutoras y/o comunitarias fortalecidas que presentan su plan de integracion sociourbana y obtienen aprobación	% de unidades fortalecidas	0	2021	P	-	100
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes de la USE / Informes de seguimiento OE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 5: Respuesta al COVID-19 en Barrios Populares: asegurar la calidad de vida de los residentes de los barrios populares en respuesta al COVID-19 mediante acciones que promuevan su integración sociourbana.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2026		EOP 2026
5.0	Familias que cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios por COVID-19	% familias	0	2019	P	-	32
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes de verificacion entregados por firmas verificadoras de OSC contratadas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Ordenamiento territorial y Seguridad en la tenencia

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	Diagnósticos realizados de los códigos de ordenamiento urbano existentes	nro informes	P	7	7	122,092	162,000
			P (a)	4	7	-	162,000
			A	-	3	-	39,908
1.02	Proyectos de modificación de los códigos de ordenamiento urbano existentes realizados	nro proyectos	P	-	7	-	243,000
			P (a)	-	7	-	243,000
			A	-	-	-	-
1.03	Estudios técnicos y legales sobre la situación de seguridad en la tenencia realizados	nro informes	P	7	7	102,348	135,000
			P (a)	4	7	-	135,000
			A	-	3	-	32,652
1.04	Proyectos de regularización realizados	nro proyectos	P	-	7	-	216,000
			P (a)	-	7	-	216,000
			A	-	-	-	-
1.05	Guía operativa para garantizar la seguridad en la tenencia presentada y validada por la comunidad	nro guias	P	-	7	-	81,000
			P (a)	-	7	-	81,000
			A	-	-	-	-
1.06	Familias acompañadas en el proceso de regularización	nro familias	P	-	2,442	-	189,000
			P (a)	-	2,442	189,000	189,000
			A	-	-	22,182	22,182
1.07	Planos de mensura, loteo y amanzanamiento realizados	nro de planos realizados	P	-	7	-	324,000
			P (a)	-	7	9,900	324,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Desarrollo Humano y Productivo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
2.01	Diagnósticos realizados por barrio sobre cobertura de servicios sociales (de cuidado y crianza de la primera infancia, sobre consumo problemático, de deserción escolar, y sobre violencia de género)	nro diagnósticos	P	7	7	215,206	498,000
			P (a)	-	7	-	498,000
			A	-	7	-	498,000
2.02	Proyectos de articulación entre comunidad y programas sociales presentados y validados por la comunidad	nro proyectos	P	-	7	-	747,000
			P (a)	-	7	-	747,000
			A	-	-	-	-
2.03	Proyectos de desarrollo humano finalizados (de cuidado y crianza de la primera infancia, sobre consumo problemático, de deserción escolar, y sobre violencia de género)	nro proyectos	P	-	14	-	705,500
			P (a)	-	14	9,358	705,500
			A	-	-	-	24,223
2.04	Diagnósticos del tejido productivo por barrio y su entorno realizadas (con perspectiva de género)	nro diagnósticos	P	7	7	215,206	498,000
			P (a)	-	7	-	498,000
			A	-	7	-	498,000
2.05	Planes integrales de desarrollo socio productivo diseñados	nro planes	P	-	7	-	539,500
			P (a)	-	7	-	496,965
			A	-	-	42,535	42,535
2.06	Proyectos socio productivos ejecutados	nro proyectos	P	-	14	380,667	1,162,000
			P (a)	-	14	106,601	1,162,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Infraestructura Urbana

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
3.01	Diagnósticos urbanos realizados sobre el nivel de cobertura de infraestructura, equipamiento y accesibilidad.	nro diagnósticos	P	7	7	373,636	411,750
			P (a)	-	7	-	411,750
			A	-	7	-	411,750
3.02	Proyectos ejecutivos realizados de Infraestructura, equipamiento y accesibilidad	nro proyectos	P	-	7	8,351,858	27,038,250
			P (a)	-	7	9,828,734	27,038,250
			A	-	-	44,543	61,697

Component Nbr. 4 Fortalecimiento Institucional Gubernamental y Comunitario

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
4.01	OSC que integran las mesas participativas realizadas en el marco del Programa	nro OSC	P	-	14	52,575	210,000
			P (a)	-	14	-	210,000
			A	-	9	-	52,274
4.02	Unidades gubernamentales y comunitarias asistidas técnicamente	nro unidades	P	-	7	65,719	262,500
			P (a)	-	7	252,177	262,500
			A	-	-	34,653	44,976
4.03	Unidades gubernamentales y comunitarias con mejora de equipamiento	nro unidades	P	-	7	65,719	262,500
			P (a)	-	7	262,500	262,500
			A	-	-	148,412	148,412
4.04	Mesas participativas realizadas en el marco del Programa	nro mesas	P	42	126	78,863	315,000
			P (a)	42	126	-	315,000
			A	26	62	-	78,411

Component Nbr. 5 Respuesta al COVID-19 en Barrios Populares

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
5.01	Familias atendidas en el marco de los Protocolos sanitarios por COVID-19	nro familias	P	-	32,000	-	4,200,000
			P (a)	-	32,000	-	4,893,283
			A	-	32,000	-	4,893,283
5.02	Centros comunitarios fortalecidos en el marco de los Protocolos sanitarios por COVID-19	nro de centros comunitarios	P	-	200	-	2,800,000
			P (a)	-	200	-	2,106,717
			A	-	200	-	2,106,717
5.03	Viviendas mejoradas en el marco de los Protocolos sanitarios por COVID-19	nro de viviendas mejoradas	P	1,100	1,100	3,338,288	8,000,000
			P (a)	1,100	1,100	4,636,765	8,000,000
			A	1,087	1,087	2,941,951	5,987,620

Other Cost					
	Administración y Auditoría	P	112,859	1,000,000	
		P (a)	230,390	1,000,000	
		A	759,853	1,529,463	

Total Cost					
	Total Cost	P	13,475,036	50,000,000	
		P (a)	15,525,425	49,957,465	
		A	3,994,129	16,472,103	

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Planes integrales de desarrollo socio productivo diseñados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARES	9/21/2022
			Modify Financial Historical Actual	MARES	9/21/2022

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Social Environment
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Social Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	9.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Sustainability
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Planning
	Response Actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	24.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	27.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Sustainability
	Response Actions		
	30.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Active		Social Environment
	Response Actions		
	33.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
