


PMR Public Report

Operation Number	BO-L1079	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Urban rearrangement program La Ceja	Loan Number	2908/BL-BO, 2908/BL-BO-1, 2908/BL-BO-2
Executing Agency	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Team Leader	POVEDA, RAFAEL ANTONIO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	12/07/17
Safeguard Performance Rating - Rationale	La EETC-MT ha terminado satisfactoriamente con las medidas identificadas en los distintos planes de gestión ambiental, social y reasentamiento. Las empresas contaron con personal ambiental y social adecuado. Se ha realizado un amplio y participativo proceso de socializaciones/reuniones con diferentes actores clave institucionales e individuales, el Programa a partir de 2021 cambia su calificación a sustancial a raíz de un deslizamiento de tierra en la estación "Faro Murillo", en febrero de 2020 donde se encuentran la línea púrpura y plateada de "Mi teleférico". Además, se identificó agua subterránea en el diseño y construcción de las líneas, en consecuencia, se realizaron acciones para abordar la estabilización en la estación Faro Murillo y realizaron estudios por parte de "Mi teleférico" para asegurar que toda la línea cuente con acciones y medidas de mitigación para asegurar la estabilidad de la línea.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BO-L1079	47,000,000	45,332,707	0	0	0	45,332,707	45,332,707.39	100.00%	-
Aggregated	47,000,000	45,332,707	0	0	0	45,332,707	45,332,707.39	0.00%	-
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

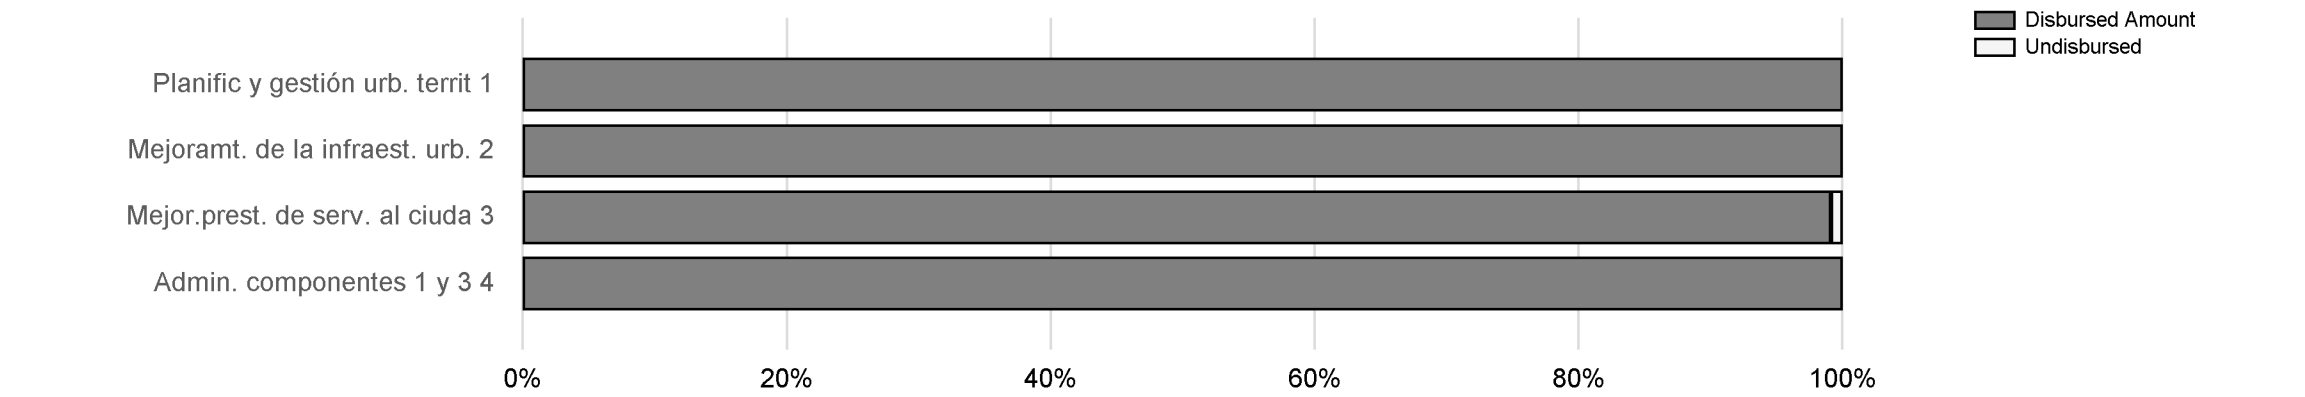

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Congestión en el área de La Ceja reducida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.0	Participación modal de pasajeros en Línea Plateada con respecto al transporte público diferente a teleférico en la metrópoli La Paz – El Alto por día	%	0	2016		P	4.5
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente de la línea de base EETC-MT: Base de datos de Informe EETC-MT a partir de encuestas a usuarios diferenciando por líneas y estudio de mercado de MT Fase II.

Observations: La meta final proyectada, es a un año de funcionamiento de la RIM.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.1	Emisiones de CO2 eliminadas debido al empleo de la línea plateada como medio de transporte	Toneladas/año	0	2017		P	2,500
						A	-

Details

Means of Verification: Fuente de la línea de base EETC-MT: Informes técnicos de la EETC-MT en base a los estudios de demanda.

Observations: La meta se calculará siguiendo la misma metodología de la línea de base empleando la demanda real observada.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Capacidad de planificación y gestión urbana mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	2021	EOP 2021
0.1	Las obras incluidas en los Programas Operativos Anuales (POAs) son gestionadas a través de un sistema informático de seguimiento de proyectos	%	0	2012	P	-	-	60	-	60
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe técnico emitido por la Dirección de Planificación del GAMEA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incremento del uso de sistemas de transporte urbano de calidad

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	2021	EOP 2021
1.0	Pasajeros por día en la Línea Plateada	Número de pasajeros que usa la Línea Plateada	0	2016	P	-	-	53,342	-	53,342
					A	-	-	-	-	21,339

Details

Means of Verification: Informe de la Empresa Mi Teleférico

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	2021	EOP 2021
1.1	Tiempo de traslado en vehículo de transporte público diferente a teleférico en el trayecto entre la estación 16 de Julio y la estación Mirador	Minutos / viaje	23.3	2016	P	-	-	9.75	-	9.75
					A	-	-	-	-	10.66

Details

Means of Verification: Informe de la Empresa Mi Teleférico

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Prestación de los servicios al ciudadano por parte del GAMEA mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de trámites de recaudación atendidos por la Dirección de Recaudación que pasan a ser atendidos en las sub alcaldías y en las centralidades seleccionadas.	%	0	2012	P	-	40	-	-	40
					A	-	-	-	-	75

Details

Means of Verification: Informe técnico de la Dirección de Recaudaciones del GAMEA

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a las capacidades de planificación y gestión urbana territorial

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2021	EOP 2021
1.01	Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el órgano ejecutivo del GAMEA.	Plan	P	1	864,968
			P (a)	1	864,968
			A	1	1,040,884.2
1.02	Sistema de Información para el Seguimiento de Obras operando.	Sistema Informático	P	1	25,032
			P (a)	1	25,032
			A	-	-
1.03	Funcionarios capacitados en gestión de proyectos y en el uso del Sistema Informático de Seguimiento de Obras.	No de funcionarios	P	50	200,000
			P (a)	50	200,000
			A	-	-

Component Nbr. 2 Mejoramiento de la infraestructura urbana

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2021	EOP 2021
2.01	Obras civiles, incluida infraestructura de estaciones a lo largo de la Línea Plateada concluidas	Unidad	P	1	22,295,000
			P (a)	1	22,295,000
			A	1	22,295,000
2.02	Sistema electromecánico y equipamiento instalado y en funcionamiento	numero de sistemas	P	1	31,834,962
			P (a)	1	31,834,962
			A	1	30,361,360.62

Component Nbr. 3 Mejora de la prestación de servicios al ciudadano

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2021	EOP 2021
3.01	Sistema de gestión tributaria del GAMEA diseñado e implementado.	Sistema	P	1	735,219
			P (a)	1	735,219
			A	-	-
3.02	Ventanillas de atención ciudadana operando.	ventanillas	P	19	825,643
			P (a)	19	825,643
			A	19	404,528.61
3.03	Capacitación a funcionarios municipales en temáticas de prestación de servicios realizada.	funcionarios capacitados	P	346	-
			P (a)	346	-
			A	204	53,955.51
3.04	Campañas y/o ferias de comunicación para el uso de las ventanillas de atención ciudadana y concientización tributaria diseñadas e implementadas.	campañas	P	5	517,690
			P (a)	5	517,690
			A	3	126,326.88
3.05	Creación de una unidad de atención ciudadana en el GAMEA	Unidad constituida	P	1	171,448
			P (a)	1	171,448
			A	-	-

Other Cost			
	Administración, auditoria, monitoreo y evaluación (Componentes 1 y 3)	P	490,000
		P (a)	490,000
		A	345,985.81
	Administración, auditoria, monitoreo y evaluación (Componente 2)	P	80,000

	Administración, auditoria, monitoreo y evaluación (Componente 2)	P (a)	80,000
		A	32,602.13
	Supervisión	P	1,082,599
		P (a)	1,082,599
		A	1,082,599
	Fiscalización	P	815,449
		P (a)	815,449
		A	815,449
	Expropiaciones	P	531,990
		P (a)	531,990
		A	531,990
Total Cost			
	Total Cost	P	60,470,000
		P (a)	60,470,000
		A	57,090,681.76

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Institutional Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	18.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
