


# PMR Public Report

Operation Number	BR-L1487	Chief of Operations Validation Date	10/18/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Environmental Sanitation and Urban Development Program in the Mané Dendê River Basin	Loan Number	4302/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ? PMS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ? PMS		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Os documentos de planejamento social e ambiental estão aprovados, vigentes e em cumprimento, assim como o atendimento às legislações locais. O Programa iniciou a etapa 01 da obra, para a qual foram reassentadas 64 famílias. A PMS, buscando ocupar o Residencial Novo Mané Dendê já construído, avançou com o reassentamento de um total de 120 famílias oriundas das demais etapas de obras, que não contam com autorização para início de intervenção física. Essa decisão não reflete as melhores práticas, principalmente porque expõe o projeto a riscos de reocupação de áreas já desafetadas, representando um risco social e financeiro adicional a ser gerenciado pelo Programa. Não foram observados incumprimentos socioambientais diretamente nas frentes de obra em andamento.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1487	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	12,600,000	18.67%	54,900,000
Aggregated	67,500,000	67,500,000	67,500,000	0	135,000,000	67,500,000	12,600,000	18.67%	54,900,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

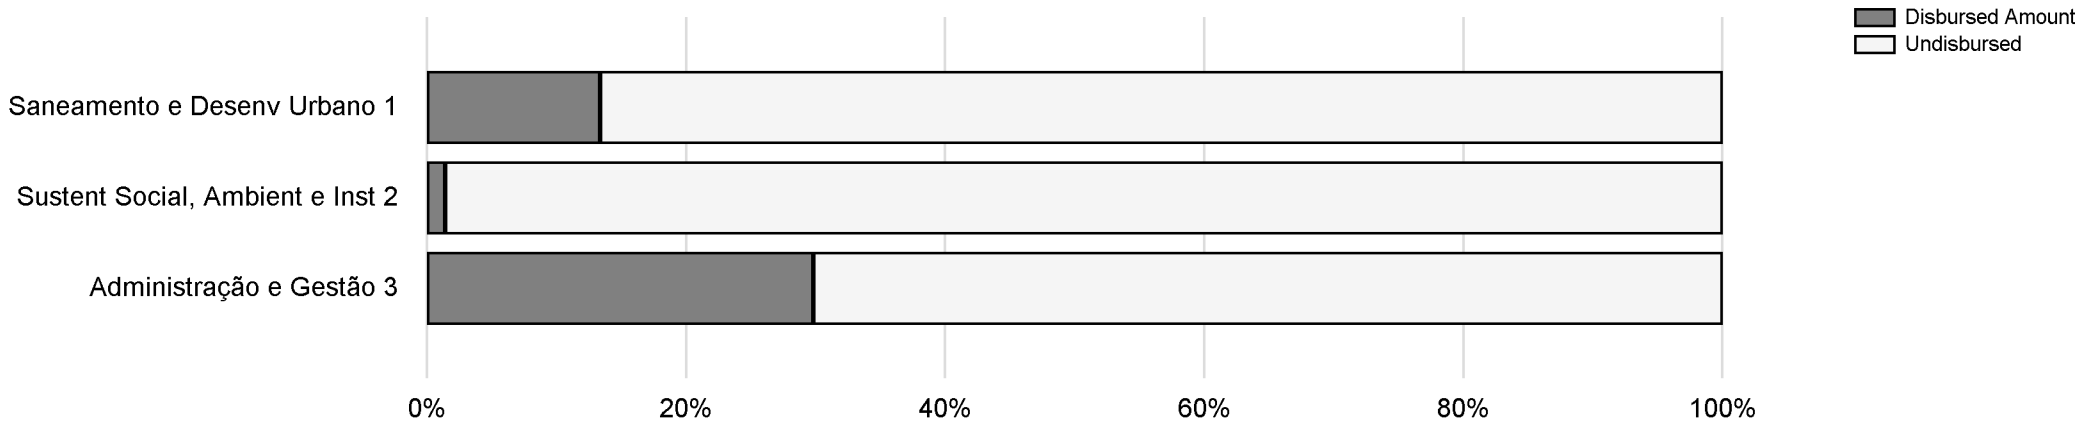

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir com a melhora do bem estar econômico e da qualidade de vida da população, por meio do melhoramento sustentável das condições socio-ambientais e de urbanização da bacia do Rio Mané Dendê							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.0	Valor dos imóveis na área de intervenção	R\$/m²	750	2017	2023	P	937.5
						A	-
Details							

**Means of Verification:** Dados Primários (investigação de campo)

**Observations:** Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
1.2	Internações por ano por enfermidades diarréicas agudas (de transmissão hídrica) em menores de 5 anos (casa 100.000 habitantes) na área de intervenção do Programa e áreas vizinhas (Bairros: Itacaranha, Rio Sena, Alto da Terezinha e Plataforma)			Internações/ano	1483	2016	2023	P	300
								A	-
Details									

**Means of Verification:** Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica de Salvador

**Observations:** Responsável: SEINFRA através da Secretaria de Saúde.

**The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO):** No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 0: Risco de inundação e situação vulnerável reduzido na bacia do Rio Mané Dendê											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Residências inundadas na área de intervenção do Programa	# of households	290	2017	P	-	-	-	-	10	10
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios da Defesa Civil											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.20.b Households with enhanced disaster and climate change resilience (# households) (C)						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Habitações habitadas em zona de deslizamento na área de intervenção do Programa	Habitações	107	2017	P	-	-	-	-	5	5
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios da Defesa Civil											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Specific Development Objectives Nbr. 1: Bacia do Rio Mané Dendê saneada social e ambientalmente											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Contribuições de águas residuais para o rio Mané Dendê	L/seg	10	2017	P	-	-	-	-	1	1
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Secretaria Municipal da Cidade Sustentável – SECIS											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Domicílios ligados a rede de esgotos na bacia do rio Mané Dendê	# of households	8256	2017	P	-	-	-	-	10,053	10,053
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Relatórios da EMBASA											
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)						

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Resíduos sólidos coletados nos pontos de intervenção do programa piloto		t/dia	26	2016	P	-	-	-	-	21	21
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Relatórios da LIMPURB												
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Resíduos sólidos recicláveis coletados nos pontos de intervenção do programa piloto		t/dia	1	2017	P	-	-	-	-	1.25	1.25
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Relatórios da LIMPURB												
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA)												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.4	Áreas recreativas estruturadas (praças, parques e paisagismo)		m2/hab	0.17	2017	P	-	-	-	-	.85	.85
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Relatórios de avanço do Programa												
Observations: A área considerada para linha base não considera os campos de futebol												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.5	Famílias com acesso direto a novas vias na área do Programa		Famílias	0	2017	P	-	-	-	-	1,011	1,011
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Relatórios de avanço do Programa												
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). Foram consideradas as famílias hoje existentes e que aumentarão com as famílias reassentadas.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.6	Famílias com acesso direto a vias melhoradas na área do Programa		Famílias	0	2017	P	-	-	-	-	1,854	1,854
						A	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Relatórios de avanço do Programa												
Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA). Foram consideradas as famílias hoje existentes e que aumentarão com as famílias reassentadas.												
Evaluation Methodology: -												

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.7	Índice de manutenção preventiva			reclamações/ano	1030	2016	P	-	-	-	500	500
							A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Ouvidoria Geral do Município de Salvador - OGMS

Observations: Responsável: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SEINFRA), através da OGMS

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Saneamento ambiental e urbanização

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Obras de Macrodrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	768	2,560	2,526,129	8,420,431
			P (a)	613.45	2,560	1,581,302.79	8,420,430.99
			A	440.44	952.44	1,461,802.46	2,628,085.18
1.02	Obras de Microdrenagem construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	1,857	6,712	1,514,039	3,785,097
			P (a)	2,118.88	6,712	3,537,969.89	3,785,096.99
			A	841.88	1,264.88	214,815.19	386,621.63
1.03	Obras de Contenção de Taludes na bacia do Rio Mané Dendê	m2	P	24,390	63,085	2,548,446	10,193,784
			P (a)	-	63,085	50,173.84	10,193,783.99
			A	-	-	-	-
1.04	Redes de água potável construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	2,171.5	3,213.5	180,317	400,704
			P (a)	342.25	3,213.5	22,082.87	400,703.99
			A	-	108	-	1,859.86
1.05	Redes de esgotamento sanitário construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	5,094	11,221	753,914	1,675,364
			P (a)	3,093.22	11,221	211,406.99	1,675,363.99
			A	434.84	1,395.38	55,570.36	117,959.41
1.06	Interceptores de águas residuais construídos na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	1,437	2,761	689,069	1,531,265
			P (a)	596.93	2,761	71,996.51	1,531,264.99
			A	361.35	937.89	48,485.97	117,550.53
1.07	Conexões domiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	679	1,500	138,475	307,719
			P (a)	44	1,500	1,703.09	307,718.99
			A	11	49	4,308.25	4,308.25
1.08	Conexões intradomiciliares de águas residuais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	1,130.5	2,499	586,625	1,303,609
			P (a)	17	2,499	8,868.08	1,303,608.98
			A	-	-	-	-
1.09	Novas vias construídas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	3,383	6,765	4,153,818	11,817,216
			P (a)	2,503.05	6,765	288,595.83	11,817,215.99
			A	-	600	-	61,857.37
1.10	Vias melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	m	P	5,336	10,673	1,547,538	3,095,076
			P (a)	1,098	10,673	229,251.45	3,095,075.99
			A	724	724	89,589.55	89,589.55
1.11	Unidades Habitacionais construídas na bacia do Rio Mané Dendê	Households (#)	P	350	970	11,918,523	33,031,337
			P (a)	-	710	-	32,251,567.65
			A	-	-	-	-
1.12	Habitações melhoradas na bacia do Rio Mané Dendê	Households (#)	P	245	540	1,091,778	1,819,630
			P (a)	245	540	135,279.26	1,819,630
			A	-	-	-	-
1.13	Famílias reassentadas no marco do Programa (inclui: indenizações, alugueis, mudanças, equipe técnico-social)	famílias	P	336	1,034	6,886,815	21,193,349
			P (a)	471	1,034	1,863,905.56	21,193,348.99
			A	68	231	649,937.55	3,068,752.48
1.14	Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	un	P	6	24	1,595,603	3,191,207

1.14	Obras de Urbanização e Paisagismo construídas na bacia do Rio Mané Dendê: praças	un	P (a)	7	24	475,095.52	3,191,206.99
			A	2.7	2.7	119,506.43	119,506.43
1.15	Equipamentos Urbanos (Mercado, Terminal Ônibus, Centro comunitário/Cultural e Creche/Escola) construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	2	5	3,875,320	6,458,867
			P (a)	-	5	-	6,458,867
			A	-	-	-	-
1.16	Mini-ecopontos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	-	5	-	533,192
			P (a)	1	5	84,905.66	533,191.99
			A	-	-	-	-
1.17	Pontos Verdes/Limpos construídos na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	-	10	-	197,364
			P (a)	-	10	-	197,364
			A	-	-	-	-
1.18	Galpão de separação de resíduos construído e equipado na bacia do Rio Mané Dendê	un	P	-	2	-	1,046,364
			P (a)	-	2	-	1,046,364
			A	-	-	-	-
1.19	Projetos Executivos Elaborados para a bacia do Rio Mané Dendê	conjunto de projetos	P	-	3	-	1,085,110
			P (a)	-	4	-	1,085,110
			A	-	4	-	930,998.74
1.20	Unidades Habitacionais produzidas pelo Programa MCMV		P	-	-	-	-
			P (a)	140	260	715,350.95	779,769.34
			A	54	174	62,145.11	126,563.5

Component Nbr. 2 Sustentabilidade ambiental, social e institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Plano integral de comunicação e educação do Programa elaborado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	-	1	-	46,025
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
2.02	Plano integral de comunicação e educação do Programa implementado (institucional, resíduos sólidos, sanitário e ambiental e reassentamento)	Plano	P	-	1	177,759	888,793
			P (a)	-	1	151,200	934,818
			A	-	-	-	-
2.03	Programa de capacitação e assistência técnica para cooperativas de resíduos sólidos implantado	Programa	P	-	1	-	188,518
			P (a)	-	1	-	188,518
			A	-	-	-	-
2.04	Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais elaborados	Planos	P	-	2	69,038	138,075
			P (a)	2	2	37,705.63	138,075
			A	-	-	-	-
2.05	Planos de fortalecimento institucional de entidades municipais implantados	Planos	P	2	6	1,043,234	5,216,164
			P (a)	-	6	19,200	5,216,164
			A	-	-	-	9,421.93
2.06	Programa de capacitação de organizações comunitárias do Programa implementado	Programa	P	1	1	38,354	76,708
			P (a)	1	1	7,547.17	76,708
			A	-	-	-	-
2.07	Projetos culturais para a preservação das práticas culturais afro-brasileiras no Parque São Bartolomeu implementados	Projetcos	P	1	1	46,025	92,050
			P (a)	-	1	7,000	92,050
			A	-	-	-	-
2.08	Plano de geração de trabalho e renda na bacia do Rio Mané Dendê elaborado	Plano	P	-	1	-	20,000
			P (a)	1	1	20,000	20,000
			A	-	-	-	-
2.09	Plano de geração de trabalho e renda na bacia do Rio Mané Dendê implementado	Plano	P	-	1	97,784	194,784
			P (a)	-	1	-	194,784
			A	-	-	-	-
2.10	Plano de monitoramento da qualidade da água do rio Mané Dendê implementado	Medições	P	6	30	18,576	92,883
			P (a)	8	30	46,858.72	92,883
			A	3	17	14,312.24	44,013.45
2.11	Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Cobre elaborado	Plano	P	1	1	306,000	306,000
			P (a)	-	1	-	306,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Supervisão das obras de saneamento e urbanização	P	1,062,994	3,543,316
		P (a)	608,123.61	3,543,315.99
		A	206,942.38	680,928.46
	Custos Financeiros	P	840,531	2,820,000
		P (a)	740,531	2,820,000
		A	210,236.94	1,340,164.41
	Admnistração, Auditoria e Avaliação (não inclui gerenciamento)	P	737,619	3,931,128
		P (a)	401,888.8	3,931,126.77



	Administração, Auditoria e Avaliação (não inclui gerenciamento)	A	107,094.78	1,217,850.89
	Apoio ao Gerenciamento	P	1,271,777	6,358,871
		P (a)	1,157,802.65	6,358,871
		A	429,916.39	2,210,154.38
Total Cost				
	Total Cost	P	45,716,100	135,000,000
		P (a)	12,475,745.87	134,999,998.61
		A	3,674,663.6	13,156,186.45

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Inactive		Institutional Environment		
	Response Actions				
	3.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Institutional Environment		
	Response Actions				
	6.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Social Environment
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Sustainability
	Response Actions		
	18.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Active		Social Environment
	Response Actions		
	21.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Planning
	Response Actions		
	24.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	27.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	30.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	33.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	36.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Active		Human Resources
	Response Actions		
	39.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
42	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	42.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
45	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	45.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
48	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	48.0	Management Strategy		Status	
		-			

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
51	Active		Technical Design
	Response Actions		
	51.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
54	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	54.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
57	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	57.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
60	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	60.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
63	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	63.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
66	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	66.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
69	Inactive		Natural Environment		
	Response Actions				
	69.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	69.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
71	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	71.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
