


PMR Public Report

Operation Number	CO-L1125	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/03/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	Loan Number	3104/OC-CO
Executing Agency	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Team Leader	ACEVEDO ALAMEDA, PALOMA	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se avanzó con el cumplimiento del Plan de Acción Correctivo de mayo 2021 dentro del cronograma acordado. Se tiene una nueva ubicación para el proyecto de la toma de agua para la planta desalinizadora, se han realizado los estudios socio ambientales y se cuenta con la licencia de Coralina para el punto de toma y se está tramitando la licencia para el punto de vertimiento. La tormenta IOTA impactó la isla y la infraestructura del Programa para lo que se realizó un inventario de daños y plan de respuesta de emergencia que está siendo aplicado.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00%	-
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0.00%	-
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

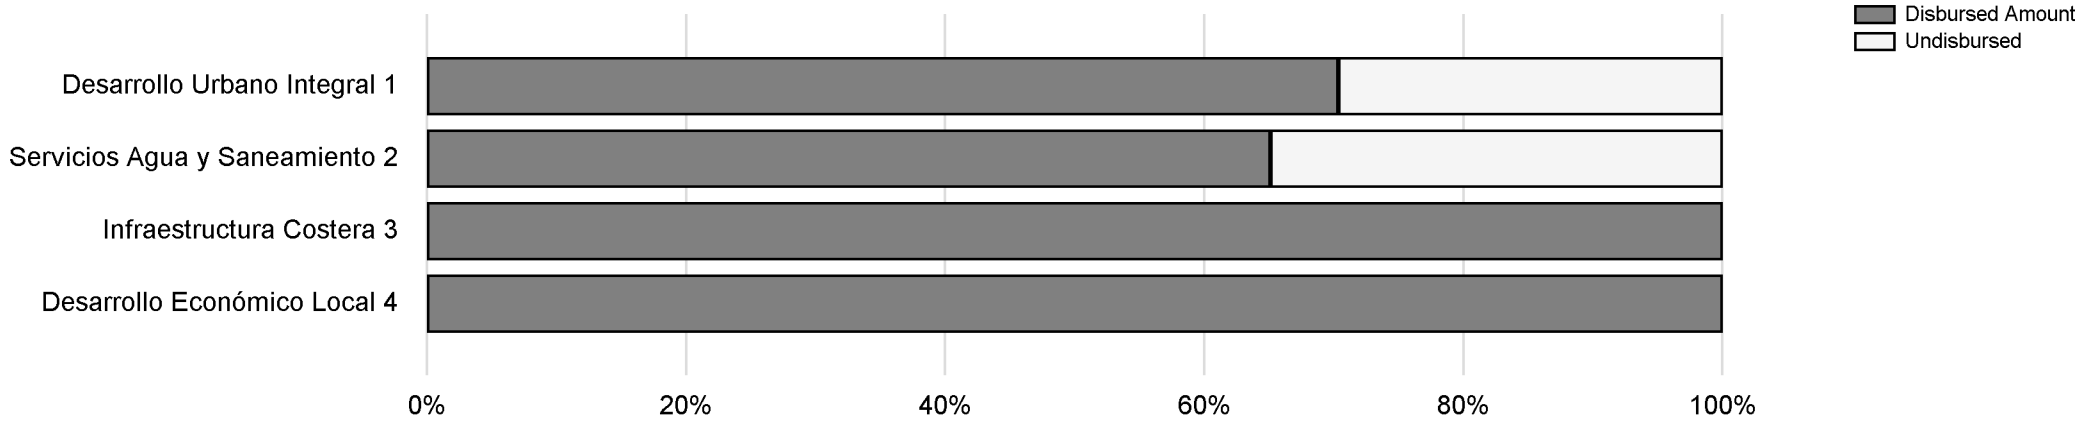

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2022	
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.9	2013	2022	P	75
						A	-

Details

Means of Verification: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.6	2011	P	-	-	-	-	-	-	-	-	30
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de calidad de vida del DANE

Observations: El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P	-	-	-	-	-	-	-	-	93.1
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45	2013	P	-	-	-	-	-	-	-	-	57.8
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Micro y pequeñas empresas desarrolladas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.7	2012	P	-	-	-	-	-	-	-	-	47
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 4: Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	# of households	800	2013	P	1,000	1,500	2,000	-	-	-	-	-	2,500
					A	-	-	-	-	-	-	700	-	-

Details

Means of Verification: Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7	2013	P	7	10	11	-	-	-	-	-	12
					A	-	-	-	-	-	-	6	-	-

Details

Means of Verification: Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 5: Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	EOP 2022
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P	-	-	-	-	-	-	-	-	59
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
1.01	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	-	6	-	12,600,000
			P (a)	1	8	5,581,735	17,573,584
			A	-	7	-	11,991,849
1.02	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	programas	P	-	3	-	200,000
			P (a)	-	3	-	-
			A	-	3	-	-
1.03	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P	-	0.9	-	6,753,000
			P (a)	0.9	0.9	-	148,626
			A	-	-	-	148,626
1.04	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	-	1	-	2,457,000
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.05	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	-	1	-	2,490,000
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
2.01	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	-	25	-	6,335,000
			P (a)	25	25	17,521,648	20,612,699.26
			A	-	-	-	3,091,051.26
2.02	Redes rehabilitadas	km	P	-	25	-	7,919,000
			P (a)	-	42.5	381,648.71	12,922,243.71
			A	-	42.5	-	12,540,595
2.03	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	-	1	-	4,387,000
			P (a)	-	1	-	1,609,329
			A	-	1	-	1,609,329
2.04	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	-	1	-	1,663,000
			P (a)	-	1	635,092	5,930,951.32
			A	-	1	-	5,295,859.32

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
3.01	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	-	3	-	4,800,000
			P (a)	-	3	-	926,032
			A	-	3	-	926,032
3.02	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	-	1.1	-	3,200,000
			P (a)	1.1	1.1	-	-
			A	-	-	-	-
3.03	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P	-	4	-	500,000
			P (a)	4	4	-	-
			A	-	-	-	-
3.04	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P	-	1	-	300,000
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
3.05	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P	-	3	-	200,000
			P (a)	3	3	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
4.01	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	# of beneficiaries	P	-	90	-	240,000
			P (a)	34	90	-	1,406,666.71
			A	-	56	-	1,406,666.71
4.02	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	# of MSMEs	P	-	95	-	4,760,000
			P (a)	-	480	-	2,774,055
			A	-	480	-	2,774,055

Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2022	2022	EOP 2022
5.01	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P	-	30	-	210,000
			P (a)	11	30	41,479	106,193
			A	-	19	-	64,714
5.02	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	estudio	P	-	1	-	340,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
5.03	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	-	1	-	300,000
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
5.04	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P	-	30	-	600,000
			P (a)	-	37	-	164,223
			A	-	37	-	164,223
5.05	Sistema de información para la administracion de la defensa juridica diseñado e implementado	Sistema	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-

Other Cost				
	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P		4,500,000
		P (a)	1,128,443	5,388,299
		A	0	4,259,856
	Auditoria	P		500,000
		P (a)	126,529	437,098
		A	170,706	481,275
Total Cost				
	Total Cost	P	0	70,000,000
		P (a)	25,416,574.71	70,000,000
		A	170,706	44,754,131.29

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Political Environment
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
12	Active		Environmental and Social Safeguards		
	Response Actions				
	12.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	
	12.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	15.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Legal Environment
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Environmental and Social Factors
Legal aspects and public processes
