


PMR Public Report

Operation Number	GU-L1169	Chief of Operations Validation Date	10/11/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Road Infrastructure Development Program	Loan Number	4746/OC-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Sector/Subsector	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Team Leader	CORTES FORERO, RENE ALEJANDRO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Guatemala
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación ha sido aprobada por la Directiva del Banco en cumplimiento con las políticas y declarado elegible pero no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño. Sin embargo, se ha realizado el taller de arranque con participación de ESG y sus especialistas socioambientales participa en la revisión de la documentación de la licitación de la primera obra.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
GU-L1169	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	5,093,938	3.40%	144,906,062
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	5,093,938	3.40%	144,906,062
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

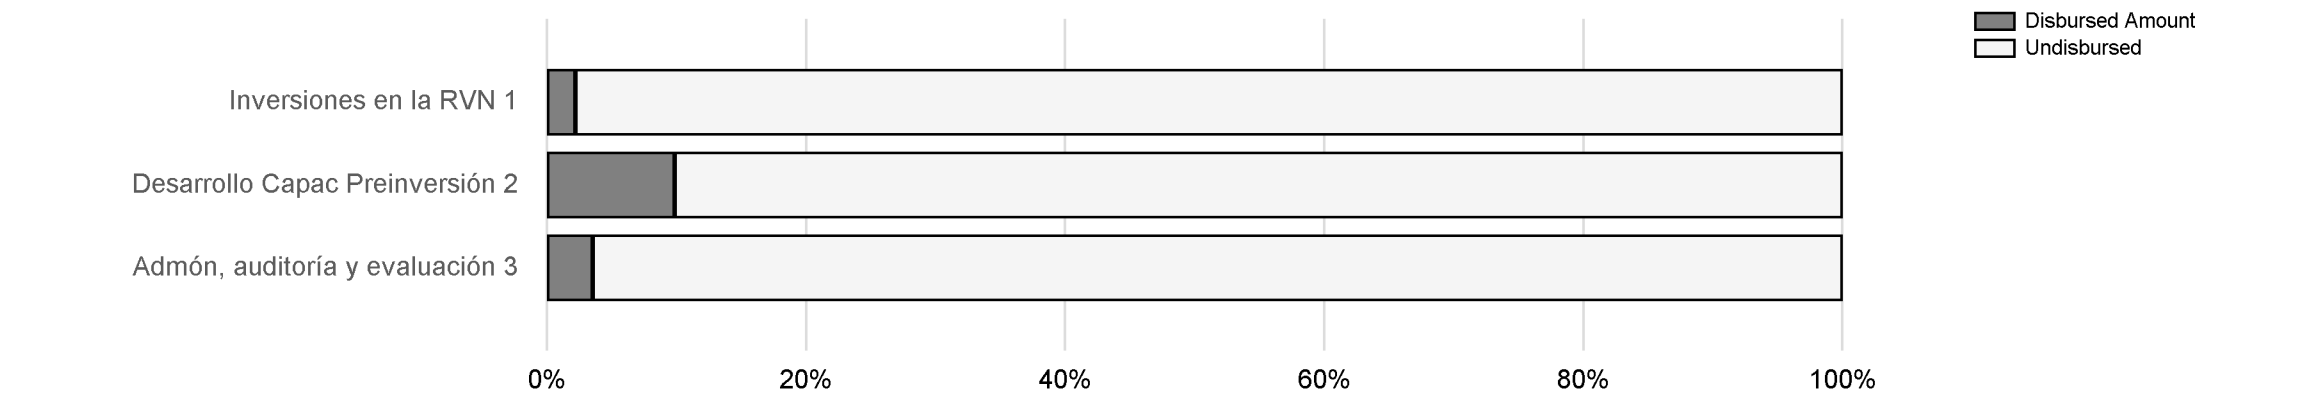

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Movilidad Sostenible de personas y mejora en acceso a servicios básicos y a mercados de consumo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.0	Tiempo Promedio de acceso a los centro de salud y educación	minutos	0	2018	2026	P	-
						A	-

Details

Means of Verification: Encuestas

Observations: valores de línea base y metas a ser medidos previo al inicio de obras

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.2	Tiempo promedio de acceso a mercados de consumo	minutos	0	2018	2026	P	-
						A	-

Details

Means of Verification: Encuestas

Observations: Se medirá en encuestas de forma desagregada a usuarios (ingreso, ubicación, edad, etc)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.3	Tiempo promedio de acceso a los centros de salud y educación por parte de mujeres	minutos	0	2018	2026	P	-
						A	-

Details

Means of Verification: Encuestas

Observations: valores de línea base y metas a ser medidos previo al inicio de obras

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.4	Tiempo promedio de acceso a mercados de consumo por parte de mujeres	minutos	0	2018	2026	P	-
						A	-

Details

Means of Verification: Encuestas

Observations: Se medirá en encuestas de forma desagregada a usuarios (genero, grupo étnico, ingreso, ubicación, edad, etc)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.5	Tiempo promedio de acceso a los centros de salud y educación por grupo étnico			minutos	0	2018	2026	P	-
								A	-
Details									

Means of Verification: Encuestas

Observations: valores de línea base y metas a ser medidos previo al inicio de obras

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2026	
1.6	Tiempo promedio de acceso a los mercados de consumo por grupo étnico			minutos	0	2018	2026	P	-
								A	-
Details									

Means of Verification: Encuestas

Observations: Se medirá en encuestas de forma desagregada a usuarios (ingreso, ubicación, edad, etc)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Reducción de los costos de operación vehicular en los tramos viales intervenidos por el proyecto

Observation: Evaluación económica ex post deberá incluirse en el informe final del proyecto

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
1.0	Reducción de Costos de Operación Vehicular	Porcentaje	100	2018	P	-	60
					A	-	-

Details

Means of Verification: HDM4-VOC

Observations: Estudio de Costos de Operación Vehicular en base al HDM4-VOC del modelo RED

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Reducción de los tiempos de viaje de los usuarios en los tramos intervenidos por el proyecto

Observation: Evaluación económica ex post deberá incluirse en el informe final del proyecto

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
2.0	Reducción de tiempos de viaje	Porcentaje	100	2018	P	-	55
					A	-	-

Details

Means of Verification: Encuestas

Observations: Siguiendo la misma metodología que en la evaluación ex ante

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incremento de la movilidad sostenible en los tramos intervenidos por el proyecto

Observation: Evaluación económica ex post deberá incluirse en el informe final del proyecto

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.3	Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA)	Porcentaje	100	2018	P	-	150
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación económica ex post

Observations: La evaluación deberá incluirse en el informe final del proyecto.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
3.4	Aumento del número de días por año que las carreteras están en operación	No. Días	280	2018	P	-	365
					A	-	-

Details

Means of Verification: Cantidad de precipitaciones

Observations: Reportes servicio meteorológico

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 4: Desarrollo de capacidades y preinversión

Observation: Pliegos de Licitaciones realizadas

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 2026
4.0	Número de licitaciones de proyectos con adicionalidad en resiliencia de la infraestructua al Cambio Climático y Seguridad vial	No. Licitaciones	0	2018	P	-	7
					A	-	-

Details

Means of Verification: Pliegos de licitaciones realizadas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en la RVN

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
1.01	Mejoramiento de Tramos Carreteros	km	P	10.7	145.05	23,978,342	127,813,147
			P (a)	-	145.05	12,950,000	127,813,147
			A	-	-	3,737,222.46	6,141,374.46
1.02	Construcción puente vehicular Chitomax, Caserío Chitomax	Puente	P	-	1	7,078,870	17,186,853
			P (a)	-	1	3,500,000	17,186,853
			A	-	-	166,455.52	166,455.52

Component Nbr. 2 Desarrollo de capacidades y preinversión

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2026	2022	EOP 2026
2.01	Estudios de preinversión para mejoramiento de tramos carreteros	Estudios	P	3	4	712,412	989,000
			P (a)	3	4	842,765.47	989,000
			A	-	-	470,171.41	470,171.41
2.02	Herramientas de Gestión de Proyectos Viales Fortalecidas durante la vida del Proyecto	Herramientas	P	1	2	694,127	2,646,000
			P (a)	1	2	602,478.51	2,646,000
			A	-	-	41,644.83	225,057.08
2.03	Unidad Coordinadora de Proyectos BID Fortalecida mediante la Adquisición de Equipo y Mejoramiento de Instalaciones	UCP	P	1	1	297,000	575,000
			P (a)	1	1	575,000	575,000
			A	-	-	-	-
2.04	Plan Anual de Capacitaciones Implementado	Plan	P	1	5	5,905	90,000
			P (a)	1	5	15,904.77	90,000
			A	-	1	-	-

Other Cost				
	Administración, auditoría y evaluación	P	60,943	700,000
		P (a)	200,056.59	700,000
		A	45,385.6	45,385.6

Total Cost				
	Total Cost	P	32,827,599	150,000,000
		P (a)	18,686,205.34	150,000,000
		A	4,460,879.82	7,048,444.07

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Governance Framework
	Response Actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Planning
	Response Actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	12.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Legal Environment
	Response Actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
