


PMR Public Report

Operation Number	HA-L1135	Chief of Operations Validation Date	10/14/22
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/22	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Water supply, sanitation and hygiene project in urban, periurban and rural areas in Haiti's Grand North Region	Loan Number	4697/GR-HA
Executing Agency	DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT, OFFICE RÉGIONAL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT NORD	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	PEREZ MONFORTE, SERGIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Haiti
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLIQUE D'HAITI		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	L'AE continue avec la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sur tout le programme. Il reste quelques consultations à réaliser pour des sous-projets (marchés) de catégorie B. L'AE va de l'avant avec le projet principal au Cap-Haïtien, une consultation publique a été réalisé avec les chauffeurs de camion de transport d'eau potable qui sont affectés par le projet et une deuxième consultation de suivi est prévue courant du mois de mai. Le contrat de la consultante internationale environnementale et sociale (E&S) est terminé, WSA a recruté un consultant pour appuyer l'équipe environnementale et sociale de la DINEPA en particulier dans la supervision du programme.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
HA-L1135	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	21,706,868.87	17.37%	103,293,131.13
Aggregated	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	21,706,868.87	17.37%	103,293,131.13
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

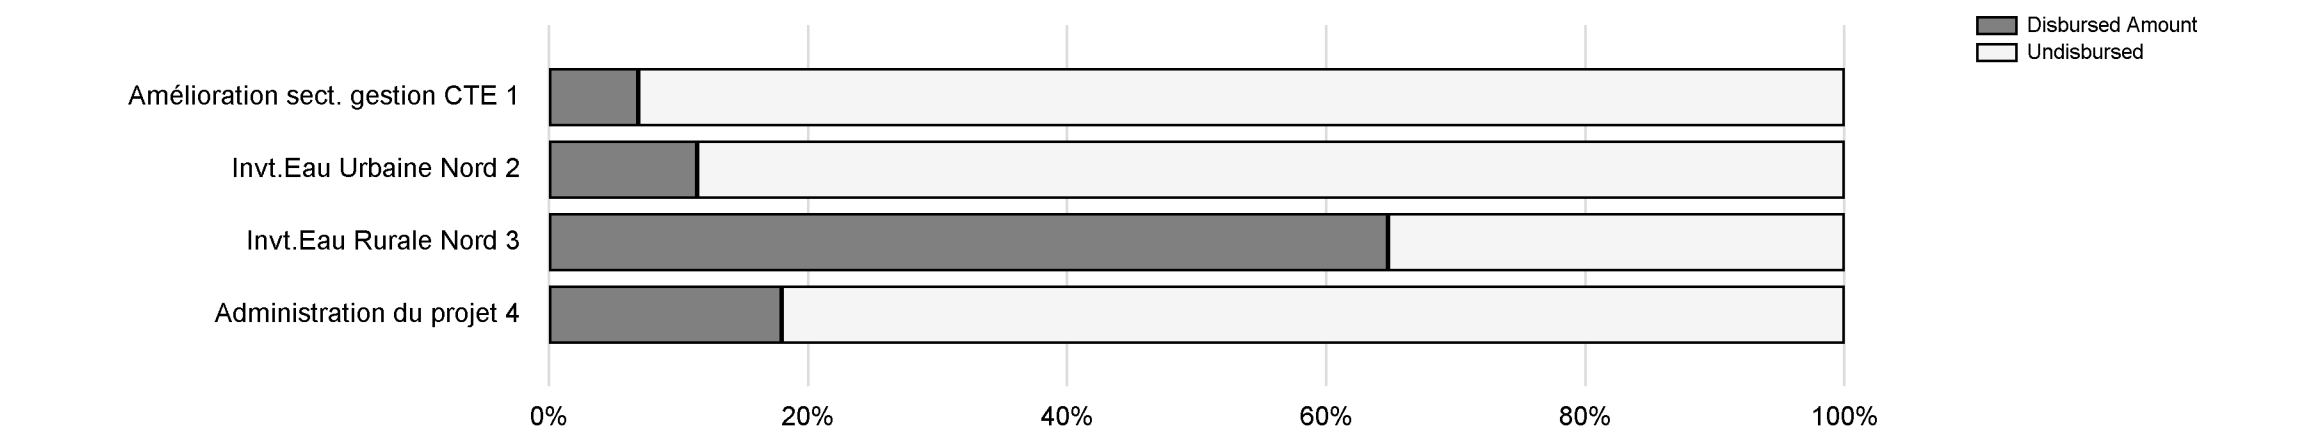

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX														
Specific Development Objectives														
Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado 1: Los CTEs de Haití mejoran la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento y se mejoran las competencias del regulador y de las estructuras desconcentradas														
Observation:														
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.0	El CTE de Cabo Haitiano alcanza el equilibrio financiero		CTE	0	2018	P	-	-	-	-	-	1	-	1
						A	-	-	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Informe anual consolidado por el regulador														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.1	Otros CTE del país alcanzan el equilibrio financiero (ratio de los ingresos operativos anuales mayor que los gastos operativos anuales)		CTE	2	2018	P	-	-	-	3	-	5	-	5
						A	-	5	5	5	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Informe anual consolidados por el regulador														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.2	Número de CTEs que proveen información conforme a los requerimientos del regulador en materia de la explotación		CTE	4	2018	P	4	4	8	16	20	24	-	24
						A	4	24	24	24	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Informe del regulador consolidado														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.3	La OREPA Norte dispone de una planificación de las inversiones, considerando la disponibilidad de recurso hídrico de 3 CTE		CTE	0	2018	P	-	-	1	1	1	-	-	3
						A	-	-	-	-	-	-	-	-
Details														
Means of Verification: Auditoria intermedia y final														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

0.4	Indicator		Mujeres formando parte del personal técnico del CTE de Cabo Haitiano, puestos de gestión y de operación		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025											
								P	-	-	-	20	-	30	-	30										
								A	-	10	10	10	-	-	-											
Details																										
Means of Verification: Auditoria intermedia y final																										
Observations:																										
Evaluation Methodology: -																										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																						
Indicator																Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
0.5	CTEs que incorporan la gestión del saneamiento en su plan de negocios				Plan de negocio	0	2018	P	-	-	-	1	-	1	-	2										
								A	-	1	1	1	-	-	-	-										
Details																										
Means of Verification: Planes de negocio aprobados por la OREPA																										
Observations:																										
Evaluation Methodology: -																										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																						
Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 2: El acceso a los servicios de agua y saneamiento de los hogares, la calidad del servicio de agua y las prácticas de higiene se han mejorado en las ciudades del Norte de Haití																										
Observation:																										
Indicator																Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Número de hogares con acceso a un servicio de agua gestionado de forma segura en Cabo Haitiano				Hogar	2000	2017	P	10,000	-	-	14,500	-	40,000	-	40,000										
								A	-	1,418	1,418	1,558	-	-	-	-										
Details																										
Means of Verification: Informe intermedio del regulador. Encuesta de hogares inicial y final																										
Observations:																										
Evaluation Methodology: -																										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																						
Indicator																Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Porcentaje de hogares en Cabo Haitiano con acceso a un servicio de agua básico a través de los kioscos de la red				Porcentaje	2	2017	P	-	-	-	5	-	11	-	11										
								A	-	2	2	2	-	-	-	-										
Details																										
Means of Verification: Informe intermedio del regulador. Encuesta de hogares inicial y final																										
Observations:																										
Evaluation Methodology: -																										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator																						
Indicator																Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Aumento del número de hogares que adquieren un servicio de agua gestionado de forma segura en otras ciudades cubiertas por el Programa				Hogar	0	2019	P	-	-	-	15,000	-	32,500	-	32,500										
								A	-	-	-	140	-	-	-	-										
Details																										

Means of Verification: Informe intermedio del regulador. Encuesta de hogares inicial y final

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Hogares de Cabo Haitiano con acceso a un servicio de saneamiento manejado de forma segura	%	1.4	2017	P	-	-	-	6	-	15	-	15
					A	-	6	6	6	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares inicial, intermedia y final completado con diagrama de flujo de excretas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	Personas que practican la defecación al aire libre en los barrios desfavorecidos de Cabo Haitiano	%	23	2017	P	-	-	-	12	-	11	-	11
					A	-	23	23	23	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe intermedio del regulador. Encuesta de hogares inicial y final

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.5	Hogares de Cabo Haitiano con acceso a un servicio básico de higiene	%	9	2017	P	-	-	-	35	-	30	-	30
					A	-	9	9	9	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares inicial, intermedia y final

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.6	Hogares con acceso a un servicio básico de higiene en otras ciudades cubiertas por el Programa	%	3	2017	P	-	-	-	29	-	24	-	24
					A	-	3	3	3	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta de hogares inicial en la muestra de otras ciudades (Gonaïves). Encuesta intermedia y final en muestra de ciudades que serán cubiertas por el programa

Observations: La encuesta intermedia y final tendrán un universo que abarque al menos al 50% de los hogares de las ciudades cubiertas por el programa. Cabo Haitiano no incluido

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 3: El acceso a los servicios de agua y saneamiento de los hogares, la calidad del servicio de agua y las prácticas de higiene se han mejorado en las zonas rurales Norte de Haití

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.1	Hogares con acceso a un servicio básico de agua en las 16 SC incluidas en el programa	Hogares	26842	2017	P	-	-	-	40,000	-	110,000	-	110,000
					A	-	26,842	28,642	28,642	-	-	-	-
Details													

Means of Verification: Informe intermedio del regulador. Encuesta de hogares inicial y final

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Hogares con acceso a un servicio básico de higiene en las 16 SC del programa	%	2	2017	P	-	-	-	50	-	40	-	40
					A	-	2	2	2	-	-	-	-
Details													

Means of Verification: Encuesta inicial en 34 SC. Encuesta intermedia y final en una muestra de las secciones comunales cubiertas por el programa.

Observations: La encuesta intermedia y final tendrán un universo que abarque al menos al 50% de los hogares de las ciudades cubiertas por el programa

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.4	Edificios públicos -escuelas públicas, centros de salud públicos y mercados públicos- que ofertan servicios de agua, saneamiento e higiene (incluyendo la higiene menstrual) al menos de nivel básico en las 16 SC del programa	%	2	2017	P	-	-	-	46	-	80	-	80
					A	-	2	2	2	-	-	-	-
Details													

Means of Verification: Informe intermedio del regulador. Encuesta de hogares inicial y final

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Los CTEs de Haití mejoran la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento y se mejoran las competencias del regulador y de las estructuras desconcentradas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Campañas de comunicación y de transparencia para la conectividad al sistema de agua potable implementadas	campañas	P	1	2	200,000	500,000
			P (a)	1	4	50,000	500,000
			A	1	3	12,733.95	82,733.95
1.02	Catastro de clientes de redes de agua potable de CTEs actualizado en 5 CTEs	Base de datos en CAD/SIG	P	2	5	53,000	128,000
			P (a)	6	13	-	128,000
			A	-	5	-	-
1.03	Gestión comercial mejorada en 5 CTEs	CTE	P	2	5	50,000	100,000
			P (a)	6	12	-	100,000
			A	-	6	-	-
1.04	CTEs dotados de material y personal	Dotación	P	3	25	120,000	542,000
			P (a)	3	25	120,000	542,000.11
			A	3	24	5,499.56	401,989.67
1.05	Construcción y rehabilitación de los edificios correspondientes a la OREPA Norte y a la DINEPA, a la gestión comercial y operacional de los CTEs	edificio	P	1	4	1,510,000	1,910,000
			P (a)	0.3	2.3	80,000	1,710,844.34
			A	-	-	3,179.13	22,023.47
1.06	Contrato por resultados para gestión del CTE de Cabo Haitiano durante 48 meses firmado y en aplicación	Contrato	P	-	1	3,600,000	12,400,000
			P (a)	1	1	4,570,000	12,600,000.14
			A	1	1	4,628,846.26	4,631,074.4
1.07	Informes de la DINEPA concernientes a la producción y a la facturación de los CTEs elaborados	Informe	P	1	5	200,000	1,000,000
			P (a)	0.5	4.5	200,000	1,000,000.65
			A	-	2	77,333.98	459,562.46
1.08	Programa de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales y actualización del modelo del acuífero de Balan elaborados	Informe	P	-	2	70,000	200,000
			P (a)	-	2	-	200,000
			A	-	-	19,491.18	19,491.18
1.09	OREPA Norte dotada de personal y material	Dotación	P	1	5	300,000	1,200,000
			P (a)	1	5	200,000	1,200,000.7
			A	1	3	105,569.18	700,101.88
1.10	Proyecto piloto para aumentar la participación de las mujeres en la operación y en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento implementados	Piloto	P	-	1	50,000	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	-	-	-
1.11	Estrategia de saneamiento urbano en Haití y planes maestros de saneamiento validados	Informe	P	-	4	70,000	520,000
			P (a)	-	4	-	520,000
			A	-	-	-	-

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Conexiones instaladas en los CTEs cubiertos por el programa	Conexión	P	9,000	28,250	1,981,460	5,660,000
			P (a)	2,300	28,250	700,000	5,660,000
			A	-	-	707,933.53	707,933.53
2.02	Diseños y materiales para las medidas de rápido impacto adquiridos e instalados	CTE	P	2	4	1,550,000	3,550,000
			P (a)	3	4	-	3,550,000
			A	-	0.13	-	-
2.03	Pozos de Cabo haitiano perforados, equipados y en operación	Pozo	P	1	4	1,130,000	4,040,000
			P (a)	1	4	9,000	4,040,000
			A	1	1	14,434.42	14,434.42
2.04	Depósitos de agua construidos	Depósitos	P	-	1	-	2,400,000
			P (a)	1	1	300,000	2,400,000
			A	-	-	-	-
2.05	Red de distribución y líneas de impulsión de Cabo Haitiano construidas	km	P	96	267	9,940,000	33,520,000
			P (a)	70	267	3,000,000	33,606,422.3
			A	14	14	7,982.13	9,114,404.43
2.06	Sistemas de agua condominial en Cabo Haitiano construidos	Sistema	P	50	266	580,000	2,120,000
			P (a)	-	266	-	2,163,580.31
			A	-	-	-	89,580.31
2.07	Kioscos construidos en Cabo Haitiano	Kiosco	P	50	73	330,000	1,060,000
			P (a)	-	73	60,000	1,060,000
			A	-	-	-	-
2.08	Proyecto piloto de saneamiento condominial semicolectivo en Cabo Haitiano implementado	Proyecto piloto	P	1	1	1,950,000	2,100,000
			P (a)	-	1	-	2,100,000
			A	-	-	-	-
2.09	Proyecto piloto de incorporación de soluciones tipo CBS (Containment Based Sanitation) en los servicios ofrecidos por el CTE de Cabo Haitiano implementado	Proyecto piloto	P	-	1	570,000	1,480,000
			P (a)	-	1	-	1,480,000
			A	-	-	-	-
2.10	Proyecto piloto de mejora de la gestión de lodos procedentes de soluciones individuales implementado	Proyecto piloto	P	-	1	200,000	500,000
			P (a)	-	1	-	500,000
			A	-	-	-	-
2.11	Proyectos pilotos de saneamiento en otras ciudades del Norte de Haití implementados	Proyecto piloto	P	-	1	335,000	1,000,000
			P (a)	-	1	-	1,033,000
			A	-	-	-	-
2.12	Construcción de sistemas de agua potable en áreas urbanas del Norte de Haití	Sistema	P	2	6	12,750,000	28,460,000
			P (a)	-	6	2,450,000	28,157,512.42
			A	-	-	12,208.94	59,721.36
2.13	Campañas de cambio de comportamiento para reducir la defecación al aire libre en áreas marginales y fomentar las prácticas de higiene implementadas	campaña	P	-	2	-	1,200,000
			P (a)	-	1	-	1,200,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Componente 3: Inversiones prioritarias en agua potable, saneamiento e higiene en localidades rurales del norte de Haití

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	Puntos de agua contruidos o rehabilitados	Puntos de agua	P	55	120	900,000	2,500,000
			P (a)	-	120	-	823,259.12
			A	-	-	-	-
3.02	Sistemas por gravedad contruidos o rehabilitados	Sistemas	P	10	35	2,500,000	6,300,000
			P (a)	-	35	-	6,315,000
			A	-	5	-	215,000
3.03	Instalaciones de agua, saneamiento e higiene en edificios públicos -escuelas, centros de salud y mercados- contruidas o rehabilitadas	Instalación	P	74	268	1,500,000	3,200,000
			P (a)	-	268	-	3,200,000
			A	-	-	-	-
3.04	Campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene implementadas	campaña	P	5	16	600,000	2,000,000
			P (a)	-	16	-	2,000,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Componente : medidas de mitigación de la pandemia Covid 19 ejecutadas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
4.01	Puntos de lavado de manos en sitios sensibles, contruidos y operados	puntos de lavado de manos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	911	-	1,500,000
			A	-	911	-	1,218,554.19
4.02	Campañas de divulgación relativas a las medidas de higiene realizadas	campaña	P	-	-	-	-
			P (a)	-	3	-	182,173.11
			A	-	3	-	182,173.11
4.03	Otras estructuras regionales (OREPA) dotadas para asegurar la coordinación de actividades	OREPA	P	-	-	-	-
			P (a)	-	2	-	150,000
			A	-	2	-	50,652.83

Other Cost				
	Contratacion de personal para la Unidad Ejecutora	P	850,000	3,400,000
		P (a)	200,000	3,366,771.56
		A	212,892.16	827,381.33
	PDPP, mecanismo de quejas, contingencias ambientales y sociales	P	75,000	310,000
		P (a)	20,000	311,435.24
		A	5,242.68	41,677.92
	Evaluación de impacto	P	250,000	950,000
		P (a)	0	950,000
		A	0	0
	Auditoría	P	90,000	500,000
		P (a)	90,000	500,000
		A	0	0
	Evaluación Intermedia y Final	P	70,000	150,000
		P (a)	0	150,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	44,374,460	125,000,000

	Total Cost	P (a)	12,049,000	125,000,000
		A	5,813,347.1	18,838,490.44

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Materialized		Systems		
	Response Actions				
	3.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Materialized		Systems		
	Response Actions				
	6.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Materialized		Organizational Structure		
	Response Actions				
	9.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	9.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
12	Materialized		Organizational Structure		
	Response Actions				
	12.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	
	12.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
15	Active		Organizational Structure		
	Response Actions				
	15.1	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		INACTIVE	
	15.2	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Active		Organizational Structure
	Response Actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
21	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	21.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
24	Inactive		Social Environment
	Response Actions		
	24.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
27	Inactive		Governance Framework
	Response Actions		
	27.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
30	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	30.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
33	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	33.1	Management Strategy	Status
		ACCEPT	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
36	Active		Social Environment
	Response Actions		
	36.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
39	Inactive		Goods, and Services
	Response Actions		
	39.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
42	Inactive		Organizational Structure
	Response Actions		
	42.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
44	Active		Political Environment
	Response Actions		
	44.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
46	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	46.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
48	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	48.1	Management Strategy	Status
		TRANSFER	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
49	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	49.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
