

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1073	Chief of Operations Validation Date	10/13/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/13/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Comprehensive Solid Waste Management Implementation in Bolivia	Loan Number	2880/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	Sector/Subsector	AS-SOL - WATER AND SANITATION-SOLID WASTE
Team Leader	GARZONIO,OMAR DARIO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BOLIVIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1073	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	5,655,487.85	28.28%	14,344,512.15
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	5,655,487.85	28.28%	14,344,512.15

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

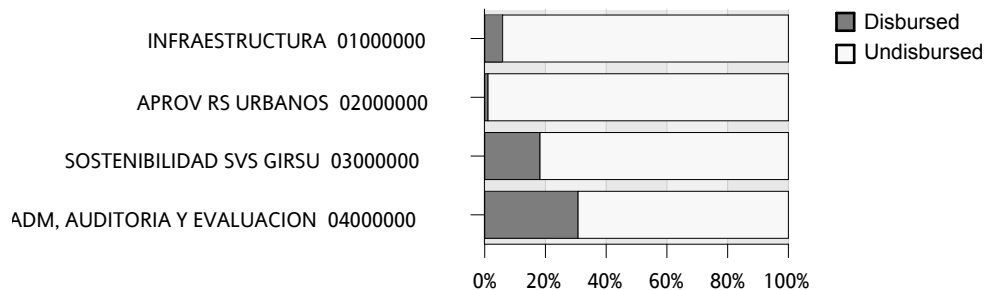

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento en la cobertura de acceso a disposición adecuada de RSU

Observation: Medios de verificación: Registro de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios de los proyectos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios a nivel nacional	Ton/día	1748.6	2010	P	1,748.60	1,748.60	1,900.50	2,320.50	2,464.70	2,464.70
					P(a)	1,748.60	1,748.60	1,900.50	1,748.60	2,464.70	2,464.70
					A	1,748.60	1,748.60	1,748.60			1,748.60

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: En el Diagnóstico Nacional de la GIRS aparece la cifra del 45% de RSU dispuestos en rellenos sanitarios; sin embargo, la disposición final de El Alto no puede calificarse como tal, por lo que la cantidad de RSU dispuestos en RS es realmente del 37% a nivel nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios a nivel nacional	%	37.0	2010	P						
					P(a)			37.00	37.00	51.00	51.00
					A		37.00	37.00			37.00

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: En el Diagnóstico Nacional de la GIRS aparece la cifra del 45% de RSU dispuestos en rellenos sanitarios; sin embargo, sin considerarse la disposición final de El Alto la cantidad de RSU dispuestos en RS es de 37% a nivel nacional

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Cobertura del Servicio de Recolección Aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en Riberalta	%	70.0	2012	P	84.00	84.00	86.00	88.00	90.00	90.00
					P(a)	84.00	75.00	77.00	77.00	80.00	80.00
					A	75.00	70.00	77.00	77.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en Potosí	%	65.0	2012	P	75.00	75.00	77.00	79.00	80.00	80.00
					P(a)	75.00	80.00	82.00	82.00	85.00	85.00
					A	80.00	80.00	82.00	82.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Hogares con acceso al servicio de recolección en Riberalta	Hogares	15303.0	2012	P	15,303.00	15,303.00	18,395.00	18,931.00	19,483.00	19,483.00
					P(a)	15,303.00	15,303.00	16,988.00	16,988.00	19,483.00	19,483.00
					A	15,303.00	15,303.00	16,988.00	16,988.00		

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year							
1.4	Hogares con acceso al servicio de recolección en Potosí	Hogares	31962.0	2012	P	23,493.00	23,493.00	26,095.00	26,361.00	26,629.00	26,629.00
					P(a)	23,493.00	31,962.00	33,710.00	33,710.00	35,389.00	35,389.00
					A	31,962.00	31,962.00	33,710.00	33,710.00		

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Cobertura del servicio de recolección de Residuos Sólidos en El Alto	%	80.0	2012	P	85.00	89.00	90.00	90.00	
					P(a)	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00
					A	85.00	85.00	85.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Hogares con acceso al servicio de recolección en El Alto	Hogares	169768.0	2012	P	170,778.00	170,778.00	209,503.00	222,916.00	234,462.00
					P(a)	170,778.00	171,719.00	182,288.00	182,288.00	191,159.00
					A	171,719.00	171,719.00	182,288.00	182,288.00	

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Cobertura del Servicio de barrido aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	Cobertura del servicio de barrido en Riberalta	%	41.0	2012	P	41.00	41.00	48.00	55.00	57.00
					P(a)	41.00	41.00	48.00	57.00	57.00
					A	41.00	41.00	48.00	41.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details											
Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias											
Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Cobertura del servicio de barrido en Potosi	%	55.0	2012	P	61.00	61.00	65.00	70.00	75.00	75.00
					P(a)	61.00	61.00	65.00	65.00	75.00	75.00
					A	61.00	55.00	65.00	55.00		
Details											
Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias											
Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.2	Cobertura del servicio de barrido en El ALto	%	70.0	2012	P	70.00	70.00	73.00	76.00	80.00	80.00
					P(a)	70.00	70.00	73.00	73.00	80.00	80.00
					A	70.00	70.00	73.00	73.00		
Details											
Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias											
Observations: La cobertura del subservicio de barrido se refiere a la limpieza manual o mecanizada de las vias con algun tipo de cobertura regular (asfalto, pavimento rigido, enlosetado, otros)											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 3: Disposición de RSU en relleno sanitario aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitario en Riberalta	Ton/día	0.0	2012	P	0.00	0.00	46.26	46.26	47.88	47.88
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00
					A		0.00	0.00	0.00		
Details											

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.2	Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitario en Potosí	Ton/día	2012	P	0.00	0.00	105.60	105.60	107.20	107.20
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00
				A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: La línea de base corresponde a los estudios de preinversión* realizados durante la preparación de la operación para las ciudades de Riberalta y Potosí, las cuales constituyen la zona de intervención. Posteriormente se definirá una 3era ciudad, la cual (un

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.3	Hogares cuyos Residuos Sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios en Riberalta	Households (#)	2012	P	0.00	0.00	0.00	18,931.00	19,483.00	19,483.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.00	19,483.00
				A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Reportes de las EMAs

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.4	Hogares con Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios en Potosí	Households (#)	2012	P	0.00	0.00	0.00	26,361.00	26,669.00	26,669.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,389.00	35,389.00
				A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.2	Residuos Sólidos dispuestos en relleno sanitarios en El Alto	Ton/día	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	420.00	561.00	561.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.5	Hogares con Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios en El Alto	Households (#)	2012	P	0.00	0.00	0.00	222,916.00	234,462.00	234,462.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	191,159.00	191,159.00
				A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Reportes EMA

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Aprovechamiento de Residuos Sólidos aumentada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.1	Residuos Sólidos para aprovechamiento en Riberalta	Ton/día	2012	P	0.00	0.00	0.00	3.80	4.70	4.70
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
				A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.2	Residuos Sólidos para aprovechamiento en Potosí	Ton/día	2012	P	0.00	0.00	0.00	6.00	12.30	12.30
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00
				A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.2	Residuos Sólidos para aprovechamiento en El Alto	Ton/día	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45	54.45
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Registros de promedios anuales de básculas en rellenos sanitarios del proyecto

Observations: Se entiende por aprovechamiento a las actividades de separación y clasificación de RS urbanos y actividades de compostaje

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 5: Eficiencia comercial aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Ingresos percibidos por servicios/ Costos operativos en Riberalta	%	48.0	2012	P	48.00	48.00	48.00	49.00	50.00	50.00
					P(a)	48.00	48.00	48.00	48.00	49.00	49.00
					A	48.00	48.00	48.00	48.00		

Details

Means of verification: Registros contables de EMAS beneficiarias

Observations: El porcentaje de incremento estimado esta en funcion únicamente a los costos operativos en los servicios prestados el año de linea base.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.2	Ingresos percibidos por servicios/ Costos operativos en Potosí	%	55.0	2012	P	55.00	55.00	55.00	56.00	57.00	57.00
					P(a)	55.00	56.00	56.00	56.00	57.00	57.00
					A	56.00	56.00	56.00	56.00		

Details

Means of verification: Registros de EMAS beneficiarias

Observations: El porcentaje de incremento estimado esta en funcion únicamente a los costos operativos en los servicios prestados el año de linea base.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year							
5.2	Ingresos percibidos por servicios/ Costos operativos en El Alto	%	23.67	2012	P	35.00	35.00	35.00	36.00	37.00	37.00
					P(a)	35.00	14.50	14.50	14.50	22.00	22.00
					A	14.50	14.50	14.50	14.50		

Details

Means of verification: Registros contables de EMA beneficiarias

Observations: El porcentaje de incremento estimado esta en funcion únicamente a los costos operativos en los servicios prestados el año de linea base.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 6: Inclusión/Formalización de segregadores

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.1	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en Riberalta	Segregadores	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	11.00
					P(a)	0.00	0.00	34.00	0.00	21.00	21.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes Semestrales aprobados por la DGGIRS

Observations: Se estima que el 60% de los segregadores capacitados continuará desempeñándose laboralmente en alguna de las alternativas de inclusión propuestas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.2	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en Potosí	Segregadores	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	0.00	11.00	0.00	9.00	9.00
					A		0.00	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Informes Semestrales aprobados por la DGGIRS

Observations: Se estima que el 60% de los segregadores capacitados continuará desempeñándose laboralmente en alguna de las alternativas de inclusión propuestas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.2	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en El Alto	Segregadores	0.0	2012	P	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00	24.00
					P(a)	0.00	0.00	44.00	0.00	27.00	27.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

6.2	Segregadores ocupados en actividades contempladas en el plan de inclusión / formalización en El Alto	Segregadores	0.0	2012	A		0.00	0.00	0.00		
Details											
Means of verification: Informes Semestrales aprobados por la DGGIRS											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	Botaderos actualmente en operación cerrados	Numero de Botaderos	P	2	2	1,200,000	2,300,000
			P(a)	0	2	0	785,077.09
			A	0	0	0	0
1.2	Rellenos sanitarios construidos	Relleno sanitario	P	1	3	2,450,000	7,563,099
			P(a)	1	3	2,000,000	11,472,972.59
			A	0	0	244,796.67	948,883.38
1.3	Lote de maquinaria pesada para la operación de rellenos sanitarios adquiridos	Lote de maquinaria	P		2		2,500,000
			P(a)	0	2	525,709.68	1,123,432.16
			A	0	0	0	0
1.4	Lotes de vehículos para recolección y barrido adquiridos	Lote de vehículos	P		1		300,000
			P(a)	0	1	94,628.7	157,714.5
			A	0	0	0	0
1.5	Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos construidas	Estaciones	P	1	3	910,000	3,610,000
			P(a)	1	3	418,409.84	1,627,637.84
			A	0	0	34,728.6	134,615.37
1.6	Estudios y diseños elaborados	Estudios	P		9		404,566
			P(a)	3	11	100,000	571,868.82
			A	0	3	17,321.22	160,007.84

Component Nbr. 2 Componente II: Aprovechamiento de RSU e Inclusión y formalización de segregadores

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos equipadas	Plantas	P	1	3	390,000	1,130,823
			P(a)	1	3	100,000	1,705,805.8
			A	0	0	0	0
2.2	Segregadores capacitados	Personas	P	67	67	25,000	60,000
			P(a)	0	70	30,000	142,123.36
			A	0	0	12,869.41	12,869.41
2.3	Planes de inclusión y formalización de segregadores implementados	Planes	P		3	50,000	150,000
			P(a)	0	3	20,000	131,837.84
			A	0	0	10,463.55	36,932.13

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Desarrollo de Instrumentos para la sostenibilidad de los servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	Estudios de Fortalecimiento Institucional elaborados	Estudios	P		3		110,000
			P(a)	0	3	100,000	272,946.78
			A	1	4	15,722.89	82,589.81
3.2	Sistema de Planificación, Seguimiento e Información Sectorial de Residuos Sólidos desarrollado	Sistema	P	1	1		110,000
			P(a)	1	1	60,000	117,015.81
			A	0	0	22,459.11	23,916.84
3.3	Sistema de Planificación, Gestión e Información Gerencial de Gestión Integral de Residuos Sólidos para entidades municipales desarrollado	Sistema	P	1	1		123,000
			P(a)	1	1	20,000	167,247.67
			A	0	0	0	0
3.4	Estudios de generación y caracterización de Residuos Sólidos elaborados	Estudios	P		3		130,126
			P(a)	0	3	0	190,212.53
			A	0	3	0	133,428.24
3.5	Plan de Comunicación y Concientización Ciudadana sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado	Plan	P		1	45,000	80,000
			P(a)	1	3	25,143.74	131,418.96
			A	0	2	17,254.49	56,905.7
3.6	Plan de operación y mantenimiento del PGIRSU Riberalta implementado	Plan	P		1	42,000	219,000
			P(a)	0	1	0	193,302.25
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración y Gestión	P			267,519	1,209,386
		P(a)			248,250	1,209,386
		A			116,480.27	486,230.39

Total Cost

	Total Cost	P			5,379,519	20,000,000
		P(a)			3,742,141.96	20,000,000
		A			492,096.21	2,076,379.11

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
