

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CO-L1125	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	09/29/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/29/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	<b>Loan Number</b>	3104/OC-CO
<b>Executing Agency</b>	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deDesastres	<b>Sector/Subsector</b>	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
<b>Team Leader</b>	LOPEZ GHIO,RAMIRO ANDRES	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COLOMBIA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	10,094,498.96	14.42%	59,905,501.04
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	10,094,498.96	14.42%	59,905,501.04

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

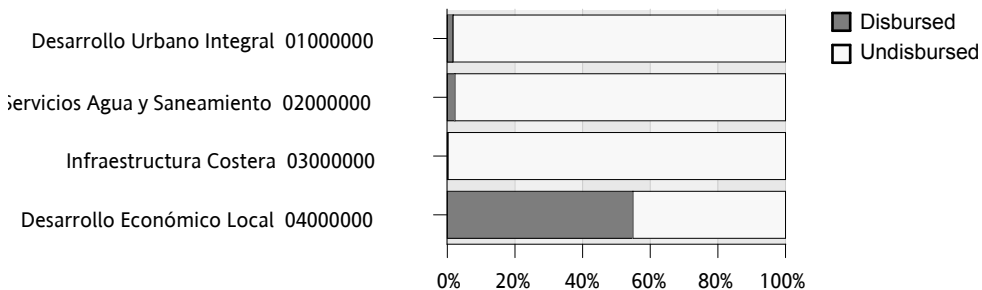

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.9	2013	P		75.00
					P(a)		75.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.6	2011	P						30.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de calidad de vida del DANE

**Observations:** El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P						93.10
					P(a)		0.00	0.00	0.00	93.10	93.10
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.0	2013	P						57.80
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.85	59.85
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Micro y pequeñas empresas desarrolladas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.7	2012	P						47.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00	47.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

#### Details

**Means of verification:** Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 4:** Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	Households (#)	800.0	2013	P	1,000.00	1,500.00	2,000.00		2,500.00
					P(a)	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00
					A	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.0	2013	P	7.00	10.00	11.00		12.00
					P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
					A	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 5:** Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2020
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P					59.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.00
					A	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	2	6	1,936,000	12,600,000
			P(a)	0	6	7,504,492	16,600,700
			A	0	0	111,004	383,507
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P	1	3	25,000	200,000
			P(a)	3	3	57,245	200,000
			A	0	0	0	0
1.3	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P	0	0.9	0	6,753,000
			P(a)	0	0.9	0	3,075,100
			A	0	0	0	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	1	1	1,036,000	2,457,000
			P(a)	0	1	0	2,402,000
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	1	1	1,392,000	2,490,000
			P(a)	0	1	0	2,222,200
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	0	25	4,259,000	6,335,000
			P(a)	0	25	6,648,000	6,648,000
			A	0	0	339	339
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P	7	25	2,263,000	7,919,000
			P(a)	0	25	4,079,348	8,310,000
			A	0	0	0	0
2.3	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Solución de Saneamiento	P	150	350	1,774,000	3,696,000
			P(a)	0	350	0	3,878,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	0	1	0	4,387,000
			P(a)	0.5	1	1,222,997	3,502,000
			A	0.5	1	181,625	897,410
2.5	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	0	1	0	1,663,000
			P(a)	0	1	1,450,454	1,662,000
			A	0	0	0	67,821

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	0	3	0	4,800,000
			P(a)	3	3	614,048	846,900
			A	0	0	364,063	390,802
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	0.5	1.1	1,829,000	3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	7,153,100
			A	0	0	0	0
3.3	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P	1	4	154,000	500,000
			P(a)	0	4	0	500,000
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P	1	1	129,000	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
3.5	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P	1	3	77,000	200,000
			P(a)	3	3	85,867	200,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P	0	90	0	240,000
			P(a)	60	90	0	0
			A	60	60	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Micro / small / medium enterprises (#)	P	30	95	1,260,000	4,760,000
			P(a)	30	95	544,977	5,000,000
			A	0	30	7,661	2,757,711

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
5.1	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Predios	P	0	18,315	0	750,000
			P(a)	0	18,315	0	750,000
			A	0	0	0	0
5.2	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P	0	30	0	210,000
			P(a)	0	30	0	210,000
			A	0	0	0	0
5.3	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P	0	1	0	340,000
			P(a)	0	2	0	270,000
			A	0	1	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P	0	30	0	600,000
			P(a)	30	30	60,090	700,000
			A	20	20	0	137,708
5.5	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
5.6	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	270,000
			A	0	0.5	0	0

## Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P			900,000	4,500,000
		P(a)			1,020,950	3,500,000
		A			108,967	917,204
	Auditoria	P			100,000	500,000
		P(a)			227,155	1,500,000
		A			0	39,548

## Total Cost

	Total Cost	P			17,134,000	70,000,000
		P(a)			23,515,623	70,000,000
		A			773,659	5,740,676



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
