



Operation Number: **EC-L1081**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/29/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/29/2016**
Division Chief validation date: **03/30/2016**
Country Representative validation date: **03/30/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Rural Sanitationand Water Infrastructure Program	Loan Number:	2377/OC-EC,2377/OC-EC-1,2377/OC-EC-2
Executing Agency (EA):	BANCO DEL ESTADO ,BANCO DEL ESTADO ,MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
Team Leader:	Basani,Marcello	Sector/Subsector:	AS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR ,REPUBLICA DE ECUADOR ,REPUBLICA DE ECUADOR Convergence related Operation(s): EC-X1006		

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
Aggregate d	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$10,600,000.00	\$0.00	\$60,600,000.00
EC-L1081	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$10,600,000.00	\$0.00	\$40,600,000.00
EC-X1006	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
Aggregated	\$50000000.00	36352001.78	72.70%	\$13647998.22
EC-L1081	\$30,000,000.00	\$22,204,723.39	74.02%	\$7,795,276.61
EC-X1006	\$20,000,000.00	\$14,147,278.39	\$0.71	\$5,852,721.61


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

	Main Operation	Oper. EC-X1006
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO	NO
Date of approval:		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

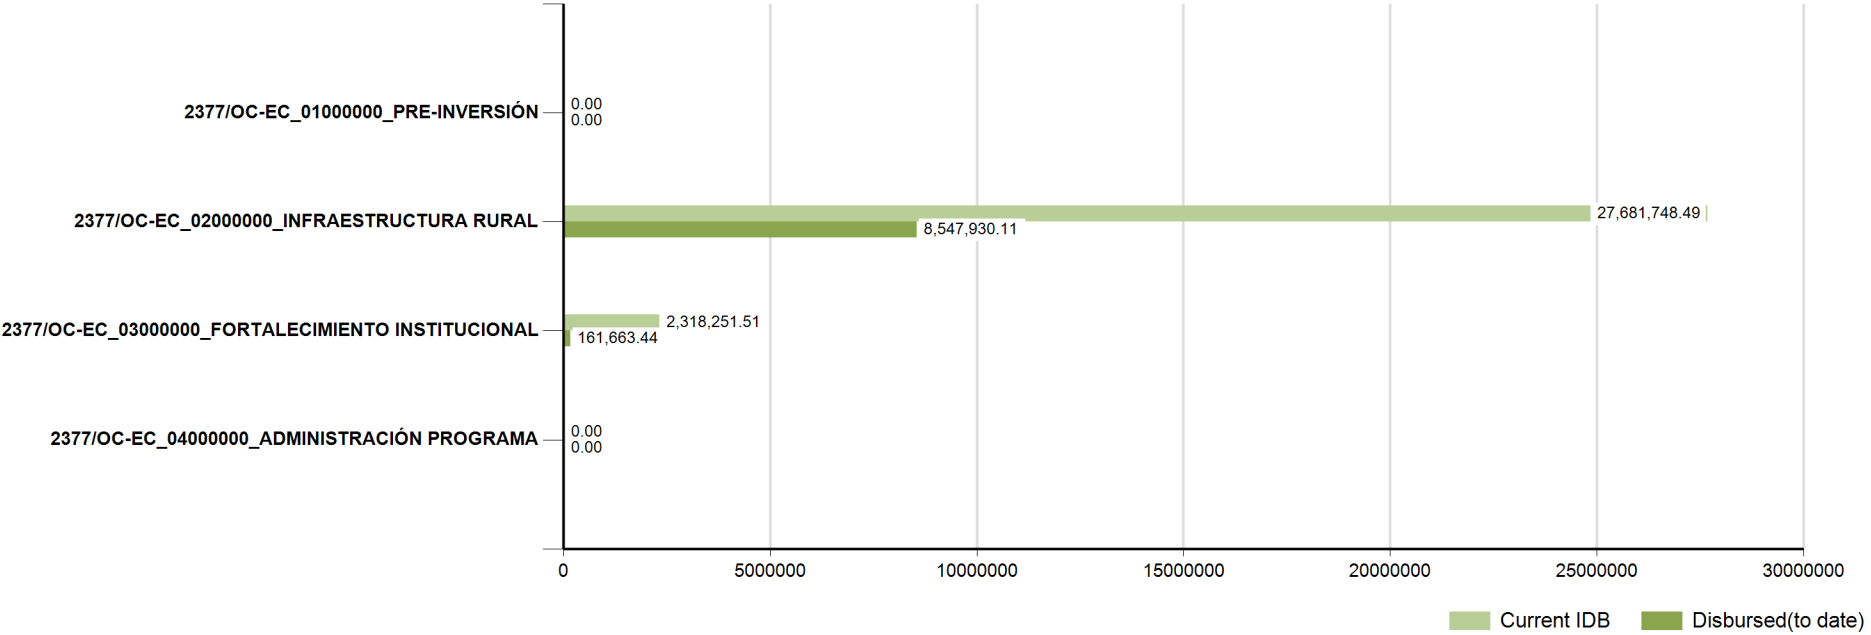

Results Matrix

Impacts



Impact:	1 Incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y soluciones de saneamiento en localidades de hasta 20.000 habitantes de las zonas rurales del Ecuador (con enfoque en comunidades pobres);												
Observation:	No se pueden reportar resultados por cuando el programa se aprobó el 8/sep/2010												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.		Miles de Habitantes	1,442.00	2010	Informes Semestrales de Progreso y Evaluación Final de la Operación	El avance del indicador se reportará con la información suministrada por el Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso, la misma que será verificada con las Evaluaciones intermedias y finales.	P	1,485.00	1,555.00	1,598.00	1,642.00		1,642.00
							P(a)	1,485.00	1,555.00	1,480.00	1,500.00	1,489.00	1,495.00
							A	1,443.00	1,461.00	1,483.00	1,483.00		
1.2 Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas		Miles de Habitantes	832.00	2010	Informes Semestrales de Progreso y Evaluación Final de la Operación	El avance del indicador se reportará con la información suministrada por el Ejecutor en el Informe Semestral de Progreso, la misma que será verificada con las Evaluaciones intermedias y finales.	P	875.00	945.00	988.00	1,032.00		1,032.00
							P(a)	875.00	945.00	873.00	51,230.00	926.90	939.50
							A	833.71	847.00	29,531.00	897.40		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Prestadores de servicios fortalecidos en la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Observation:	Se consideran Prestadores de Servicios: Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado-JAAPs, Comités, Prestadores comunitarios, y otros tipos de prestadores

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas		Sistemas	0.00	2010	Plan Tarifario aprobado por las comunidades e implementado	Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCO M. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.	P	6.00	16.00	16.00	20.00		57.00
	P(a)						6.00	16.00	14.00	20.00	31.00	22.00	59.00
	A						5.00	8.00	9.00	6.00			
1.2 Sistemas de agua y saneamiento (Ind. Sectorial) con mujeres en puestos de administración		Sistemas	0.00	2010	Acta de conformación de las juntas o prestadores.		P	4.00	7.00	4.00	5.00		20.00
	P(a)						4.00	7.00	8.00	20.00	31.00	22.00	59.00
	A						0.00	0.00	20.00	6.00			
Outcome:	2 Cobertura de servicios de agua potable y saneamiento incrementada												
Observation:	Para los dos indicadores claves ("flagged"), el ejecutor informó el BID que los valores reportados en años anteriores no reflejan los logros verdaderos del programa (que, de hecho, han sido sobre-estimados en la gran mayoría de los casos). Se aprovechara de la evaluación de medio-término a implementarse en el año 2015 para ratificar dichos valores y para determinar si efectivamente la estimación inicial de las metas del programa de estos indicadores clave debe ser revisada oficialmente.												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
2.1 Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	 RF	Hogares	288,400.00	2010	Registro de clientes de los operadores	Un hogar equivale a una conexión. Y un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.	P	8,421.00	14,035.00	15,421.00	10,339.00			336,616.00
							P(a)	8,421.00	14,035.00	3,845.00	9,328.00	6,760.00	1,259.00	17,988.00
	A						205.00	3,592.00	6,172.00	0.00				
2.2 Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	 RF	Hogares	166,400.00	2010	Registro de clientes de los operadores , Registros de los libros de obra	Un hogar equivale a una conexión. Un hogar esta en promedio constituido por 5 personas.	P	8,421.00	14,035.00	15,421.00	10,202.00			214,479.00
							P(a)	8,421.00	14,035.00	5,122.00	14,019.00	6,480.00	4,045.00	24,343.00
	A						342.00	2,731.00	6,555.00	4,190.00				
2.3 Sistemas de agua potable y saneamiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas		Sstemas	0.00	2010	Plan de Operación y mantenimiento implementados	Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestion serán definida s por cada comunidad durante la fase de DESCO M. En este contexto , el Ejecutor hara un seguimiento particular respecto a este aspecto.	P	6.00	26.00	13.00	13.00			57.00
							P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	16.00	17.00	59.00
	A						5.00	8.00	10.00	0.00				

2.4 Sistemas funcionando según especificaciones de diseño		Sistemas	0.00	2010	Informes de Fiscalización, Actas de entrega recepción.	Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCO M. En este contexto, el Ejecutor hará un seguimiento particular respecto a este aspecto.	P	6.00	26.00	13.00	13.00			57.00
							P(a)	6.00	26.00	14.00	20.00	16.00	17.00	59.00
							A	5.00	8.00	10.00	5.00			
2.5 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas		Hogares	166,400.00	2010	Registro de clientes de los operadores, Registros de los libros de obra	Un hogar equivale a una conexión. Un hogar está en promedio constituido por 5 personas.	P	8,421.00	0.00	15,421.00	10,202.00			214,479.00
							P(a)	8,421.00	0.00	5,122.00	6,305.00	5,534.00	3,927.00	23,573.00
							A	342.00	2,731.00	6,906.00	4,133.00			
Outcome:	3 Comunidades rurales y/o pequeñas ciudades fortalecidas en el buen uso de los servicios de agua potable y saneamiento													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations								
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
3.1 Comunidades rurales intervenidas		Comunidades	0.00	2010	Registro de comunidades intervenidas (MIDUVI/BdE)	Las comunidades objeto del programa son aquellas localidades rurales de hasta 20.000 habitantes. Los sistemas pueden atender a una o varias comunidades. Las condiciones de gestión serán definidas por cada comunidad durante la fase de DESCO M. En este conte	P	22.00	74.00	79.00	48.00			210.00
	P(a)						22.00	74.00	80.00	120.00	84.00	19.00	224.00	
	A						9.00	36.00	0.00	76.00				
3.2 Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas		Mujeres	0.00	2010	Registros de las capacitaciones / MIDUVI		P	4,210.00	6,877.00	4,294.00	4,303.00			19,600.00
	P(a)						4,210.00	6,877.00	6,210.00	4,322.00	32,578.00	7,790.00	55,933.00	
	A						4,126.00	2,942.00	0.00	8,497.00				
3.3 Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas		Habitantes	0.00	2011	Registros del MIDUVI/ Desarrollo comunitario		P	8,421.00	14,035.00	8,421.00	9,123.00			40,000.00
	P(a)						8,421.00	14,035.00	10,489.00	14,675.00	74,539.00	14,266.00	121,043.00	
	A						8,421.00	4,415.00	0.00	19,402.00				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Pre-inversión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Estudios elaborados	Estudios	P		57.00	P	1,200,000.00	4,700,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente 2.- Infraestructura Rural de Agua y Saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Sistemas de agua potable operando	Sistemas	P	7.00	29.00	P	3,303,368.00	15,322,165.00
		P(a)	3.00	27.00	P(a)	3,810,507.48	15,722,926.22
		A	0.00	12.00	A	1,539,366.35	4,571,339.06
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) construidas	UBS	P	750.00	3,000.00	P	579,382.00	4,684,623.00
		P(a)	4,210.00	1,925.00	P(a)	1,275,860.81	5,759,698.33
		A	57.00	861.00	A	1,184,285.02	3,365,366.45
Sistemas de saneamiento	Sistemas	P	6.00	28.00	P	6,606,736.00	30,643,644.00
		P(a)	10.00	40.00	P(a)	9,066,836.77	31,467,700.99
		A	5.00	22.00	A	6,162,480.90	16,084,172.26
Componente 3.- Fortalecimiento Institucional y Comunitario		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Prestadores	P	13.00	57.00	P	271,405.00	1,249,826.00
		P(a)	18.00	424.00	P(a)	1,230,096.03	924,295.07
		A	66.00	97.00	A	116,851.60	233,851.60
Guía de Desarrollo Comunitario y/o instrumentos similares que contribuyan a la gestión comunitaria aprobado por el MIDUVI	Guía	P	0.00	1.00	P		0.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Personas	P	12,371.00	40,000.00	P	271,405.00	1,250,826.00
		P(a)	23,172.00	127,742.00	P(a)	681,340.16	2,841,748.93
		A	19,402.00	25,741.00	A	337,565.93	444,805.93
Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Funcionarios	P	0.00	100.00	P	100,000.00	300,000.00
		P(a)	62.00	147.00	P(a)	0.00	1,355,756.41
		A	0.00	37.00	A	0.00	102,250.00
Administración del programa							

Other Cost		2015	Cost
Administración del Programa	P	\$556,732.00	\$2,450,464.00
	P(a)	\$156,040.00	\$2,527,874.05
	A	\$198,247.10	\$659,192.56
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$12,889,028.00	\$60,601,548.00
	P(a)	\$16,220,681.25	\$60,600,000.00
	A	\$9,538,796.90	\$25,460,977.86

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Impact	Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas	Modify Means of Verification	Se incluye en este ciclo del PMR los medios de verificación de los impactos, debido a que por omisión desde el inicio de la operación se ha incluyó en el sistema la información respectiva, la misma que es: Informes Semestrales de Progreso y Evaluación Final de la Operación	3/29/2016	3/29/2016
Impact	Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.	Modify Means of Verification	Se incluye en este ciclo del PMR los medios de verificación de los impactos, debido a que por omisión desde el inicio de la operación se ha incluyó en el sistema la información respectiva, la misma que es: Informes Semestrales de Progreso y Evaluación Final de la Operación	3/29/2016	3/29/2016
Outcome	Sistemas funcionando según especificaciones de diseño	Modify EOP P(a)	El total de sistemas que deben ser construidos conforme a la planificación original en el marco del programa son 57 (29 de agua potable y 28 de saneamiento). No obstante, la SENAGUA en el indicador de resultado sistemas funcionando según especificaciones de diseño en los años anteriores 2012, 2013, 2014 no entrego información real, por lo cual la cifra correcta se registra desde el año 2015, 2016 y 2017 dando un total de 59 sistemas.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Sistemas de agua potable y sanemiento que disponen de un plan de operación y mantenimiento en ejecución al terminadas las obras en las zonas intervenidas	Modify EOP P(a)	El total de sistemas que deben ser construidos conforme a la planificación original en el marco del programa son 57 (29 de agua potable y 28 de saneamiento). No obstante, la SENAGUA en el indicador de resultado sistemas funcionando según especificaciones de diseño en los años anteriores 2012, 2013, 2014 no entrego información real, por lo cual la cifra correcta se registra desde el año 2015, 2016 y 2017 dando un total de 59 sistemas.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Sistemas de agua potable y saneamiento donde los ingresos por tarifa cubren los costos de operación en las zonas intervenidas	Modify EOP P(a)	El total de sistemas que deben ser construidos conforme a la planificación original en el marco del programa son 57 (29 de agua potable y 28 de saneamiento). No obstante, la SENAGUA en el indicador de resultado sistemas funcionando según especificaciones de diseño en los años anteriores 2012, 2013, 2014 no entrego información real, por lo cual la cifra correcta se registra desde el año 2015, 2016 y 2017 dando un total de 59 sistemas.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Modify EOP P(a)	A partir del año 2014 se ha tratado de analizar y regularizar la información reportada en los años pasados así como las proyecciones para los años futuros. Durante está revisión y con los insumos de la evaluación de medio término se pudo comprobar que varios de los valores reportados en los años pasados no reflejaban los verdaderos logros del programa, ni la trayectoria a las metas finales. Durante el ciclo de PMR del 2016 se ha hecho un primer análisis para corregir las proyecciones futuras. Durante el transcurso del año se trabajará para corregir los valores reportados en años pasados, lo que determinará las metas finales del programa.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Mujeres beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas	Modify EOP P(a)	A partir del año 2014 se ha tratado de analizar y regularizar la información reportada en los años pasados así como las proyecciones para los años futuros. Durante está revisión y con los insumos de la evaluación de medio término se pudo comprobar que varios de los valores reportados en los años pasados no reflejaban los verdaderos logros del programa, ni la trayectoria a las metas finales. Durante el ciclo de PMR del 2016 se ha hecho un primer análisis para corregir las proyecciones futuras. Durante el transcurso del año se trabajará para corregir los valores reportados en años pasados, lo que determinará las metas finales del programa.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Comunidades rurales intervenidas	Modify EOP P(a)	A partir del año 2014 se ha tratado de analizar y regularizar la información reportada en los años pasados así como las proyecciones para los años futuros. Durante está revisión y con los insumos de la evaluación de medio término se pudo comprobar que varios de los valores reportados en los años pasados no reflejaban los verdaderos logros del programa, ni la trayectoria a las metas finales. Durante el ciclo de PMR del 2016 se ha hecho un primer análisis para corregir las proyecciones futuras. Durante el transcurso del año se trabajará para corregir los valores reportados en años pasados, lo que determinará las metas finales del programa.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas	Modify EOP P(a)	A partir del año 2014 se ha tratado de analizar y regularizar la información reportada en los años pasados así como las proyecciones para los años futuros. Durante está revisión y con los insumos de la evaluación de medio término se pudo comprobar que varios de los valores reportados en los años pasados no reflejaban los verdaderos logros del programa, ni la trayectoria a las metas finales. Durante el ciclo de PMR del 2016 se ha hecho un primer análisis para corregir las proyecciones futuras. Durante el transcurso del año se trabajará para corregir los valores reportados en años pasados, lo que determinará las metas finales del programa.	3/14/2016	3/14/2016
Outcome	Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas	Modify EOP P(a)	A partir del año 2014 se ha tratado de analizar y regularizar la información reportada en los años pasados así como las proyecciones para los años futuros. Durante está revisión y con los insumos de la evaluación de medio término se pudo comprobar que varios de los valores reportados en los años pasados no reflejaban los verdaderos logros del programa, ni la trayectoria a las metas finales. Durante el ciclo de PMR del 2016 se ha hecho un primer análisis para corregir las proyecciones futuras. Durante el transcurso del año se trabajará para corregir los valores reportados en años pasados, lo que determinará las metas finales del programa.	3/14/2016	3/14/2016

Outcome	Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos o mejorados	Modify EOP P(a)	A partir del año 2014 se ha tratado de analizar y regularizar la información reportada en los años pasados así como las proyecciones para los años futuros. Durante esta revisión y con los insumos de la evaluación de medio término se pudo comprobar que varios de los valores reportados en los años pasados no reflejaban los verdaderos logros del programa, ni la trayectoria a las metas finales. Durante el ciclo de PMR del 2016 se ha hecho un primer análisis para corregir las proyecciones futuras. Durante el transcurso del año se trabajará para corregir los valores reportados en años pasados, lo que determinará las metas finales del programa.	3/14/2016	3/14/2016
Impact	Población adicional con acceso a saneamiento en las zonas intervenidas	Modify Unit of Measure	Durante el ciclo del PMR de 2016 se corrigió la unidad de medida del indicador de impacto, el mismo que fue registrado desde el inicio del programa erróneamente. La unidad de medida corresponde a miles de habitantes conforme a los documentos originales del programa. Cabe mencionar que el error de unidad de medida causó un ingreso erróneo en el año 2014, donde se reportaron el número de habitantes beneficiados y no los miles de habitantes beneficiados.	3/14/2016	3/14/2016
Impact	Población adicional con acceso a agua en las zonas intervenidas.	Modify EOP P(a)	De acuerdo a la Evaluación Intermedia del Programa realizada en el año 2015, se concluye que existe una diferencia significativa entre las metas inicialmente propuestas en la matriz de resultados del programa original (210 sistemas de agua potable y saneamiento) y los logros que se realizaron en productos y resultados. Actualmente, la totalidad de sistemas de agua potable operando al final del proyecto son 29 sistemas. En consecuencia, el impacto previsto originalmente en el programa no será alcanzado (200.000 personas con acceso a agua en zonas intervenidas de acuerdo al PMR). Cabe mencionar que los valores reportados en años pasados no tiene una correlación con los sistemas de agua operando efectivamente construidos y operando (esta información será ajustada en el transcurso de este año). Con estos antecedentes y considerando que estos indicadores no capturan el verdadero impacto de la operación, en la Evaluación final del proyecto se recomienda enfocarse en los indicadores de resultados del programa. Las cifras ingresadas hasta el 2015 corresponden al acumulado alcanzado conforme la información ya registrada en el PMR, y las proyecciones para los años 2016 y 2017 corresponden al ejercicio de cálculo de la diferencia entre la población beneficiada con el proyecto y la población servida sin el proyecto de los sistemas que se van a entrar en operación durante el 2016 y 2017.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Modify Physical P(a) value	Aunque no se cumplió con la meta programada de 62 funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en gestión de regulación y control en la prestación de servicios, la reprogramación para los años 2016 y 2017 alcanzará una meta superior a la originalmente planteada para responder a las necesidades reales de fortalecimiento.	3/8/2016	3/8/2016
Output	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Modify Physical P(a) value	Aunque no se cumplió con la meta programada de 23172 miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas, las metas reprogramadas para el año 2016 y 2017 aumentan sustancialmente la meta planificada original en 3 veces, para asegurar que todos los miembros de comunidades beneficiadas reciban la educación ambiental y sanitaria oportuna.	3/8/2016	3/8/2016
Output	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Modify Physical P(a) value	Con respecto a la meta de organizaciones comunitarias para la prestación de servicios de agua y saneamiento capacitados se superó la meta planificada de 18 a 66, debido al cambio de priorización de canasta de proyectos enfocadas en las zonas 1 y 3 que fue aprobada por los organismos prestarios en julio de 2015. Este aumento complementado por los aumentos de metas programadas para el 2016 y 2017 en este producto provoca un aumento en 8 veces la meta original planificada. Este cambio de meta refleja la necesidad de asegurar que las organizaciones comunitarias relevantes reciban la capacitación oportuna.	3/8/2016	3/8/2016
Output	Funcionarios de la SENAGUA fortalecidos en la gestión de regulación y control en la prestación de servicios.	Modify Financial P(a) value	Aunque no se cumplió con la meta física y financiera programada para el 2015 de este producto, cabe mencionar que la elaboración de un Plan de Fortalecimiento para la SENAGUA identificó actividades adicionales que requirieron la reprogramación financiera para los años futuros, con este cambio el presupuesto asignado a este producto tuvo un aumento sustancial a USD 1.300.000,00 conforme a la nueva distribución de recursos del programa aprobada en el primer semestre de 2015.	3/8/2016	3/8/2016
Output	Miembros de comunidades rurales beneficiados con educación sanitaria y ambiental y uso racional del agua	Modify Financial P(a) value	Aunque se cumplió con el 50% de meta financiera programada para el 2015, la necesidad de capacitar a un número más alto de miembros de comunidades rurales beneficiadas con educación sanitaria, ambiental y uso racional del agua en las zonas intervenidas, se requirió una reprogramación financiera en los años 2016 y 2017, lo que resulta en un aumento sustancial del monto asignado a este producto.	3/8/2016	3/8/2016
Output	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas/equipadas (Ind. Sectorial)	Modify Financial P(a) value	Aunque la meta física aumenta sustancialmente en este producto, la meta financiera total disminuye en un 30% debido a una posible estimación inicial errónea del monto de capacitación por organización comunitaria. Esta conclusión será confirmada durante el ajuste de los valores reportados en los años anteriores.	3/8/2016	3/8/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
