




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING		
Número da Operação: 2715/OC-BR	Atual: 13.590.000,00	Original BID: 13.590.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 13.590.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: BR-L1043, RG-P1442, BR-T1225, RG-P1478	Saldo: 13.590.000,00	Cofinanciamento/País: 150.000.000,00
Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation		Original Estimado: 163.590.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 02-oct-2012 Validado pelo Representante do País: 15-oct-2012

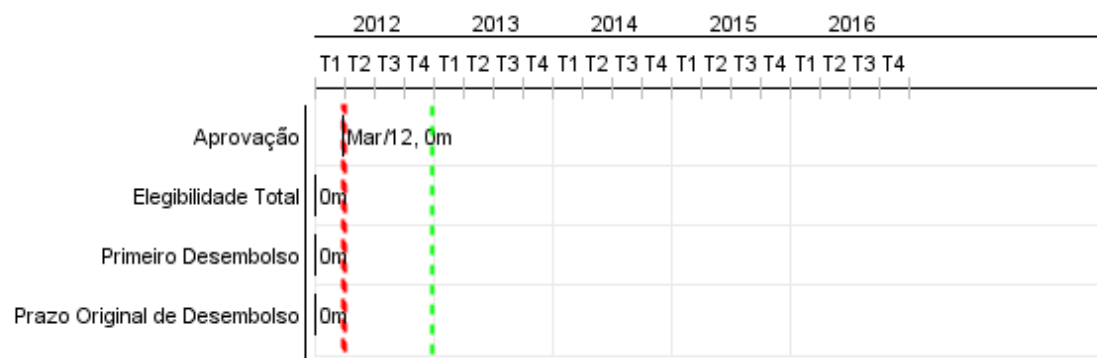

Progresso Acumulado até 2012





Resultados

Resultado: Aumento en el número de empresas ubicadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
25% de aumento en el número de empresas ubicadas en el Centro Histórico	Empresas	60.00	2012	P				75.00		75.00
				A						

Resultado: Aumento en el número de visitantes anuales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
40% de aumento en el número de visitantes anuales a los centros culturales ubicados en el Centro Histórico	Visitantes	35,000.00	2012	P				50,000.00		50,000.00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Proyectos estratégicos									
Parque do Bom Menino reconstruído	Parque				1,00				1.384.117,65
Tramo de la Ave. Magalhaes de Almeida construído	Metros				450,00				290.479,41
Mercado Central restaurado	Mercado				1,00				735.294,00
Drenaje del Canal del Portinho concluída	Metros				3.500,00				3.561.000,00
Edificio para funcionamiento del Cine Teatro Municipal Roxy restaurado	Unidade				1,00				1.874.117,65
Centro de Referencia de Azulejos terminado	Centro				1,00				1.761.258,24
Obras de Reabilitação Urbana Construídas e Funcionando - Praça Deodoro e Pantheon	Obras				2,00				2.980.581,76
Fonte das Pedras	Unidade				1,00				238.811,18
Praça da Alegria	Praça				1,00				229.168,24
Iluminação do Centro Histórico	Unidade				1,00				1.879.288,82
Intervenção na Avenida Beira Mar	Intervenção				1,00				795.830,59
Sede da Oficina Escola	Unidade				1,00				824.800,00
Centro Comércio Popular	Unidade				1,00				625.691,76
Feira da Cidade	Feira				1,00				2.539.048,82
Entrepasto Pesqueiro	Unidade				1,00				1.416.882,94
Escola de Música	Unidade				1,00				412.816,47
Arquivo Público Municipal	Arquivo				1,00				156.697,06
Mejoras habitacionales									
Informe Diagnóstico y Estrategia de Intervención para los inmuebles públicos elaborado	Informe				1,00				945.441,18
Informe Diagnóstico y Estrategia de Intervención para los Inmuebles Privados elaborado	Informe				1,00				945.441,18
Fortalecimiento institucional									
Software de geo-referenciamiento implantado en la SEMMAM	Software				1,00				838.609,41
2.000 procesos de licenciamiento ambiental realizados	Processos				2.000,00				455.882,35
120 funcionarios públicos capacitados	Funcionários				120,00				455.882,35
Gerenciamiento del programa									
Gerenciamento do Programa	N/A								1.833.000,00
TOTAL									27.180.141,06
