



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		
Sector: EDUCATION-VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION		
Número da Operação: 2828/BL-BO	Atual: 40.000.000,00	Original BID: 40.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 40.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1138, BO-T1171, RG-P1478, BO-T1185	Saldo: 40.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 40.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 02-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 10-abr-2013

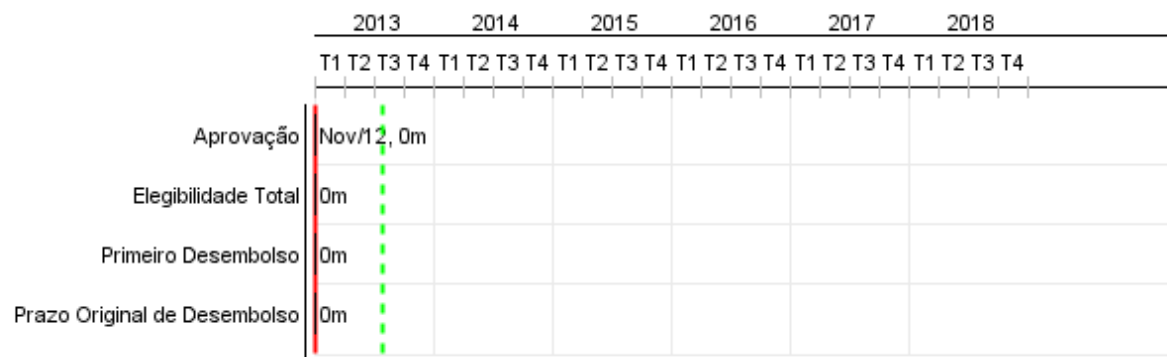

Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	La oferta del BTH implementada
-------------------	--------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Establecimientos en condicion de integrar la nueva oferta del BTH	establecimientos		2013	P A	55,00
Salidas técnicas definidas	salidas técnicas		2013	P A	8,00
Estudiantes inscritos en el BTH en los establecimientos participantes en el programa	Estudiantes		2013	P A	26.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Apoyo a la Gestión comunitaria, institucional y pedagogica de la ESCP									
Diagnosticos participativos de necesidades, potencialidades y vocaciones productivas municipales elaborados.	Diagnosticos				52,00				188.000,00
Maestros de Secundaria reconvertidos en educación técnica y tecnológica	Docentes				1.000,00				212.000,00
Formación Profesional de egresados y titulados de carreras técnicas tecnológicas en el modelo Educativo Socio Comunitario Productivo	Docentes				1.000,00				412.000,00
Construcción y Equipamiento para el BTH									
Estudios de Preinversión de los Centros Tecnológicos Educativos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz	Estudios de Preinversión				3,00				120.000,00
Estudios de Preinversión de los Centros de Formación Integral Técnica Humanística	Estudios de Preinversión				14,00				420.000,00
Centros Tecnológicos Experimentales (CTES) de La Paz (El Alto), Cochabamba y Santa Cruz construidos	CTES				3,00				2.724.223,00
Centros de Formación Integral Técnica Humanística (CEFITHs) construidos	CEFITHs				14,00				11.451.300,00
Centros Tecnológicos Experimentales El Alto, Cochabamba y Santa Cruz equipados	CTEs				3,00				10.787.250,00
Centros de Formación Integral Técnica Humanística equipados	CEFITHs				14,00				7.700.000,00
Núcleos Educativos (Nes) en áreas rurales equipados.	NEs				38,00				3.572.747,00
Gastos Operativos FPS (5%) por la actividad de construcción de los CTE y CEFITH	N/A								746.080,00
Sistema de monitoreo y evaluación del BTH									
Linea de Base realizada	Linea de Base				1,00				100.000,00
Sistema de Información Educativa SIE complementada con información sobre especialidades tecnologicas productivas, comunidades, y otros del BTH	Sistema				1,00				90.000,00
Evaluación de los procesos de formación de maestros	Informe				1,00				100.000,00
Evaluación final de carácter cuantitativo y cualitativo de las estrategias de implementación del BTH	Informe				1,00				120.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1071 - Productive Communitarian Secondary Education
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 01/04/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Evaluación de impacto del Programa	Informe				1,00				100.000,00
Adminitración y Gestión del Programa									
Unidad de Gestión del Programa	N/A								741.600,00
Auditoría	N/A								200.000,00
Gastos Operativos	N/A								214.800,00
TOTAL									40.000.000,00
