




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Número(s) de Préstamo:	2614/BL-BO	Monto Aprobado Actual:	35.000.000,00	BID Original:	35.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	35.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	83,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1145	Saldo:	35.000.000,00	Co-financiamiento/País:	7.270.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	42.270.000,00
				Período de Amortización (meses):	


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-abr-2012 Validado por Representante de País: 27-abr-2012

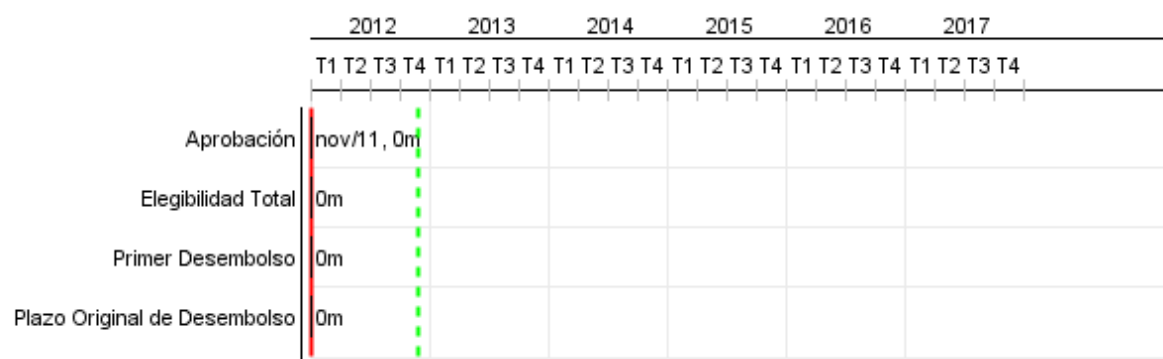

**Progreso Acumulado al 2011**

## Progreso Acumulado

**Financiamiento BID**  
**Calendario del Proyecto**



# INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1067 - Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí  
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 19/04/2012

## Resultados

**Resultado:** Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cobertura de Parto Institucional	numero	20,000.00	2010	P A	35.000,00
Mujeres con complicaciones obstétricas referidas al nivel apropiado	Porcentaje	53.00	2010	P A	80,00
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P A	80,00
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P A	50,00
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P A	200,00
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Numero	100.00	2011	P A	475,00
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P A	5.000,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosí</b>									
Personas del primer nivel capacitadas en promoción de la salud.	Personas				200,00				200.000,00
Materiales para promoción de la Salud preparados y distribuidos, para usar en capacitaciones con personal, y con las comunidades.	paquete				1,00				1.000.000,00
Ambulancias y camionetas adquiridas para sistema de referencia y retorno.	ambulancias				6,00				200.000,00
Centro regulador de urgencias medicas equipado.	Centro				1,00				300.000,00
Protocolos elaborados para sistema de referencia y retorno	protocolos desarrollados				3,00				200.000,00
Personas capacitadas en la aplicación de los protocolos para sistema de referencia y retorno	personas				200,00				350.000,00
Sistema de Comunicación Departamental	1				1,00				500.000,00
Campañas, materiales, y spots radiales realizados en municipios y comunidades de Potosí	actividades				22,00				110.000,00
<b>Inversiones en infraestructura y equipamiento</b>									
Hospital de especialidades en Llalagua construido y equipado.	Hospital				1,00				15.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí refaccionados.	Establecimiento				50,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí ampliados.	Establecimiento				25,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí equipados.	Establecimiento				202,00				2.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí construidos.	Establecimiento				2,00				2.500.000,00
Construcción y equipamiento de hospital de segundo nivel en departamento de Potosí de acuerdo con criterios de selección establecidos	hospital				1,00				3.000.000,00
Otras inversiones a ser definidas en infraestructura y equipamiento	EESS				3,00				2.500.000,00
<b>Administración y Monitoreo</b>									
Desarrollo del sistema de monitoreo para el proyecto.	systema				1,00				1.000.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1067 - Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí  
2011 2º periodo con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 19/04/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Areas clave fortalecidas mediante contratacion de expertos tecnicos.	personas				15,00				640.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>37.500.000,00</b>
