





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2614/BL-BO	Current Approved Amount:	35.000.000,00	Original IDB:	35.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	35.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	83,00
Related Operation(s):	BO-T1145	Balance:	35.000.000,00	Co-Financing/Country:	7.270.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	42.270.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 20-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012

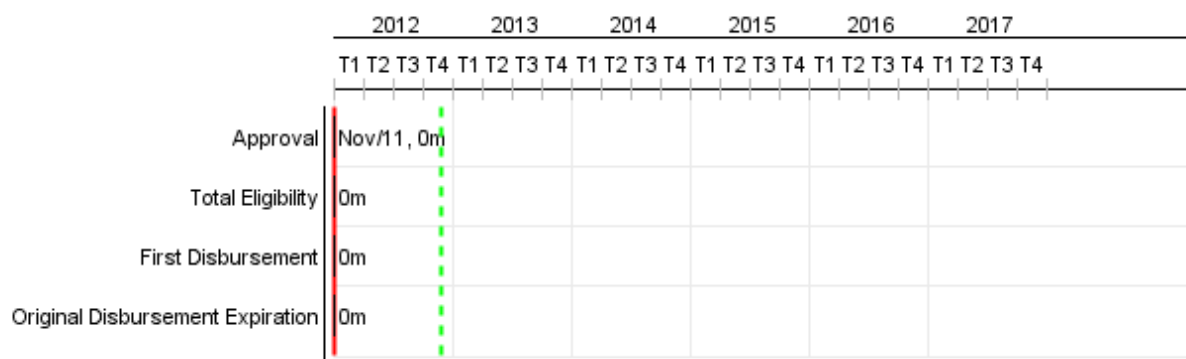

**Accumulated Progress as of 2011**



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosí mejorado
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cobertura de Parto Institucional	numero	20,000.00	2010	P A	35.000,00
Mujeres con complicaciones obstétricas referidas al nivel apropiado	Porcentaje	53.00	2010	P A	80,00
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P A	80,00
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P A	50,00
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P A	200,00
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Numero	100.00	2011	P A	475,00
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P A	5.000,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosí</b>									
Personas del primer nivel capacitadas en promoción de la salud.	Personas				200,00				200.000,00
Materiales para promoción de la Salud preparados y distribuidos, para usar en capacitaciones con personal, y con las comunidades.	paquete				1,00				1.000.000,00
Ambulancias y camionetas adquiridas para sistema de referencia y retorno.	ambulancias				6,00				200.000,00
Centro regulador de urgencias medicas equipado.	Centro				1,00				300.000,00
Protocolos elaborados para sistema de referencia y retorno	protocolos desarrollados				3,00				200.000,00
Personas capacitadas en la aplicación de los protocolos para sistema de referencia y retorno .	personas				200,00				350.000,00
Sistema de Comunicación Departamental	1				1,00				500.000,00
Campañas, materiales, y spots radiales realizados en municipios y comunidades de Potosí	actividades				22,00				110.000,00
<b>Inversiones en infraestructura y equipamiento</b>									
Hospital de especialidades en Llalagua construido y equipado.	Hospital				1,00				15.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí refaccionados.	Establecimiento				50,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí ampliados.	Establecimiento				25,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí equipados.	Establecimiento				202,00				2.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosí construidos.	Establecimiento				2,00				2.500.000,00
Construcción y equipamiento de hospital de segundo nivel en departamento de Potosí de acuerdo con criterios de selección establecidos	hospital				1,00				3.000.000,00
Otras inversiones a ser definidas en infraestructura y equipamiento	EESS				3,00				2.500.000,00
<b>Administración y Monitoreo</b>									
Desarrollo del sistema de monitoreo para el proyecto.	systema				1,00				1.000.000,00

## PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi  
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 19/04/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Areas clave fortalecidas mediante contratacion de expertos tecnicos.	personas				15,00				640.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>37.500.000,00</b>
