
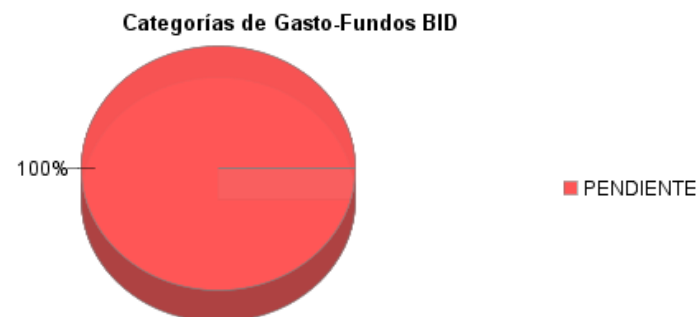
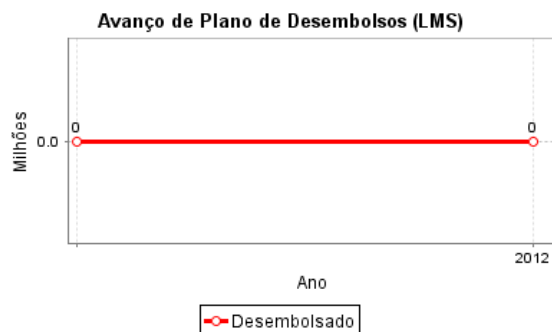



## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Número da Operação:	2614/BL-BO	Atual:	35.000.000,00	Original BID:	35.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	35.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	83,00
Operação Relacionada:	BO-T1145	Saldo:	35.000.000,00	Cofinanciamento/País:	7.270.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	42.270.000,00
				Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 18-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012

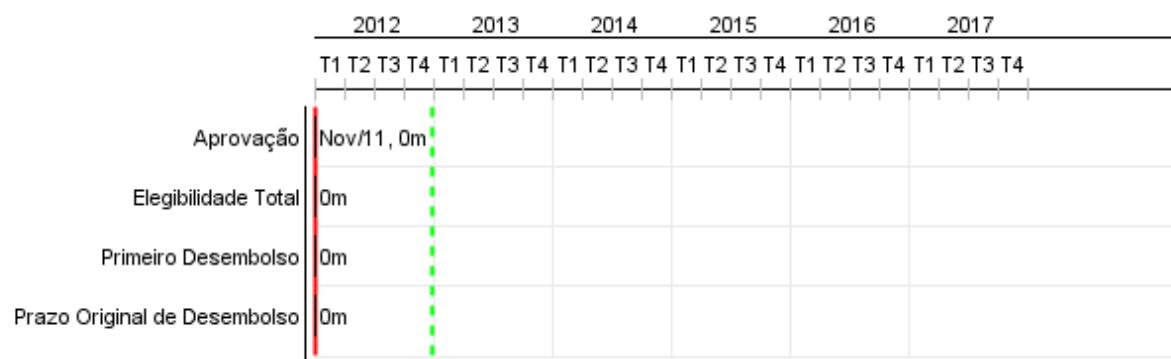

## Progresso Acumulado até 2012



## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO


BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi  
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 14/09/2012

### Progresso Acumulado



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Cobertura de Parto Institucional	numero	20,000.00	2010	P						35,000.00
				A						
Mujeres con complicaciones obstétricas referidas al nivel apropiado	Porcentaje	53.00	2010	P						80.00
				A						
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P						80.00
				A						
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P						50.00
				A						
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P						200.00
				A						
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Numero	100.00	2011	P						475.00
				A						
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P		500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00
				A						

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi</b>									
Personas del primer nivel capacitadas en promoción de la salud.	Personas				200,00				200.000,00
Centro regulador de urgencias medicas equipado.	Centro				1,00				450.000,00
Personas capacitadas en la aplicación de los protocolos para sistema de referencia y retorno .	personas				200,00				500.000,00
Sistema de Comunicación Departamental	Sistema				1,00				500.000,00
Capacitación en mantenimiento de equipo medico e industrial en Potosi	personas				50,00				500.000,00
Capacitación en gestión	Personas				30,00				300.000,00
Incorporacion de Obstetrices en el sistema de salud departamental	Personas				30,00				300.000,00
Apoyo a la Promoción de la Salud	Programa de Promocion				1,00				500.000,00
Ambulancias y camionetas para sistema de referencia y retorno	Unidades				6,00				300.000,00
Estrategia de Gestion Institucional	Estrategia				1,00				200.000,00
Conjunto de Protocolos para sistema de referencia y retorno	conjunto				1,00				200.000,00
Sistema de Gestión de Medicamentos	Sistema				1,00				300.000,00
Personas capacitadas en Gestión de Infraestructura y Personal	Personas				30,00				300.000,00
<b>Inversiones en infraestructura y equipamiento</b>									
Hospital de especialidades en Llallagua construido y equipado.	Hospital				1,00				13.110.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi refaccionados.	Establecimient o				50,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi ampliados.	Establecimient o				25,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi equipados.	Establecimient os				200,00				2.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi construidos.	Establecimient o				2,00				2.500.000,00
Construcción y equipamiento de hospital de segundo nivel en departamento de Potosi de acuerdo con criterios de selección establecidos	hospital				1,00				3.000.000,00
<b>Administracion y Monitoreo</b>									
Monitoreo y Evakuación del proyecto.	systema				1,00				1.000.000,00

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi  
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 14/09/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
DGSS Fortalecido	personas				15,00	40.000,00			220.000,00
Auditoría	Auditoría				5,00				200.000,00
Fortalecimiento SEDES Potosí	Personas				5,00				200.000,00
Administración UGESPRO	Personas				6,00				220.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>40.000,00</b>			<b>35.000.000,00</b>
