




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2614/BL-BO	Current Approved Amount:	35.000.000,00	Original IDB:	35.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	35.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	83,00
Related Operation(s):	BO-T1145	Balance:	35.000.000,00	Co-Financing/Country:	7.270.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	42.270.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 18-sep-2012 Validated by Country Representative: 26-sep-2012

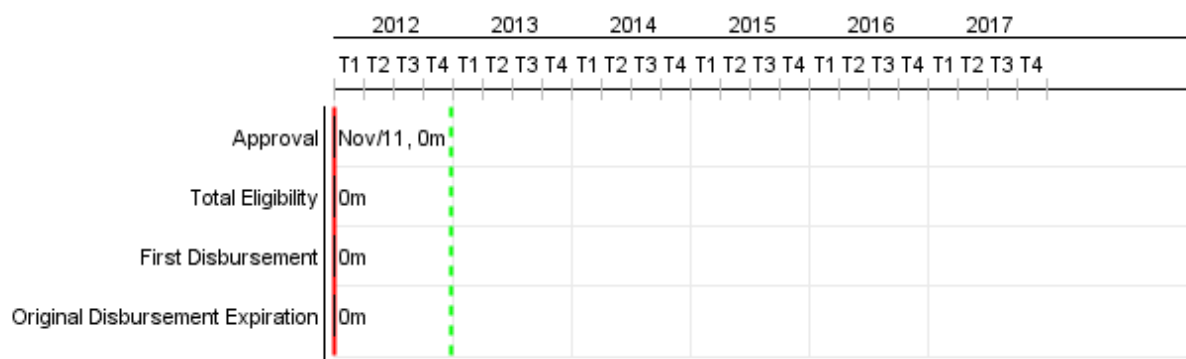

Accumulated Progress as of 2012

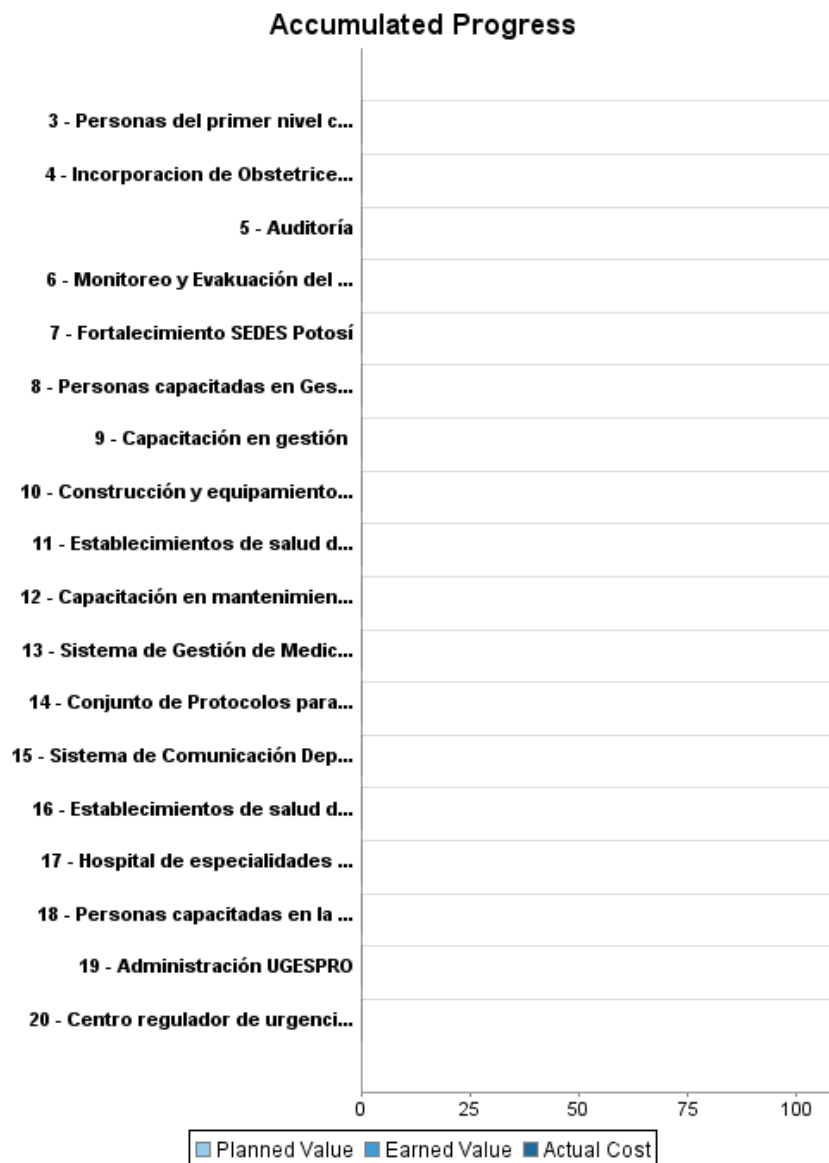


PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 14/09/2012

Accumulated Progress

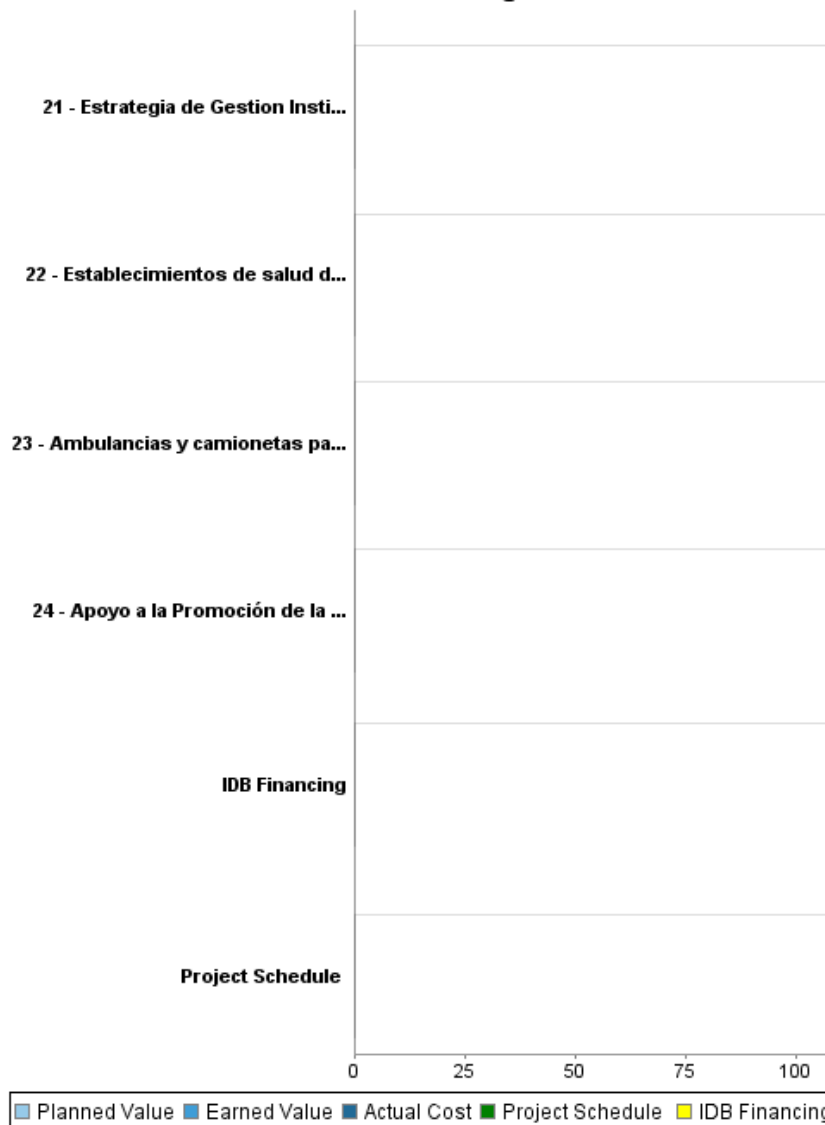

Outcomes

Outcome:	Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Cobertura de Parto Institucional	numero	20,000.00	2010	P						35,000.00
				A						
Mujeres con complicaciones obstétricas referidas al nivel apropiado	Porcentaje	53.00	2010	P						80.00
				A						
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P						80.00
				A						
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P						50.00
				A						
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P						200.00
				A						
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Numero	100.00	2011	P						475.00
				A						
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P		500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00
				A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosi									
Personas del primer nivel capacitadas en promoción de la salud.	Personas				200,00				200.000,00
Centro regulador de urgencias medicas equipado.	Centro				1,00				450.000,00
Personas capacitadas en la aplicación de los protocolos para sistema de referencia y retorno .	personas				200,00				500.000,00
Sistema de Comunicación Departamental	Sistema				1,00				500.000,00
Capacitación en mantenimiento de equipo medico e industrial en Potosi	personas				50,00				500.000,00
Capacitación en gestión	Personas				30,00				300.000,00
Incorporacion de Obstetrices en el sistema de salud departamental	Personas				30,00				300.000,00
Apoyo a la Promoción de la Salud	Programa de Promocion				1,00				500.000,00
Ambulancias y camionetas para sistema de referencia y retorno	Unidades				6,00				300.000,00
Estrategia de Gestion Institucional	Estrategia				1,00				200.000,00
Conjunto de Protocolos para sistema de referencia y retorno	conjunto				1,00				200.000,00
Sistema de Gestión de Medicamentos	Sistema				1,00				300.000,00
Personas capacitadas en Gestión de Infraestructura y Personal	Personas				30,00				300.000,00
Inversiones en infraestructura y equipamiento									
Hospital de especialidades en Llallagua construido y equipado.	Hospital				1,00				13.110.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi refaccionados.	Establecimient o				50,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi ampliados.	Establecimient o				25,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi equipados.	Establecimient os				200,00				2.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi construidos.	Establecimient o				2,00				2.500.000,00
Construcción y equipamiento de hospital de segundo nivel en departamento de Potosi de acuerdo con criterios de selección establecidos	hospital				1,00				3.000.000,00
Administracion y Monitoreo									
Monitoreo y Evakuación del proyecto.	systema				1,00				1.000.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosí
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 14/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
DGSS Fortalecido	personas				15,00	40.000,00			220.000,00
Auditoría	Auditoría				5,00				200.000,00
Fortalecimiento SEDES Potosí	Personas				5,00				200.000,00
Administración UGESPRO	Personas				6,00				220.000,00
TOTAL						40.000,00			35.000.000,00
