
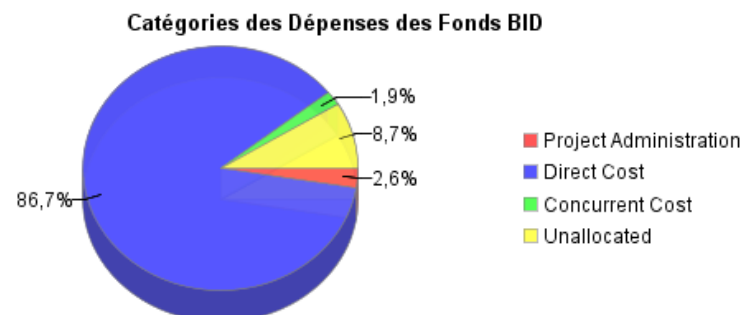
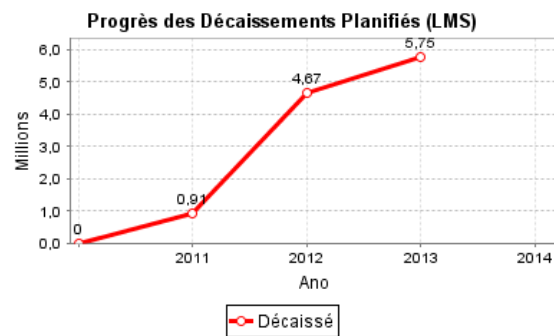



Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Guyana Water Incorporated				
Secteur:	WATER AND SANITATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2428/BL-GY	Montant Courant Approuvé:	9.500.000,00	Initial BID:	9.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	5.753.864,05	Courant BID:	9.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	60,57	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):	GY-P1007, RG-P1400	Solde:	3.746.135,95	Cofinancement/Pays:	500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	10.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	288

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2013 Validé par le Représentant: 27-sep-2013

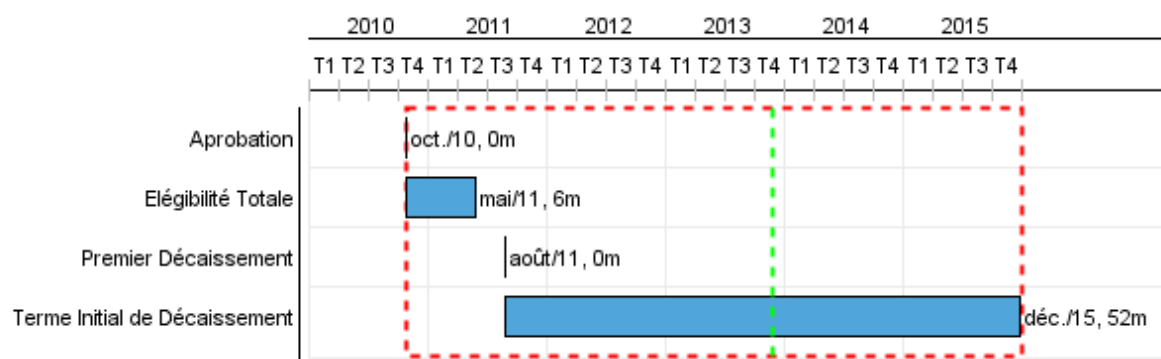

Progrès Cumulé à 2013

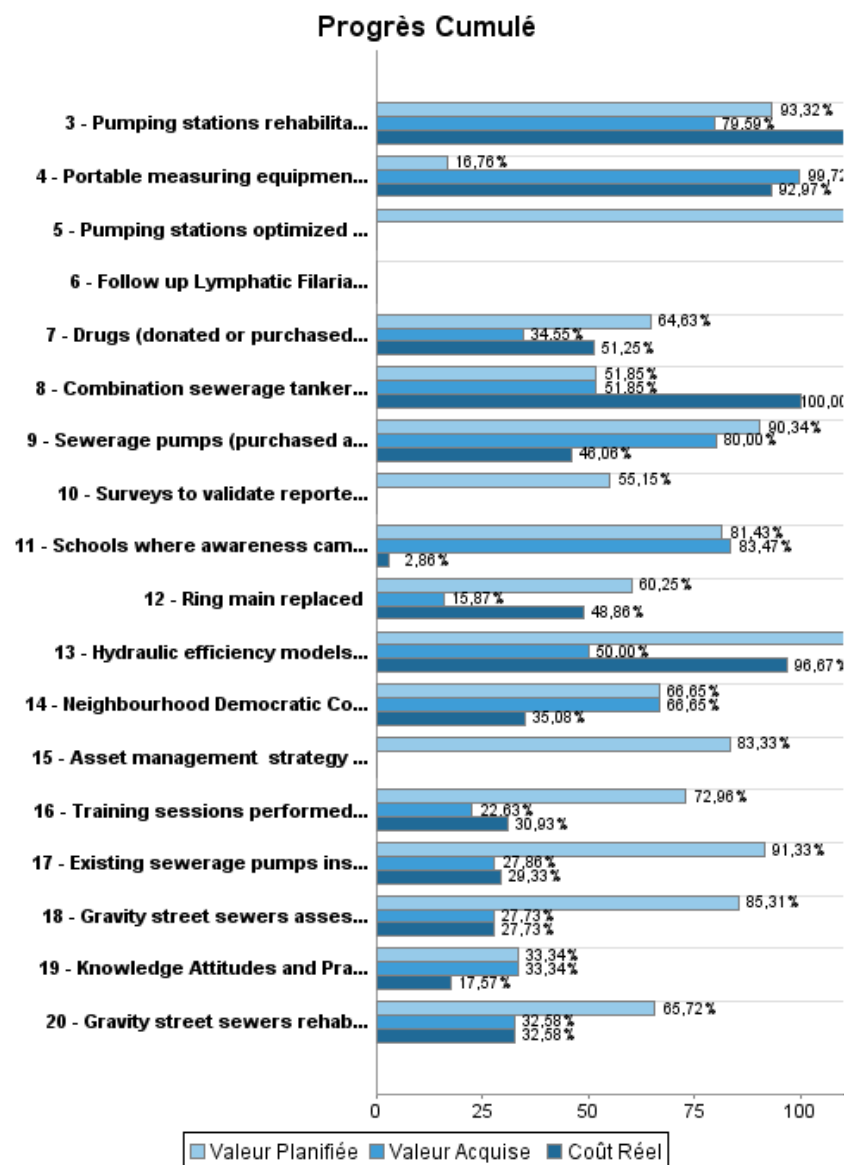

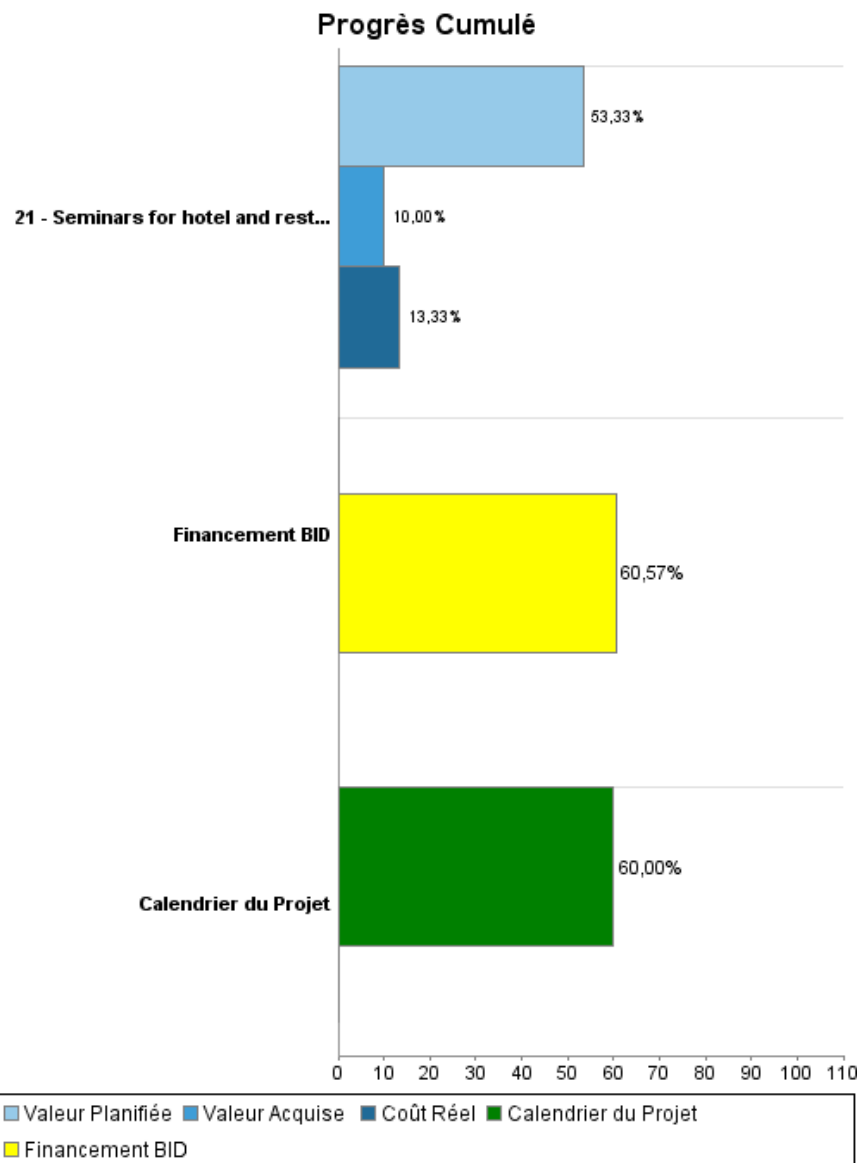

Résultats

Résultat: Georgetown sewerage system performance improved

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Households served by an improved sewerage system	Houesholds		2010	P A				8.500,00	4.500,00	13.000,00

Résultat: GWI capacity to Operate and Maintain assets increased

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Number of breakdowns per year	breakdowns	354,00	2012	P A			301,00	256,00	217,00	217,00

Résultat: Energy use in Guyana Water Incorporated (GWI) improved

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Energy consumption in 12 pilot facilities	MWh/year	3.300,00	2009	P A	3.300,00 3.300,00	3.000,00 3.300,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00

Résultat: Water-related Neglected Tropical Diseases controlled and, where feasible, eliminated in Region 4

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Soil-Transmitted Helminthiasis (STH) and Lymphatic filariasis (LF) prevalence estimated	Assessments		2010	P A		1,00 1,00		1,00	1,00	3,00
Prevalence of Lymphatic filariasis (LF) infection	% of population infected	20,00	2001	P A		5,00 3,00		2,00	1,00	1,00
Prevalence of Soil-Transmitted Helminthiasis (STH) infection	% of population infected	25,00	2009	P A		25,00 1,00		16,00	10,00	10,00
% of surveyed individuals who know key facts about the diseases (e.g. their causes and symptoms) and about MDA (e.g. that it is harmless, free, targeted at the entire population etc.)	Percentage		2009	P A		40,00 40,25		60,00	80,00	80,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Rehabilitation of Georgetown s sewerage system									
Ring main replaced	Kilometers	2,00			5,50	582.000,00			3.413.871,00
Delivery mains replaced	Kilometers	3,00	3,00		6,00	133.000,00	147.000,00		426.399,00
Sewerage pumps (purchased and) installed	Pumps	18,00	18,00		24,00	906.000,00	295.000,00		1.799.938,00
Existing sewerage pumps installed	Pumps	5,00			9,00	35.000,00	1.000,00		68.186,00
Gravity street sewers assessed	Sewer basins				1,00	250.000,00			551.769,00
Pumping stations rehabilitated	Pumping stations	6,00	6,00		9,00	78.000,00	567.000,00		145.741,00
Gravity street sewers rehabilitated	Meters	50,00			200,00	30.000,00			116.622,00
Combination sewerage tanker purchased	Tankers				1,00	32.000,00	32.000,00		351.000,00
Institutional strengthening of Guyana Water Inc. (GWI)									
Asset management strategy developed	Strategies				1,00	50.000,00			150.000,00
Training sessions performed within Guyana Water Inc. (GWI) on wastewater management and energy efficiency	Training sessions	5,00	1,00		10,00	66.000,00	10.000,00		142.000,00
Schools where awareness campaign has been completed	Schools	7,00	3,00		20,00	11.000,00			35.000,00
Seminars for hotel and restaurant owners carried out	Seminars	3,00			10,00	5.000,00			15.000,00
Energy efficiency pilot project									
Portable measuring equipment purchased	Equipment				9,00				74.000,00
Hydraulic efficiency models completed	Hydraulic models	2,00	1,00		2,00	30.000,00	29.000,00		30.000,00
Pumping stations optimized (rehabilitated, calibrated, etc.)	Pumping stations	9,00			12,00	126.000,00			168.000,00
Prevalence Reduction in Water Related Diseases									
Baseline survey of Lymphatic Filariasis (LF) and Soil-Transmitted Helminthiasis (STH) prevalence carried out	Surveys				1,00				6.000,00
Follow up Lymphatic Filariasis (LF) and Soil-Transmitted Helminthiasis (STH) prevalence surveys carried out	Surveys				2,00				28.470,00
Knowledge Attitudes and Practices surveys carried out	Surveys				3,00				5.690,00
Drugs (donated or purchased) successfully distributed	Drugs	900.000,00	322.000,00		4.500.000,00	48.000,00	24.000,00		159.360,00

RAPPORT DE SUIVI

GY-L1025 - Georgetown Sanitation Improvement Program
2013 1^o período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 19/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Surveys to validate reported drug coverage carried out	Surveys	1,00			5,00	2.000,00			5.690,00
Neighbourhood Democratic Councils (NDCs) in which social mobilization and health education workshops are carried out	Councils	15,00	15,00		15,00	13.000,00	4.000,00		57.010,00
Management, contingencies and others									
Project Managment for GWI	N/A					66.000,00	5.000,00		250.000,00
Auditing	N/A								120.000,00
Work supervision	N/A					300.000,00	94.000,00		600.000,00
Monitoring and Evaluation	N/A					30.000,00	4.000,00		60.000,00
Contingencies	N/A								1.041.710,00
Financial charges	N/A					33.000,00			164.000,00
Project Management for Unit within Ministry of Health	N/A					6.000,00			14.540,00
TOTAL						2.832.000,00	1.212.000,00		9.999.996,00
