
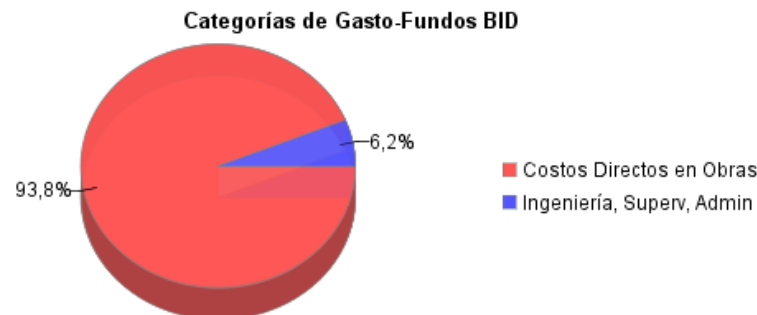




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SUBSECRETARIA DE ENERGIA		
Setor: ENERGY-POWER LINES		
Número da Operação: 2514/OC-AR	Atual: 120.000.000,00	Original BID: 120.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 120.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: RG-P1442	Saldo: 120.000.000,00	Cofinanciamento/País: 120.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 240.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 252

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 21, 2011

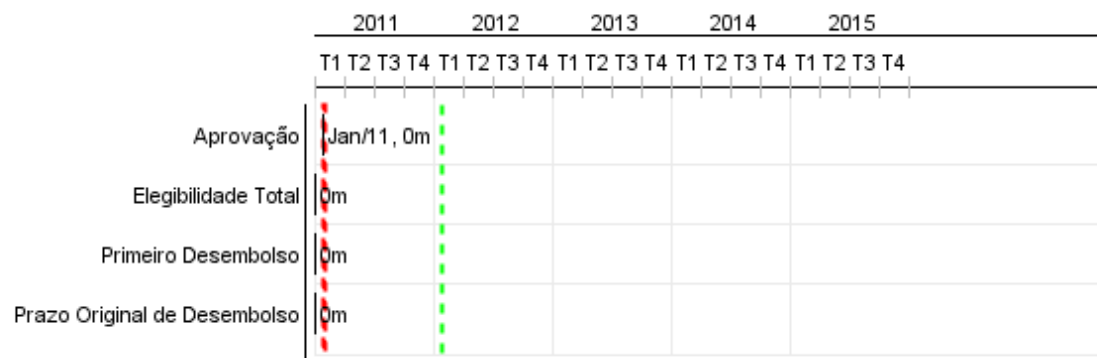

Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Aumentar la eficiencia del sistema de transmision y distribucion
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Capacidad para atender demanda máxima adicional en el área de influencia de las zonas del proyecto incrementada	MW	66,00	2010	P	270,50
				A	
Estaciones transformadoras en las zonas de influencia de proyecto con voltajes de fuera de banda reducida (>al +/-5%)	Estaciones	30,00	2010	P	15,00
				A	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Recuperar la capacidad de transmision de energia electrica a nivel provincial									
Líneas de transmisión en alta tensión puestos en servicio	Kilómetros	90,00			837,30	53.760.501,46			
Capacidad de transformacion en Estaciones de Transformacion puesta en servicio o habilitada	MVA	50,00			292,50	8.637.421,22			
TOTAL						62.397.922,68			
