
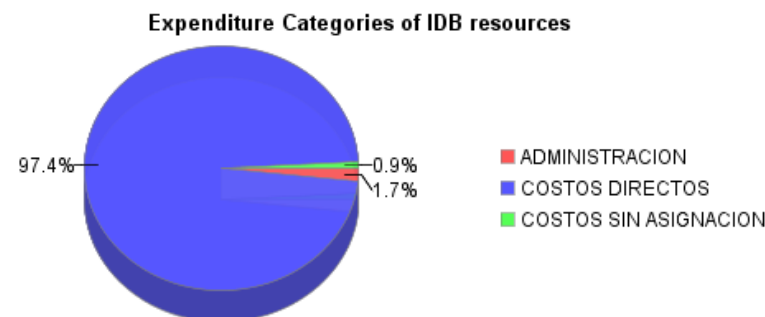



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
Sector:	TRANSPORTATION-RURAL ROADS				
Loan Number(s):	2369/OC-ES	Current Approved Amount:	35.000.000,00	Original IDB:	35.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	35.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	ES-P1060	Balance:	35.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	35.000.000,00
				Amortization Period (months):	242

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 03-may-2012 Validated by Country Representative: 03-may-2012

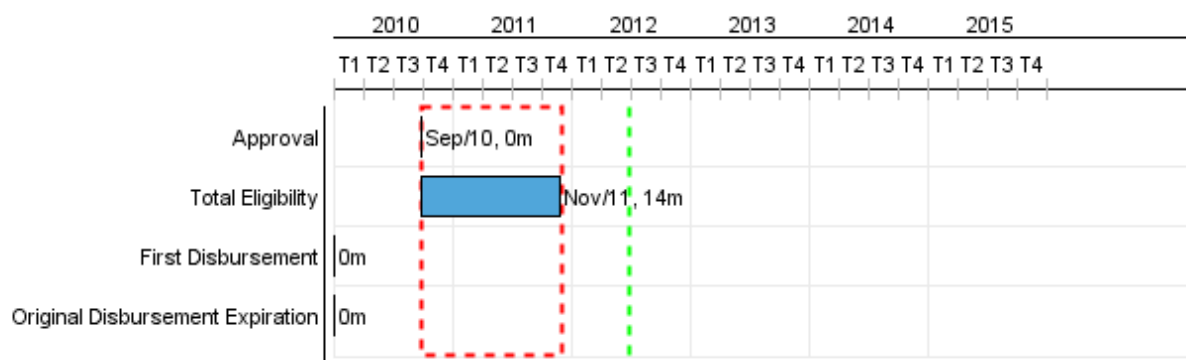

## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Costo de Transporte reducido
<b>Comments:</b>	Se definirán los valores de los indicadores una vez finalizado el Estudio de Factibilidad Económica; Valorar meta para primer año de habilitación de las obras de mejora; Transitabilidad permanente para primer año de las obras

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0.59	2011	P A	0,40
Velocidad para los Usuarios de Automóviles	Km/h	24.70	2011	P A	50,00
Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5.93	2011	P A	3,50
Velocidad para los Usuarios de Autobuses	Km/h	22.70	2011	P A	45,00
Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3.19	2011	P A	2,15
Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	Km/h	22.70	2011	P A	45,00

<b>Outcome:</b>	Acceso a través de los caminos rurales mejorado
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Días de intransitabilidad o con restricciones severas al tránsito a través de los caminos	Días		2011	P A	0,00

<b>Outcome:</b>	Calidad de la red de caminos rurales incrementada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Caminos con un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 3 m/km, dotados de drenajes y de dispositivos de seguridad	Km		2011	P A	61,26

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente I: Obras de Vialidad Rural y su Supervisión</b>									
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario LIB31N, Tramo: San Pablo Tacachico - Canton San Isidro, La Libertad ejecutadas	Kilómetros				12,17				5.571.589,63
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario CHA25N, Tramo: Nueva Concepción - LD. La Libertad, Chalaténango ejecutadas	Kilómetros				13,16				6.619.480,08
Obras de MEJORAMIENTO DE CAMINO Terciario LIB22S: Et. LIB05W (Dv. Comasagua) - Dv. LIB18S (Chiltiupan). La Libertad ejecutadas	Kilómetros				9,58				5.290.957,08
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, Tramo Canton San Antonio - Canton El Carrizal Dep. San Miguel - Morazan ejecutadas	Kilómetros				7,00				3.945.098,08
Obras de MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MOR13W Tramo San Simón - San Isidro, Dep. Morazan ejecutadas	Kilómetros				3,50				1.972.549,55
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO RURAL No. 7, ejecutadas	Kilómetros				3,78				2.406.264,58
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario SAV29S, Tramo: San Carlos Lempa (SAV 09S) hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente, ejecutadas	Kilómetros				13,92				6.844.061,11
<b>Componente II: Fortalecimiento Institucional</b>									
Sistema de Planificación, Supervisión y Evaluación de Impacto implantado	Sistema				1,00				400.000,00
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) capacitados	Funcionarios				548,00				200.000,00
Equipamiento de cómputo adquirido	Unidades				256,00				650.000,00
Campaña de Seguridad Vial Rural ejecutada	Campaña				7,00				200.000,00
<b>Costo y Financiamiento</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>34.100.000,11</b>
