
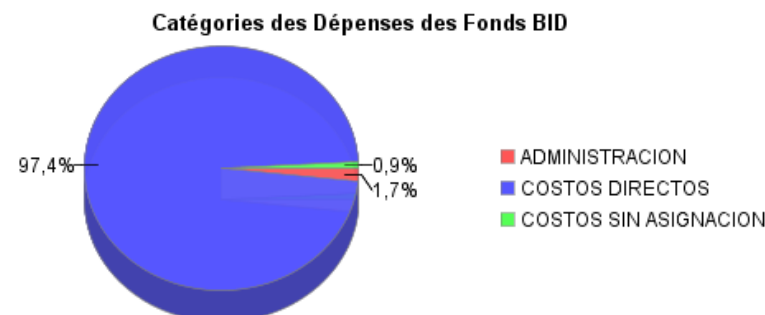
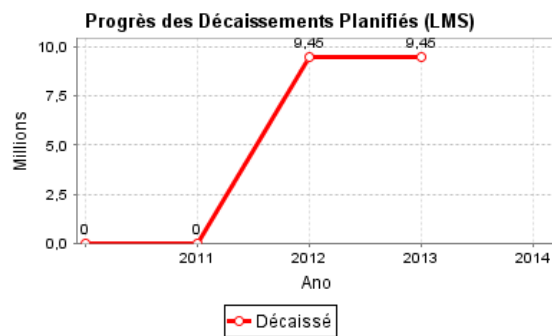



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,TRANSPORTE,VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
Secteur:	TRANSPORT-RURAL ROADS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2369/OC-ES	Montant Courant Approuvé:	35.000.000,00	Initial BID:	35.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.446.993,44	Courant BID:	35.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	26,99	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	ES-P1060	Solde:	25.553.006,56	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	35.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	242

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 09-abr-2013 Validé par le Représentant: 10-abr-2013

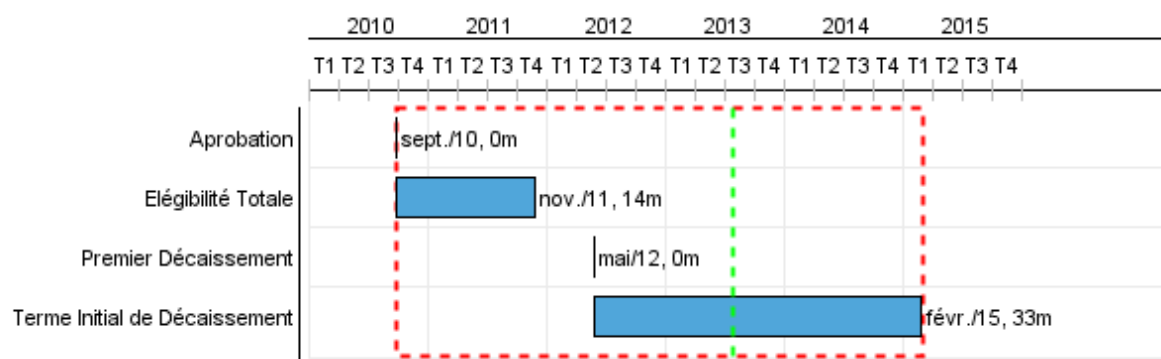

Progrès Cumulé à 2012

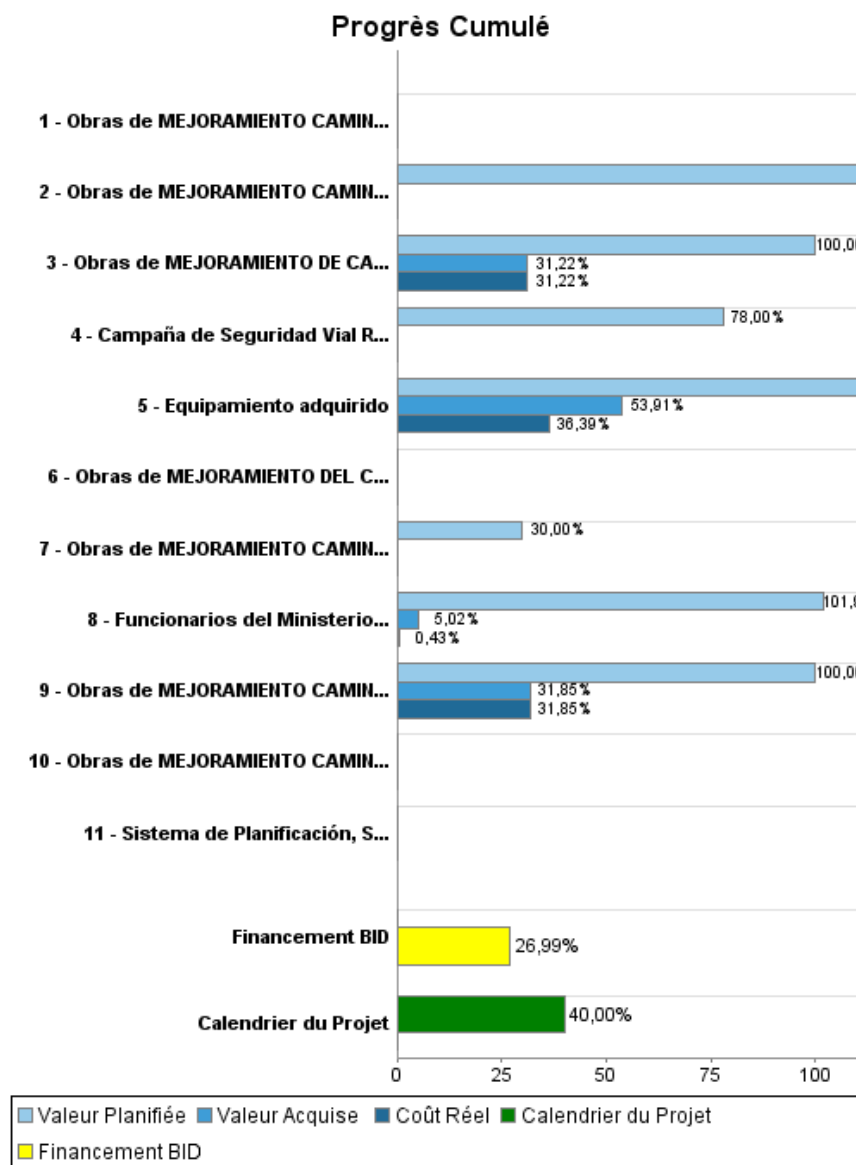

Résultats

Résultat:	Costo de Transporte reducido
Observações:	Se definirán los valores de los indicadores una vez finalizado el Estudio de Factibilidad Económica; Valorar meta para primer año de habilitación de las obras de mejora; Transitabilidad permanente para primer año de las obras

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Costo de operación vehicular para Automóviles	US\$/veh.km	0,59	2011	P A	0,40
Velocidad para los Usuarios de Automóviles	Km/h	24,70	2011	P A	50,00
Costo de operación vehicular para Autobuses	US\$/veh.km	5,93	2011	P A	3,50
Velocidad para los Usuarios de Autobuses	Km/h	22,70	2011	P A	45,00
Costo de operación vehicular para Camiones Pesados	US\$/veh.km	3,19	2011	P A	2,15
Velocidad para los Usuarios de Camiones Pesados	Km/h	22,70	2011	P A	45,00

Résultat:	Acceso a través de los caminos rurales mejorado
------------------	-------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Días de intransitabilidad o con restricciones severas al tránsito a través de los caminos	Días		2011	P A	

Résultat:	Calidad de la red de caminos rurales incrementada
------------------	---------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Caminos con un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 3 m/km, dotados de drenajes y de dispositivos de seguridad	Km		2011	P A	61,26

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I: Obras de Vialidad Rural y su Supervisión									
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario LIB31N, Tramo: San Pablo Tacachico - Canton San Isidro, La Libertad ejecutadas	Kilómetros				12,07		1.873.842,52		5.884.111,74
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario CHA25N, Tramo: Nueva Concepción - LD. La Libertad, Chaltenango ejecutadas	Kilómetros				9,42	2.755.146,40			4.103.123,47
Obras de MEJORAMIENTO DE CAMINO Terciario LIB22S: Et. LIB05W (Dv. Comasagua) - Dv. LIB18S (Chiltiupan). La Libertad ejecutadas	Kilómetros				9,58		1.830.642,68		5.864.381,57
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Rural SAM33, Tramo Canton San Antonio - Canton El Carrizal Dep. San Miguel - Morazan ejecutadas	Kilómetros				7,00				3.945.098,08
Obras de MEJORAMIENTO DEL CAMINO Rural MOR13W Tramo San Simon - San Isidro, Dep. Morazan ejecutadas	Kilómetros				3,50				1.972.549,55
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Rural PAZ18W/PAZ21S, Tramo Entre Verapaz y Mercedes La Ceiba, Departamento de La Paz	Kilómetros				8,33				3.238.168,41
Obras de MEJORAMIENTO CAMINO Terciario SAV29S, Tramo: San Carlos Lempa (SAV 09S) hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente, ejecutadas	Kilómetros				14,32				7.642.567,18
Composante II: Fortalecimiento Institucional									
Sistema de Planificación, Supervisión y Evaluación de Impacto implantado	Sistema				1,00				400.000,00
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVUDU) capacitados	Funcionarios	76,00	9,00		548,00	84.835,00	855,00		200.000,00
Equipamiento adquirido	Unidades	256,00	138,00		256,00	650.000,00	236.557,18		650.000,00
Campaña de Seguridad Vial Rural ejecutada	Campaña	1,00			7,00	96.000,00			200.000,00
Costo y Financiamiento									
Administración y Auditoría	N/A					155.000,00	58.066,00		600.000,00
Costos sin asignación	N/A								300.000,00
TOTAL						3.740.981,40	3.999.963,38		35.000.000,00
