
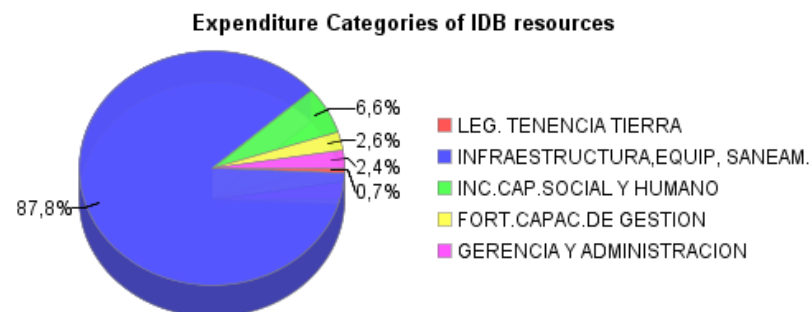
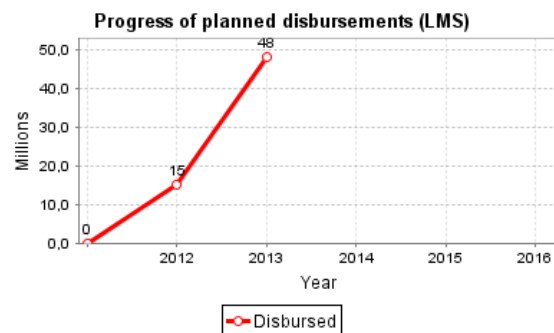



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING				
Loan Number(s):	2662/OC-AR	Current Approved Amount:	400.000.000,00	Original IDB:	400.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	48.000.000,00	Current IDB:	400.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	12,00	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):	AR-L1019, AR-X1004, RG-P1442	Balance:	352.000.000,00	Co-Financing/Country:	45.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	445.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-oct-2013

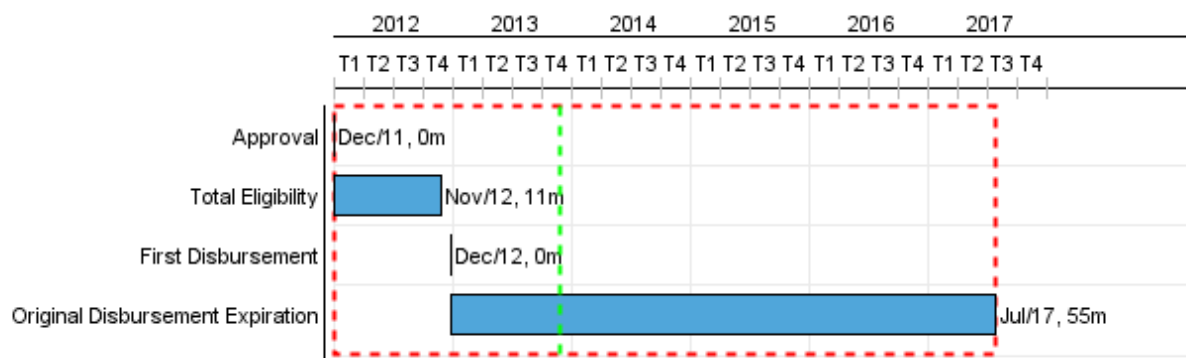

Accumulated Progress as of 2013

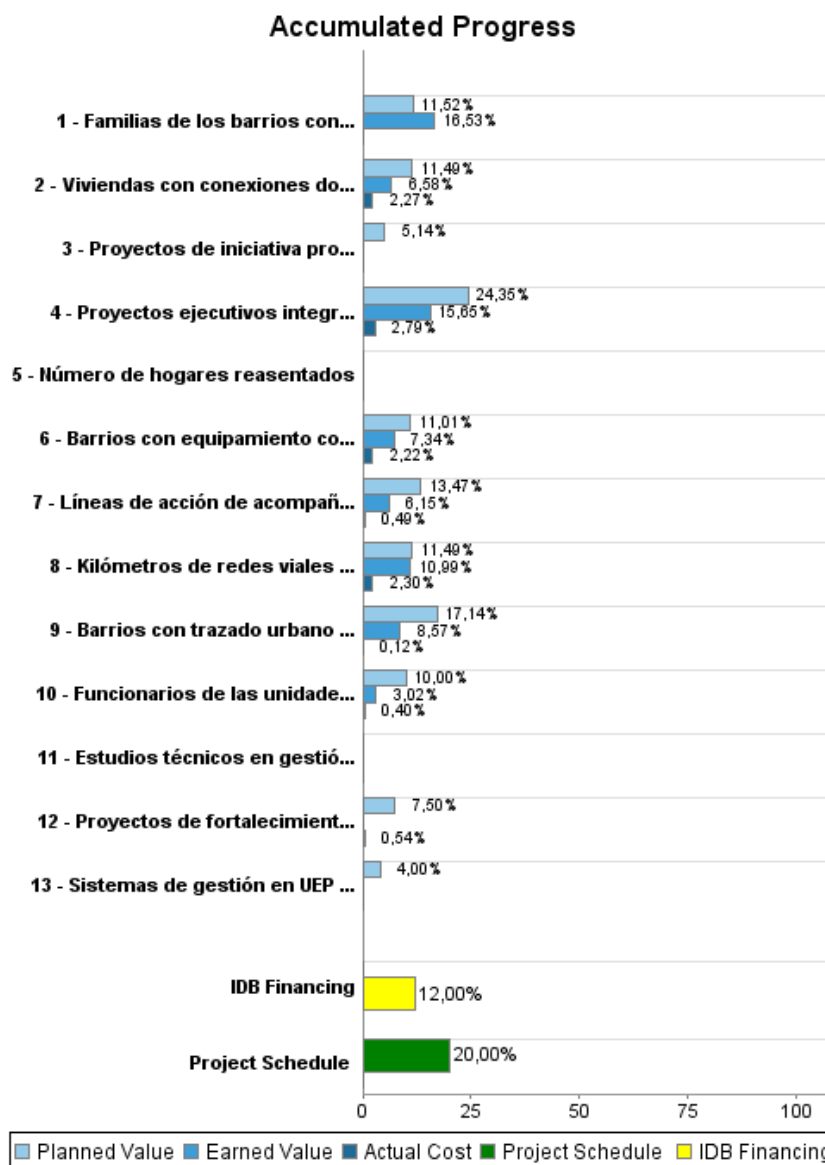

Outcomes

Outcome: Seguridad en la tenencia de la tierra mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Familias de los barrios que tienen títulos de propiedad	%		2012	P A	30,00

Outcome: Cobertura en servicios básicos mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Barrios intervenidos donde funcionan satisfactoriamente al menos tres de los servicios básicos (agua, cloacas, gas y alumbrado público)	%		2012	P A	100,00
Barrios intervenidos donde los equipamientos comunitarios operan satisfactoriamente	%		2012	P A	75,00

Outcome: Organizaciones comunitarias de base integradas a la ciudad formal

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Hogares que participan en actividades comunitarias	%		2012	P A	40,00
Incremento del capital social y humano de participantes en PFCSyH y PICs	%		2012	P A	40,00

Outcome: Desempeño de los equipos de supervisión y gestión de las unidades ejecutoras mejorado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Desfase entre el tiempo programado vs realizado en la licitación de obras	%	34,80	2012	P A	20,00
Desfase entre el tiempo programado vs realizado en la ejecución de las obras	%	31,90	2012	P A	20,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Legalización de la tenencia de la tierra									
Barrios con trazado urbano regularizado	barrios	12,00	6,00		70,00	289.000,00	2.000,00		1.686.000,00
Familias de los barrios con situación legal en sus lotes.	familias	6.332,00	9.083,00		55.059,00	143.000,00			1.241.000,00
Provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental									
Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable, cloacas, gas y electricidad	Hogares	11.712,00	6.703,00		55.059,00	9.942.000,00	1.960.000,00		86.525.000,00
Barrios con equipamiento comunitario instalado	barrios	9,00	6,00		64,00	5.751.000,00	1.160.000,00		52.225.000,00
Número de hogares reasentados	hogares	1.170,00			5.500,00				
Kilómetros de redes viales construidas o mejoradas	kilómetros	23,00	22,00		196,00	28.889.000,00	5.791.000,00		251.427.000,00
Incremento de capital humano y social									
Líneas de acción de acompañamiento integral y gestión asociada desarrolladas anualmente en los proyectos por los equipos de campo (talleres, curso de capacitación, ferias)	líneas de acción	357,00	163,00		2.651,00	3.132.000,00	113.000,00		23.254.000,00
Proyectos de iniciativa productiva comunitaria ejecutados	proyectos	2,00			39,00	203.000,00			3.951.000,00
Proyectos de fortalecimiento de capital social y humano ejecutados	proyectos	3,00			40,00	153.000,00	11.000,00		2.040.000,00
Fortalecimiento de la capacidad de gestión									
Funcionarios de las unidades ejecutoras y/o actores sociales del programa que participan en talleres y seminarios de capacitación	participantes	400,00	121,00		4.000,00	200.000,00	8.000,00		2.000.000,00
Estudios técnicos en gestión urbana producidos por la UCN y UEP	estudios				3,00				1.500.000,00
Proyectos ejecutivos integrales producidos por la UEP y UEM	proyectos	28,00	18,00		115,00	1.804.000,00	207.000,00		7.410.000,00
Sistemas de gestión en UEP mejorados	sistemas de gestión	1,00			25,00	20.000,00			500.000,00
Administración, Auditoría y Evaluación									
Administración, Auditoría y Evaluación	N/A					2.030.000,00	936.000,00		11.241.000,00
TOTAL						52.556.000,00	10.188.000,00		445.000.000,00
