


Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número(s) de Préstamo:	2493/OC-CR	Monto Aprobado Actual: 73.000.000,00	BID Original: 73.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 73.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	CR-T1034, CR-X1009, CR-P1056, RG-P1400	Saldo: 73.000.000,00	Co-financiamiento/País: 247.100.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 320.100.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011 Validado por Representante de País: Apr 20, 2011

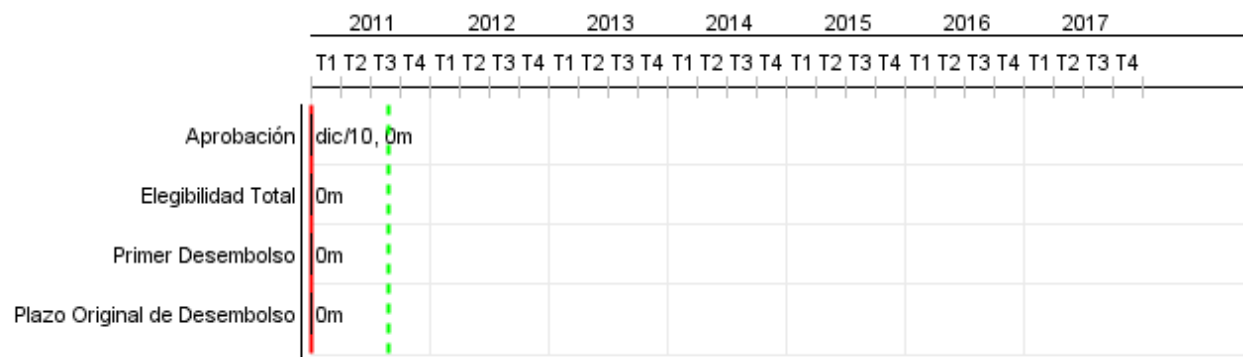

Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Mejoramiento ambiental del Area Metropolitana de San José
Observaciones:	Verificación por encuesta permanente de hogares

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Población con acceso a saneamiento en la subcuenca María Aguilar	personas	80.223,00	2011	P A	14.496,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	130.448,00
Población con acceso a saneamiento en la subcuenca Tiribí	personas	242.481,00	2011	P A	64.100,00	118.340,00	118.340,00	113.409,00	118.340,00	532.531,00
Caudal de aguas residuales tratadas (caudal diario promedio)	m3/sec		2011	P A					2,80	2,80
Población con acceso a saneamiento en las cuencas Rivera y Torres	personas	220.000,00	2011	P A	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	560.000,00
Caudal de aguas residuales transportado por el tunel de travesé	m3/sec		2011	P A					1,20	1,20

Resultado:	Mejoramiento infraestructural y institucional en sistemas de agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias
Observaciones:	Medida de verificación por el sistema de facturación de la ASADA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Hogares con acceso al sistema de agua construido/ rehabilitado por el Programa	Households		2011	P A	1.683,00	3.361,00	3.361,00	1.692,00		10.097,00
Sistemas con plan de mantenimiento rutinario en ejecución	sistemas		2011	P A			3,00	3,00		6,00
Sistemas rehabilitados o nuevos con ingresos superiores a los costos de administración, operación y mantenimiento	sistemas		2011	P A	1,00	2,00	2,00			5,00
Hogares con acceso a soluciones individuales de saneamiento construido / rehabilitado por el Programa	Houesholds		2011	P A			250,00	250,00		500,00

Resultado:	Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Población con acceso a agua potable financiado con el Programa	Households		2011	P A		13.179,00	15.815,00			28.994,00
Población con acceso a saneamiento financiado con el Programa	Houesholds		2011	P A		4.513,00				4.513,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Apoyo al mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José									
red de alcantarillado rehabilitados en María Aguilar	km				13,40				2.372.000,00
red de alcantarillado rehabilitados en Tiribí	km				10,00				2.027.000,00
red de alcantarillado construidos en María Aguilar	km				14,40				2.486.000,00
red de alcantarillado construidos en Tiribí	km				51,60				8.983.000,00
colectores rehabilitados en María Aguilar	km				13,00				32.293.000,00
colectores construidos en María Aguilar	km				24,10				2.696.000,00
colectores construidos en Tiribí	km				34,80				8.331.000,00
colectores rehabilitados en Tiribí	km				8,60				30.767.000,00
Planta de tratamiento de aguas residuales construida	plantas				1,00				70.000.000,00
Colectores y alcantarillados en las cuencas Rivera y Torres construidos o rehabilitados, conexión San Miguel construido	km				111,00				68.292.000,00
Tunel de trasvase construido	tunel				1,00				9.116.000,00
Diseños finales de la aplicación del sistema de alcantarillado sanitario del AMSJ preparados y la supervisión en la fase constructiva de las obras realizada	diseños y supervisión				1,00				17.200.000,00
Agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias									
Sistemas de agua potable diseñados incluidos pliegos de licitación aprobados por el BID	sistemas de agua diseñados incluidos pliegos de licitación				6,00				100.000,00
Sistemas de agua potable construidos y/o rehabilitados, transferidos y funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas de agua potable construidos y/o rehabilitados, transferidos y funcionando				6,00				24.650.000,00
Soluciones individuales de saneamiento construidas por el Programa	Soluciones individuales de saneamiento				500,00				500.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CR-L1024 - Programa de Agua Potable y Saneamiento
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 13/04/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Arreglo institucional para manejo del sistema de La Virgen y Puerto Viejo establecido	Institucion de La Virgen y Puerto Viejo arreglada				1,00				50.000,00
Arreglo institucional para manejo del sistema de Santa Rosa de Pocosol establecido	Institucion de Santa Rosa arreglada				1,00				25.000,00
Capacitación de 25 personas de ASADAS en operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable realizado	Capacitación				2,00				30.000,00
Capacitacion de 24 personas de ASADAS en administración financiera, comercial y contable de los sistemas de agua potable realizado	Capacitación				2,00				30.000,00
Número de computadores con software instaladas en las ASADAS	computadores con software instaladas				8,00				75.000,00
Sistema de información geográfica para la oficina regional del AyA diseñado y en funcionamiento	Sistema de información geográfica diseñada y en funcionamiento				1,00				50.000,00
Estudios hidrogeológicos concluidos	Estudios hidrogeológicos				1,00				500.000,00
Número de actividades de capacitación en educación sanitaria realizadas en las comunidades rurales beneficiadas	actividades de capacitación en educación sanitaria				30,00				40.000,00
Número de actividades de capacitación sobre el uso y conservación del agua realizadas en las comunidades rurales beneficiadas	actividades de capacitación sobre el uso y conservación del agua				6,00				10.000,00
Número de capacitaciones en entidades educativas en zonas rurales sobre educación sanitaria/ambiental y uso y conservación del agua realizados	capacitaciones en entidades educativas en zonas rurales				30,00				40.000,00
Agua potable y saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José									
Proyectos de agua potable y/o alcantarillado diseñados	Proyectos diseñados				10,00				1.764.837,00
Redes de agua potable construidos o rehabilitados	km				73,20				9.160.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CR-L1024 - Programa de Agua Potable y Saneamiento
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 13/04/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Redes de alcantarillado construidos o rehabilitados	km				14,80				2.605.631,00
Campañas de educación ambiental y sanitaria en 10 barrios peri-urbanos del proyecto realizadas	campañas				20,00				200.000,00
Estudios de factibilidad ambiental, social, económico, técnico y financiera preparados	estudios				10,00				269.532,00
Administración del programa									
Costos financieros									
Otros costos									
TOTAL									294.663.000,00
