



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS				
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE				
Loan Number(s):	2493/OC-CR	Current Approved Amount:	73.000.000,00	Original IDB:	73.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	73.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	CR-T1034, CR-X1009, CR-P1056, RG-P1400	Balance:	73.000.000,00	Co-Financing/Country:	247.100.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	320.100.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 14, 2011 Validated by Country Representative: Apr 20, 2011

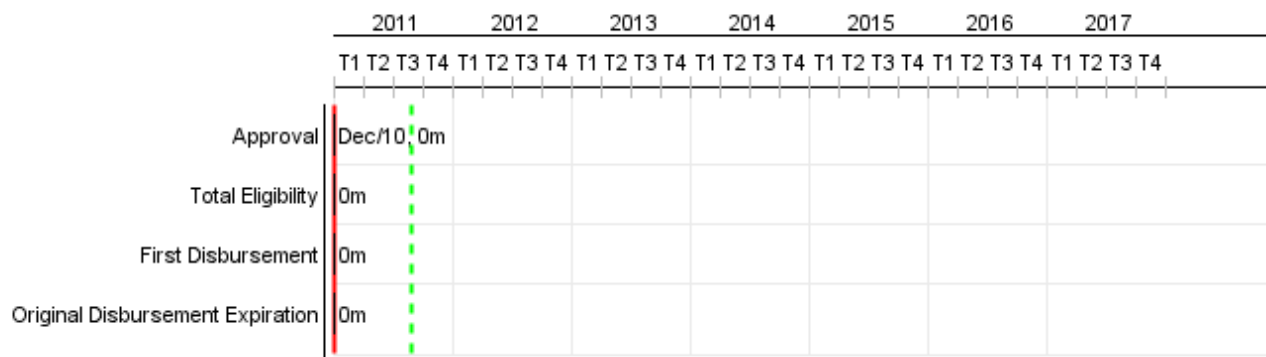

Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Mejoramiento ambiental del Area Metropolitana de San José
Comments:	Verificación por encuesta permanente de hogares

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Población con acceso a saneamiento en la subcuenca María Aguilar	personas	80.223,00	2011	P A	14.496,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	28.988,00	130.448,00
Población con acceso a saneamiento en la subcuenca Tiribí	personas	242.481,00	2011	P A	64.100,00	118.340,00	118.340,00	113.409,00	118.340,00	532.531,00
Caudal de aguas residuales tratadas (caudal diario promedio)	m3/sec		2011	P A					2,80	2,80
Población con acceso a saneamiento en las cuencas Rivera y Torres	personas	220.000,00	2011	P A	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	560.000,00
Caudal de aguas residuales transportado por el tunel de travesé	m3/sec		2011	P A					1,20	1,20

Outcome:	Mejoramiento infraestructural y institucional en sistemas de agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias
Comments:	Medida de verificación por el sistema de facturación de la ASADA

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Hogares con acceso al sistema de agua construido/ rehabilitado por el Programa	Households		2011	P A	1.683,00	3.361,00	3.361,00	1.692,00		10.097,00
Sistemas con plan de mantenimiento rutinario en ejecución	sistemas		2011	P A			3,00	3,00		6,00
Sistemas rehabilitados o nuevos con ingresos superiores a los costos de administración, operación y mantenimiento	sistemas		2011	P A	1,00	2,00	2,00			5,00
Hogares con acceso a soluciones individuales de saneamiento construido / rehabilitado por el Programa	Houesholds		2011	P A			250,00	250,00		500,00

Outcome:	Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Población con acceso a agua potable financiado con el Programa	Households		2011	P A		13.179,00	15.815,00			28.994,00
Población con acceso a saneamiento financiado con el Programa	Houesholds		2011	P A		4.513,00				4.513,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Apoyo al mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José									
red de alcantarillado rehabilitados en María Aguilar	km				13,40				2.372.000,00
red de alcantarillado rehabilitados en Tiribí	km				10,00				2.027.000,00
red de alcantarillado construidos en María Aguilar	km				14,40				2.486.000,00
red de alcantarillado construidos en Tiribí	km				51,60				8.983.000,00
colectores rehabilitados en María Aguilar	km				13,00				32.293.000,00
colectores construidos en María Aguilar	km				24,10				2.696.000,00
colectores construidos en Tiribí	km				34,80				8.331.000,00
colectores rehabilitados en Tiribí	km				8,60				30.767.000,00
Planta de tratamiento de aguas residuales construida	plantas				1,00				70.000.000,00
Colectores y alcantarillados en las cuencas Rivera y Torres construidos o rehabilitados, conección San Miguel construido	km				111,00				68.292.000,00
Tunel de trasvase construido	tunel				1,00				9.116.000,00
Diseños finales de la amplicacion del sistema de alcantarillado sanitario del AMSJ preparados y la supervision en la fase constructiva de las obras realizada	diseños y supervision				1,00				17.200.000,00
Agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias									
Sistemas de agua potable diseñados incluidos pliegos de licitación aprobados por el BID	sistemas de agua diseñadas incluidos pliegos de licitacion				6,00				100.000,00
Sistemas de agua potable construidos y/o rehabilitados, transferidos y funcionando según especificaciones de diseño	Sistemas de agua potable construidos y/o rehabilitados, transferidos y funcionando				6,00				24.650.000,00
Soluciones individuales de saneamiento construidas por el Programa	Soluciones individuales de saneamiento				500,00				500.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Arreglo institucional para manejo del sistema de La Virgen y Puerto Viejo establecido	Institucion de La Virgen y Puerto Viejo arreglada				1,00				50.000,00
Arreglo institucional para manejo del sistema de Santa Rosa de Pocosol establecido	Institucion de Santa Rosa arreglada				1,00				25.000,00
Capacitación de 25 personas de ASADAS en operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable realizado	Capacitación				2,00				30.000,00
Capacitacion de 24 personas de ASADAS en administración financiera, comercial y contable de los sistemas de agua potable realizado	Capacitación				2,00				30.000,00
Número de computadores con software instaladas en las ASADAS	computadores con software instaladas				8,00				75.000,00
Sistema de información geográfica para la oficina regional del AyA diseñado y en funcionamiento	Sistema de información geográfica diseñada y en funcionamiento				1,00				50.000,00
Estudios hidrogeológicos concluidos	Estudios hidro geológicos				1,00				500.000,00
Número de actividades de capacitación en educación sanitaria realizadas en las comunidades rurales beneficiadas	actividades de capacitación en educación sanitaria				30,00				40.000,00
Número de actividades de capacitación sobre el uso y conservación del agua realizadas en las comunidades rurales beneficiadas	actividades de capacitación sobre el uso y conservación del agua				6,00				10.000,00
Número de capacitaciones en entidades educativas en zonas rurales sobre educación sanitaria/ambiental y uso y conservación del agua realizados	capacitaciones en entidades educativas en zonas rurales				30,00				40.000,00
Agua potable y saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José									
Proyectos de agua potable y/o alcantarillado diseñados	Proyectos diseñados				10,00				1.764.837,00
Redes de agua potable construidos o rehabilitados	km				73,20				9.160.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

CR-L1024 - Water and Sanitation Program
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 13/04/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Redes de alcantarillado construidos o rehabilitados	km				14,80				2.605.631,00
Campañas de educación ambiental y sanitaria en 10 barrios peri-urbanos del proyecto realizadas	campañas				20,00				200.000,00
Estudios de factibilidad ambiental, social, económico, técnico y financiera preparados	estudios				10,00				269.532,00
Administración del programa									
Costos financieros									
Otros costos									
TOTAL									294.663.000,00
