




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
Sector:	WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número(s) de Préstamo:	2493/OC-CR	Monto Aprobado Actual: 73.000.000,00	BID Original: 73.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 73.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 23,00
Operación(es) Relacionada(s):	CR-T1034, CR-X1009, CR-P1056, RG-P1400	Saldo: 73.000.000,00	Co-financiamiento/País: 247.100.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 320.100.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 19-abr-2012 Validado por Representante de País: 30-abr-2012

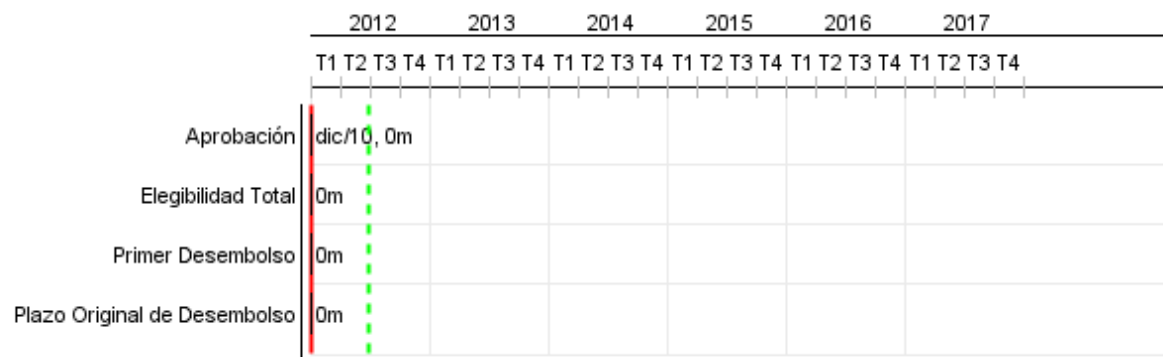

Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José mejorado
Observaciones:	Verificación por encuesta permanente de hogares

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Hogares con acceso a saneamiento en la subcuenca María Aguilar	Hogares	22,284.00	2011	P A		24,522.00	28,998.00	33,474.00	37,950.00	42,426.00	42,426.00
Hogares con acceso a saneamiento en la subcuenca Tiribí	Hogares	67,356.00	2011	P A		76,308.00	94,212.00	112,116.00	130,020.00	147,925.00	147,925.00
Caudal de aguas residuales tratadas (caudal diario promedio)	m3/sec		2011	P A						2.80	2.80
Hogares con acceso a saneamiento en las cuencas Rivera y Torres	Hogares	61,111.00	2011	P A		80,000.00	98,889.00	117,778.00	136,667.00	155,556.00	155,556.00
Caudal de aguas residuales transportado por el tunel de travesé	m3/sec		2011	P A						1.20	1.20

Resultado:	Sistemas de agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias mejorados
Observaciones:	Medida de verificación por el sistema de facturación de la ASADA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Hogares con acceso al sistema de agua construido/rehabilitado por el Programa	Households		2011	P A		1,683.00	3,361.00	3,361.00	1,692.00		10,097.00
Sistemas con plan de mantenimiento rutinario en ejecución	sistema		2011	P A				3.00	3.00		6.00
Sistemas rehabilitados o nuevos con ingresos superiores a los costos de administración, operación y mantenimiento	sistema		2011	P A		1.00	2.00	2.00			5.00
Hogares con acceso a soluciones individuales de saneamiento construido / rehabilitado por el Programa	Houesholds		2011	P A				250.00	250.00		500.00

Resultado:	Sistemas de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José mejorados
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Población con acceso a agua potable financiado con el Programa	Households		2011	P A			13,179.00	15,815.00			28,994.00
Población con acceso a saneamiento financiado con el Programa	Houesholds		2011	P A			4,513.00				4,513.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José									
red de alcantarillado rehabilitada en María Aguilar	km				13,40				2.372.000,00
red de alcantarillado rehabilitada en Tiribí	km				10,00				2.027.000,00
red de alcantarillado construida en María Aguilar	km				14,40				2.486.000,00
red de alcantarillado construida en Tiribí	km				51,60				8.983.000,00
colectores rehabilitados en María Aguilar	km				13,00				32.293.000,00
colectores construidos en María Aguilar	km				24,10				2.696.000,00
colectores construidos en Tiribí	km				34,80				8.331.000,00
colectores rehabilitados en Tiribí	km				8,60				30.767.000,00
Planta de tratamiento de aguas residuales construida	planta				1,00				70.000.000,00
Colectores y red de alcantarillado en las cuencas Rivera y Torres construidos o rehabilitados	km				111,00				68.292.000,00
Tunel de trasvase construido	tunel				1,00				9.116.000,00
Diseño final de la aplicación del sistema de alcantarillado sanitario del AMSJ preparado	diseño				1,00				3.000.000,00
Construcción de la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del AMSJ supervisada	supervisión				1,00				14.200.000,00
Agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias									
Sistema de agua potable diseñado	diseño				6,00				100.000,00
Sistema de agua potable construido y/o rehabilitado por el Programa	sistema				6,00				24.650.000,00
Solución individual de saneamiento construida por el Programa	solución				500,00				500.000,00
Institución para el manejo de los sistemas de La Virgen y Puerto Viejo arreglada	institución				1,00				50.000,00
Institución para el manejo del sistema de Santa Rosa de Pocosal arreglada	institución				1,00				25.000,00
Capacitación de 25 personas de ASADAS en operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable realizado	capacitación				2,00				30.000,00
Capacitación de 24 personas de ASADAS en administración financiera, comercial y contable de los sistemas de agua potable realizado	capacitación				2,00				30.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CR-L1024 - Programa de Agua Potable y Saneamiento
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 19/04/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Computadora con software instalado en las ASADAS	computadora				8,00				75.000,00
Sistema de información geográfica (SIG) para la oficina regional del AyA instalado	sistema				1,00				50.000,00
Estudio hidrogeológico preparado	estudio				1,00				500.000,00
Capacitación en educación sanitaria realizada en las comunidades rurales beneficiadas	capacitación				30,00				40.000,00
Capacitación sobre el uso y conservación del agua realizadas en las comunidades rurales beneficiadas	capacitación				6,00				10.000,00
Capacitación en entidades educativas en zonas rurales sobre educación sanitaria/ambiental y uso y conservación del agua realizados	capacitación				30,00				40.000,00
Agua potable y saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José									
Sistema de agua potable y/o alcantarillado diseñado	diseño				10,00				1.764.837,00
Red de agua potable construida o rehabilitada	km				73,20				9.160.000,00
Red de alcantarillado construido o rehabilitado	km				14,80				2.605.631,00
Campaña de educación ambiental y sanitaria en 10 barrios peri-urbanos del proyecto realizada	campana				20,00				200.000,00
Estudio de factibilidad (aspectos ambientales, sociales, económicos, técnicos y financieros) preparado	estudio				10,00				269.532,00
Administración del programa									
Costos financieros									
Otros costos									
TOTAL									294.663.000,00
