
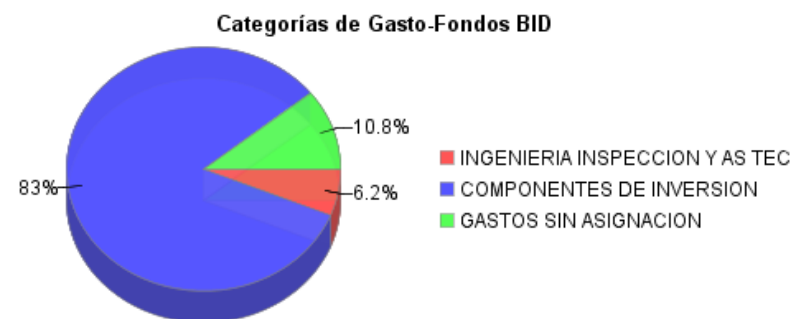
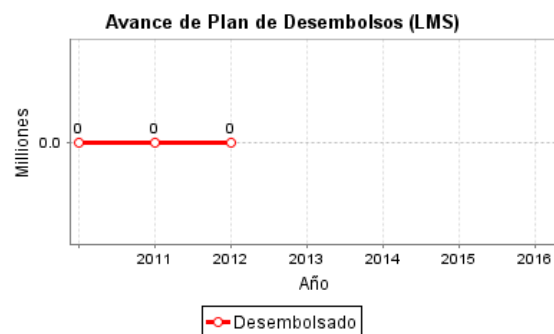


Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	C.V.G. ELECTRIFICACION DEL CARONI, S.A. (EDELCA)				
Sector:	ENERGY-NEW HYDROPOWER PROJECTS				
Número(s) de Préstamo:	2429/OC-VE	Monto Aprobado Actual:	700.000.000,00	BID Original:	700.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	700.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	53,00
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1400	Saldo:	700.000.000,00	Co-financiamiento/País:	609.771.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	1.309.771.000,00
					00
				Período de Amortización (meses):	162


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012 Validado por Representante de País: 28-sep-2012

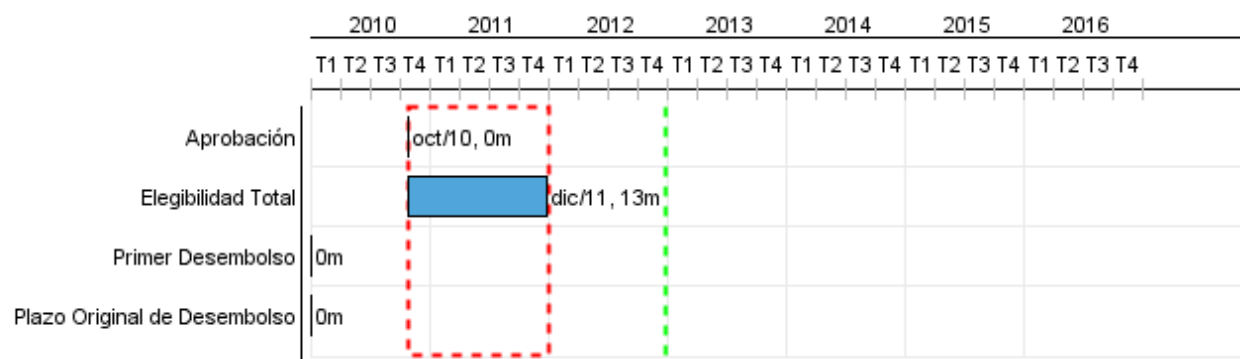

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1033 - Rehabilitación de Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 Central Simón
Bolívar
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Progreso Acumulado al 2012

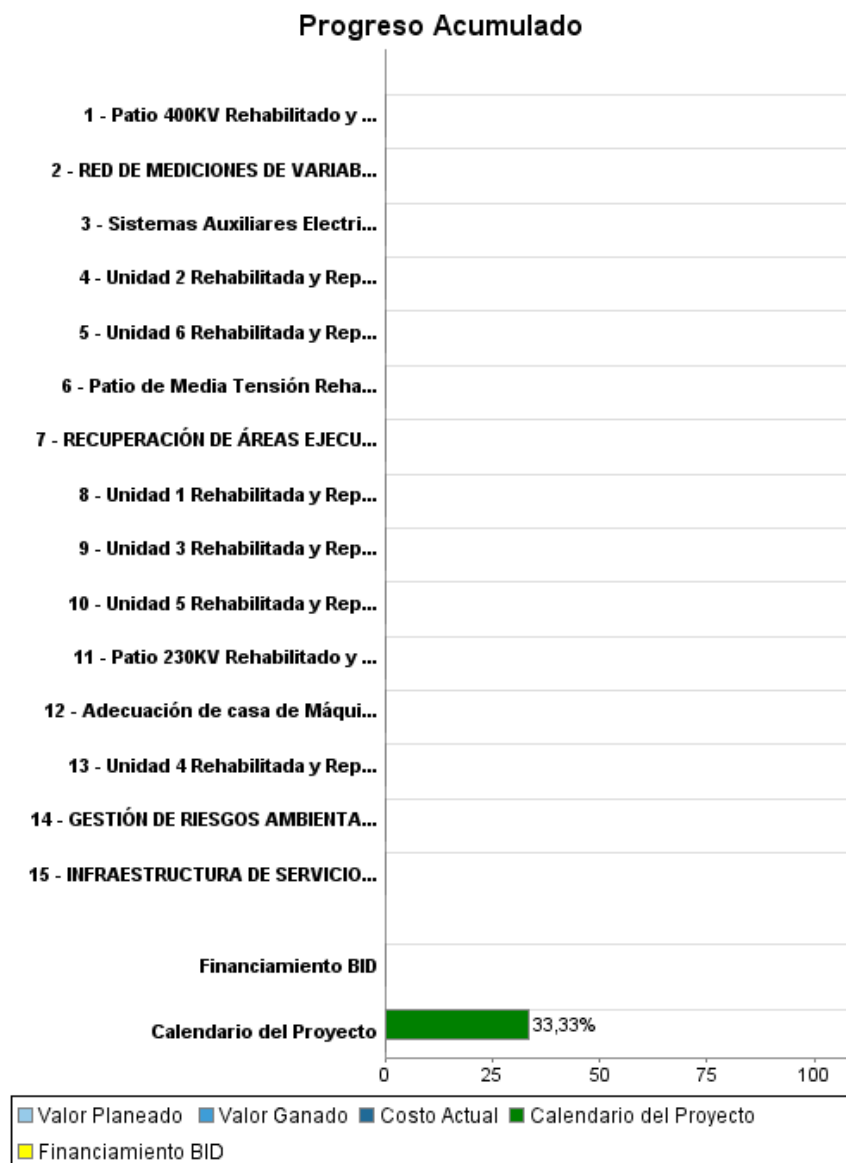

Resultados

Resultado:	capacidad de generación con recursos renovables incrementada
Observaciones:	Se ajustarán las metas de los indicadores de acuerdo a los resultados de la reprogramación del PEP/POA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Capacidad Instalada Nominal en Unidades 1 a 6	MW	1,215.00	2008	P A		1,480.00	1,745.00	2,010.00	2,010.00
Capacidad Instalada Unidad 1	MW	185.00	2011	P A				270.00	270.00
Capacidad Instalada Unidad 2	MW	185.00	2011	P A			270.00		270.00
Capacidad Instalada Unidad 3	MW	185.00	2011	P A		270.00			270.00
Capacidad Instalada Unidad 4	MW	220.00	2011	P A			400.00		400.00
Capacidad Instalada Unidad 5	MW	220.00	2011	P A				400.00	400.00
Capacidad Instalada Unidad 6	MW	220.00	2011	P A				400.00	400.00

Resultado:	aporte de energía del Bajo Caroní al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aumentado
Observaciones:	Las metas de los indicadores se ajustaran de acuerdo a la revision del histograma de energia.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Energía media entregada anualmente al SEN	GWh	8,940.00	2008	P A	9,048.00	11,315.00	13,582.00	15,849.00	15,849.00
Energía Unidad 1	GWh	1,378.00	2011	P A				2,129.00	2,129.00
Energía Unidad 2	GWh	1,378.00	2011	P A			2,129.00		2,129.00
Energía Unidad 3	GWh	1,378.00	2011	P A		2,129.00			2,129.00
Energía Unidad 4	GWh	1,638.00	2011	P A		3,154.00			3,154.00
Energía Unidad 5	GWh	1,638.00	2011	P A			3,154.00		3,154.00
Energía Unidad 6	GWh	1,638.00	2011	P A				3,154.00	3,154.00

Resultado:	disponibilidad de las unidades generadoras 1 a 6 aumentada
Observaciones:	Revisar el valor de linea base en funcion de la disponibilidad real

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1033 - Rehabilitación de Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 Central Simón
Bolívar
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2012

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Disponibilidad de las unidades generadoras 1 a 6	%	85.00	2008	P A		86.67	88.33	90.00	90.00
Disponibilidad Unidad 1	%	85.00	2011	P A				90.00	90.00
Disponibilidad Unidad 2	%	85.00	2011	P A			90.00		90.00
Disponibilidad Unidad 3	%	85.00	2011	P A		90.00			90.00
Disponibilidad Unidad 4	%	85.00	2011	P A		90.00			90.00
Disponibilidad Unidad 5	%	85.00	2011	P A			90.00		90.00
Disponibilidad Unidad 6	%	85.00	2011	P A				90.00	90.00

Resultado:	Eficiencia de las Unidades aumentada
Observaciones:	Revisar periodo del línea base para todos los indicadores de resultados (2008 o 2011)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Eficiencia de las Unidades generadoras 1 a 6	%	84.00	2008	P A				95.00	95.00
Aumentar la Eficiencia de la Unidad 1	%	84.00	2011	P A				95.00	95.00
Aumentar la Eficiencia de la Unidad 2	%	84.00	2011	P A			95.00		95.00
Aumentar la Eficiencia de la Unidad 3	%	84.00	2011	P A		95.00			95.00
Aumentar la Eficiencia de la Unidad 4	%	84.00	2011	P A		95.00			95.00
Aumentar la Eficiencia de la Unidad 5	%	84.00	2011	P A			95.00		95.00
Aumentar la Eficiencia de la Unidad 6	%	84.00	2011	P A				95.00	95.00

Resultado:	Indisponibilidad por mantenimiento reducida
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Frecuencia de mantenimientos mayores	Años	2.00	2008	P A				5.00	5.00
Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 1	Años	2.00	2011	P A				5.00	5.00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1033 - Rehabilitación de Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 Central Simón
Bolívar
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2012

Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 2	Años	2.00	2011	P			5.00		5.00
				A					
Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 3	Años	2.00	2011	P		5.00			5.00
				A					
Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 4	Años	2.00	2011	P		5.00			5.00
				A					
Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 5	Años	2.00	2011	P			5.00		5.00
				A					
Frecuencia de Mantenimientos Mayores Unidad 6	Años	2.00	2011	P				5.00	5.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores	Días	60.00	2011	P				45.00	45.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 1	Días	60.00	2011	P				45.00	45.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 2	Días	60.00	2011	P			45.00		45.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 3	Días	60.00	2011	P		45.00			45.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 4	Días	60.00	2011	P		45.00			45.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 5	Días	60.00	2011	P			45.00		45.00
				A					
Duración de Mantenimientos Mayores Unidad 6	Días	60.00	2011	P				45.00	45.00
				A					

Resultado: vida útil de las unidades generadoras 1 a 6 extendida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Vida útil teórica remanente promedio de las unidades 1 a 6	Años		2008	P				25.00	25.00
				A					
Vida Útil Teórica Unidad 1	Años		2011	P				25.00	25.00
				A					
Vida Útil Teórica Unidad 2	Años		2011	P			25.00		25.00
				A					
Vida Útil Teórica Unidad 3	Años		2011	P		25.00			25.00
				A					
Vida Útil Teórica Unidad 4	Años		2011	P		25.00			25.00
				A					
Vida Útil Teórica Unidad 5	Años		2011	P			25.00		25.00
				A					
Vida Útil Teórica Unidad 6	Años		2011	P				25.00	25.00
				A					

Resultado: Gestión del recurso hidrológico ampliada con la incorporación de conocimiento y herramientas técnicas para la consideración de potenciales impactos de cambio climático

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1033 - Rehabilitación de Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 Central Simón Bolívar
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2012

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Identificación y valoración del impacto en el régimen hidrológico de la cuenca del Caroní (estudios y modelación completados sobre variables como caudales, recurrencias, tendencias)	%	50.00	2010	P A		100.00			100.00

Resultado: Confiabilidad de información de variables ambientales para el fortalecimiento del sistema de generación hidroeléctrica aumentada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Asertividad de Pronósticos temporada de sequía	%	90.00	2010	P A					98.00
Asertividad de Pronósticos temporada de lluvia	%	80.00	2010	P A					90.00

Resultado: Vulnerabilidad ambiental para la operatividad de la Central Simón Bolívar reducida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Efectividad de Atención a Emergencias y Contingencias Ambientales	%		2010	P A					70.00
Adecuación ambiental de las operaciones de la Central	% de Cumplimiento de la Normativa	50.00	2010	P A					100.00

Resultado: Responsabilidad Ambiental y Social asociada a las operaciones de la Central Simón Bolívar fortalecida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Mejoramiento de la imagen corporativa de la Central	Número de visitantes a la Central/año	30,092.00	2010	P A					40,000.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Unidades 1 a 6 y sus Sistemas Auxiliares, Eléctricos y Mecánicos									
Unidad 1 Rehabilitada y Repotenciada	unidad				1,00				40.000.000,00
Unidad 2 Rehabilitada y Repotenciada	unidad				1,00				40.000.000,00
Unidad 3 Rehabilitada y Repotenciada	unidad				1,00				40.000.000,00
Unidad 4 Rehabilitada y Repotenciada	unidad				1,00				53.333.334,00
Unidad 5 Rehabilitada y Repotenciada	unidad				1,00				53.333.333,00
Unidad 6 Rehabilitada y Repotenciada	unidad				1,00				53.333.333,00
Sistemas Auxiliares Electricos y Mecanicos Rehabilitados y Repotenciados	unidad				1,00				370.000.000,00
Patios y Conexiones Rehabilitados y Repotenciados									
Patio de Media Tensión Rehabilitado y Repotenciado	unidad				1,00				8.379.540,00
Patio 230KV Rehabilitado y Repotenciado	unidad				1,00				56.650.420,00
Patio 400KV Rehabilitado y Repotenciado	unidad				1,00				169.970.040,00
Arquitectura, Sistemas Auxiliares, Eléctricos y Mecánicos Comunes									
Adecuación de casa de Máquinas 1 completada	unidad				1,00				38.384.000,00
Componente Ambiental									
RED DE MEDICIONES DE VARIABLES AMBIENTALES HIDROMETEOROLÓGICAS Y LIMNOLÓGICAS FORTALECIDA	Red de Medición				1,00				4.100.000,00
GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES OPERACIONALES FORTALECIDA	Gestión de Riesgo				1,00				6.180.000,00
RECUPERACIÓN DE ÁREAS EJECUTADA	Área				1,00				2.250.000,00
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EJECUTADA	Módulo				1,00				4.000.000,00
Ingeniería, Inspección y Asesoría Técnica									
Ingeniería e Inspección	N/A								70.250.000,00
Administración	N/A								46.154.000,00
Auditoría Externa	N/A								330.010,00
Evaluación Medio Término y Final, Monitoreo y Evaluación	N/A								120.000,00
Gastos sin Asignación									
Imprevistos	N/A								65.389.000,00
Escalamiento	N/A								61.260.000,00
Costos Financieros									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

VE-L1033 - Rehabilitación de Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 Central Simón
Bolívar
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Costos Financieros	N/A								126.355.000,00
TOTAL									1.309.772.010,00
