
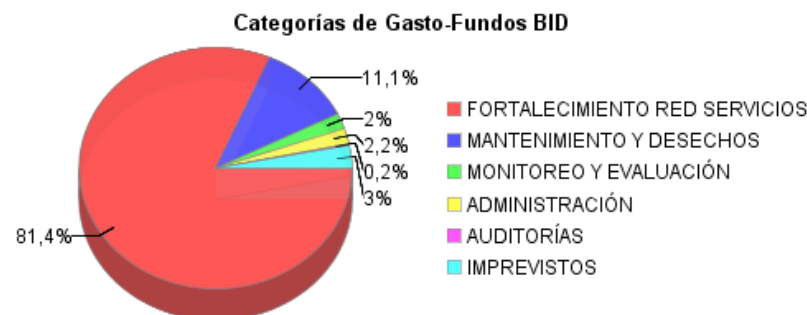
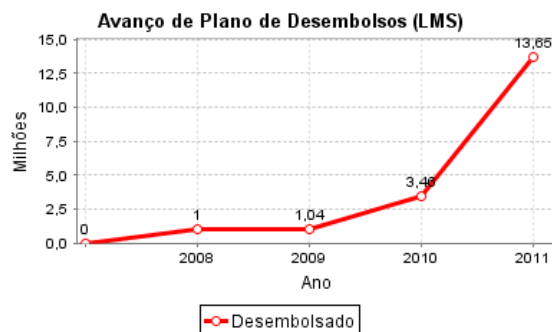



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número da Operação:	1852/OC-GU	Atual:	50.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	9.985.270,80
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	19,97
Operação Relacionada:	GU-T1062, RS-T1352	Saldo:	40.014.729,20
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	50.000.000,00
		Corrente BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	99,00
		Cofinanciamento/País:	274.000,00
		Original Estimado:	50.274.000,00
		Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 22, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011

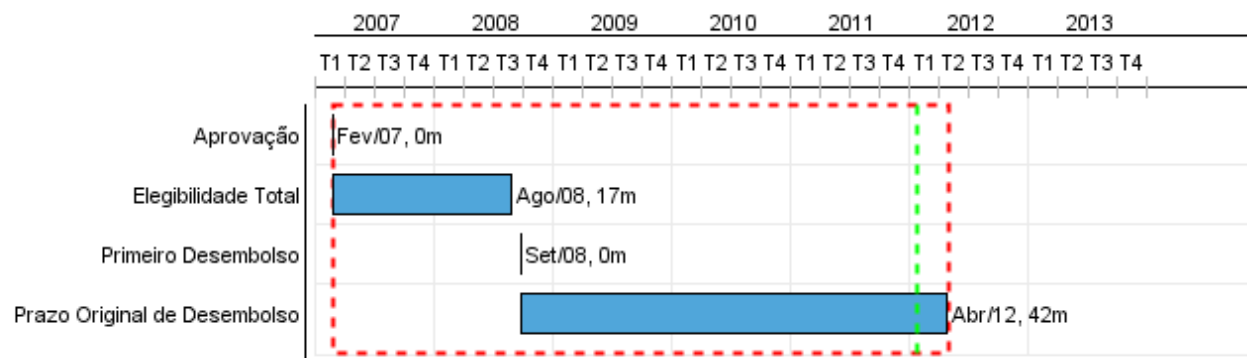

Progresso Acumulado até 2011

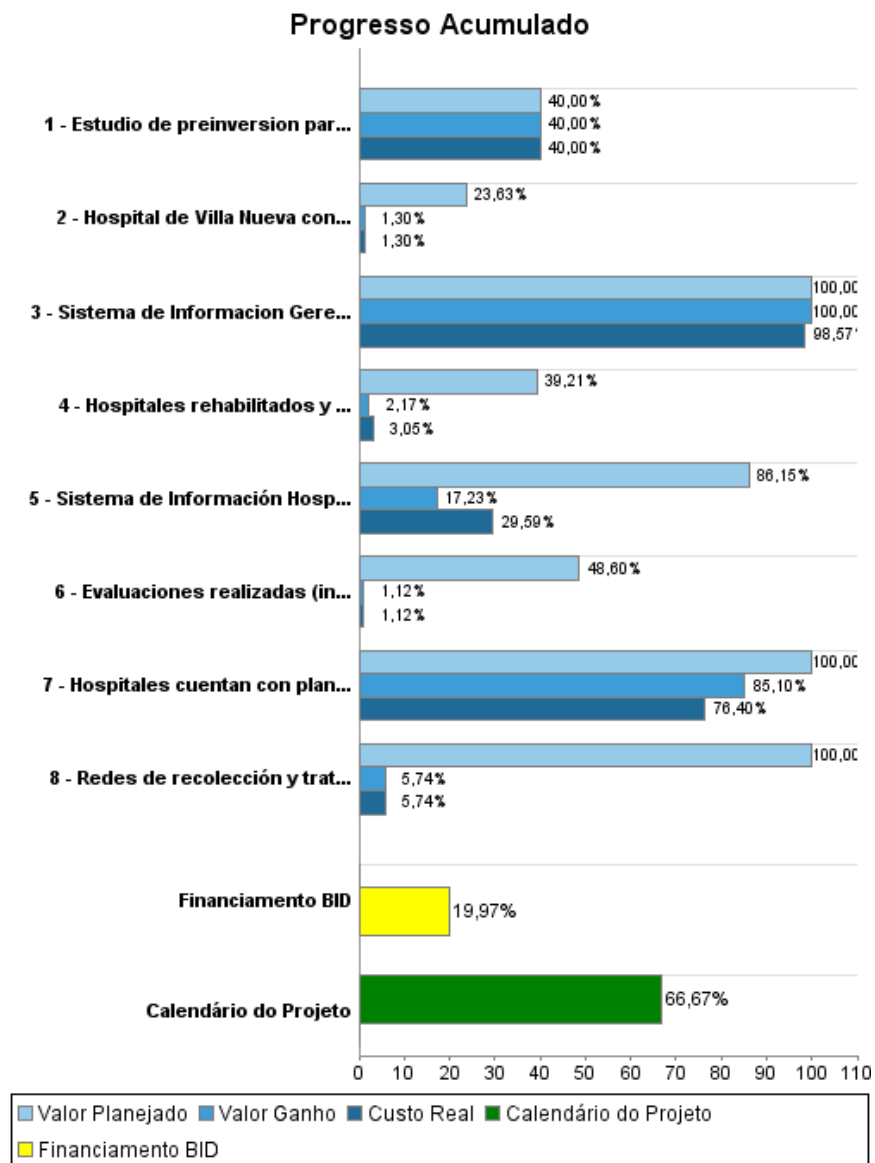

Resultados

Resultado: Red de servicios de salud fortalecidos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Pacientes de procedencia de Mixco y Villa Nueva atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	34,00	2006	P A				20,00
Consultas externas sobre total de atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	36,00	2006	P A				20,00
Volumen total de atención (externa, emergencia, internaciones) en hospitales rehabilitados	Egresos	159.839,00	2008	P A				191.807,00
Deterioro de la red hospitalaria regional y departamental	%	0,58	2006	P A				0,40

Resultado: Mantenimiento y manejo de desechos solidos hospitalarios mejorado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Presupuesto total para mantenimiento de los hospitales rehabilitados	%	1,63	2007	P A		2,00		3,00
Ejecucion del presupuesto anual de mantenimiento	%	100,00	2008	P A	100,00	100,00	100,00	100,00

Resultado: Gestión hospitalaria fortalecida

Observações: Para el caso específico del indicador de Giro Cama GC 2011 (90%), debido a la mejora en la atención de los servicios de salud de los hospitales intervenidos, la atención de partos eutócicos simples se ha trasladado a los servicios del primer y segundo nivel, disminuyendo esta producción en los hospitales y aumentando la atención de partos distócicos que requieren atención quirúrgica. Al aumentar las cirugías aumenta el número de días de ocupación y como consecuencia disminuye el giro cama.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Giro de camas (GC) de los hospitales rehabilitados/GC de los hospitales no intervenidos del mismo nivel	%	94,00	2008	P A		5,00	100,00 90,00	110,00
Cirugías por quirófano (CQ) en los hospitales rehabilitados por el Programa/CQ en los hospitales no intervenidos	%	100,00	2007	P A		5,00	115,00	110,00
Nivel de satisfacción con la atención recibida entre población indígena	%	70,00	2010	P A			95,00	95,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Red hospitalaria fortalecida de acuerdo a estándares de calidad y con capacidad resolutive ampliada.									
Hospital de Villa Nueva construido e instalado el equipo fijo	Mts2 construidos y equipados				15.185,00	2.600.000,00			24.810.632,00
Hospitales rehabilitados y equipados	hospitales	5,00			13,00	3.600.000,00	134.251,00		15.224.000,00
Estudio de preinversion para la construccion del Hospital de Mixco elaborado	Estudio				1,00		166.547,00		416.368,00
Componente 2. Capacidad técnica y financiera del MSPAS fortalecida para la gestión del mantenimiento y manejo de desechos.									
Hospitales cuentan con planes de mantenimiento	planes				13,00	685.075,00	316.962,00		2.471.000,00
Redes de recolección y tratamiento de desechos sólidos hospitalarios	redes	4,00			4,00	2.841.500,00			3.102.000,00
Componente 3. Modelo de gestión hospitalaria desarrollado y extendido a hospitales del Programa (Financiado con la ATN/JO-10292-GU)									
Componente 4. Monitoreo y Evalaución									
Sistema de Informacion Gerencial en Salud (SIGSA) alimentado por los 13 hospitales (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación - SIME)	sistema				1,00				140.000,00
Sistema de Información Hospitalaria (INFHOS) implementado (alimentando a SIME)	sistema	1,00			1,00	200.000,00	40.153,00		325.000,00
Evaluaciones realizadas (incorpora actividades de capacitación y comunicación)	informes	1,00			2,00	250.000,00			535.000,00
Administracion, Auditoria e Imprevistos									
TOTAL						10.176.575,00	657.913,00		47.024.000,00
