
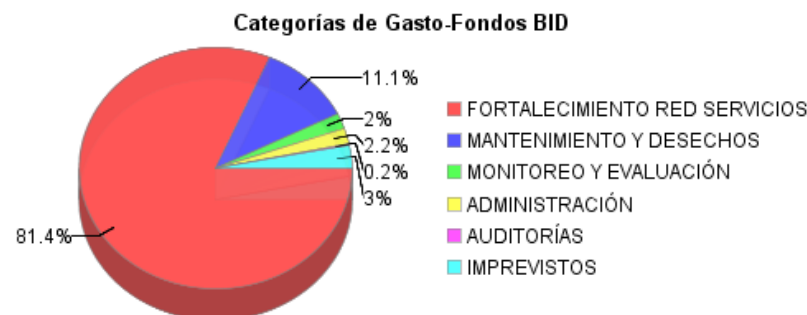
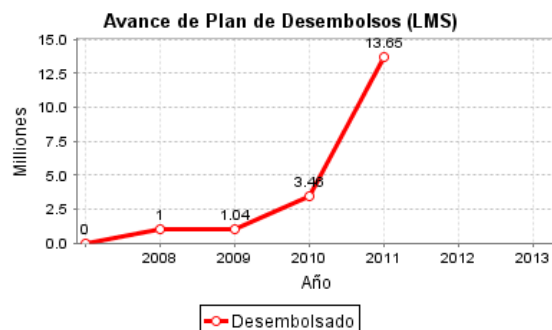



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	1852/OC-GU	Monto Aprobado Actual:	50.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	13.649.628,88
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	27,30
Operación(es) Relacionada(s):	GU-T1062, RS-T1352	Saldo:	36.350.371,12
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	50.000.000,00
		Actual BID:	50.000.000,00
		Pari-passu:	99,00
		Co-financiamiento/País:	274.000,00
		Estimado Original:	50.274.000,00
		Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-mar-2012 Validado por Representante de País: 27-abr-2012

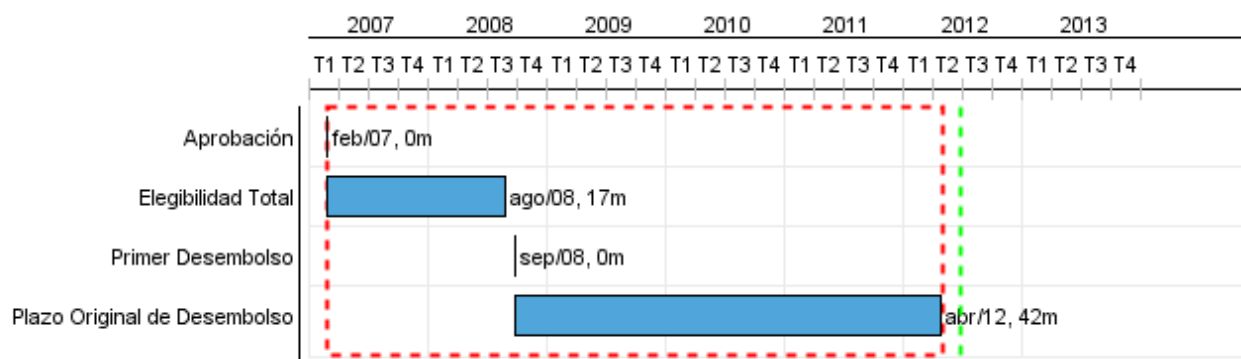

Progreso Acumulado al 2011

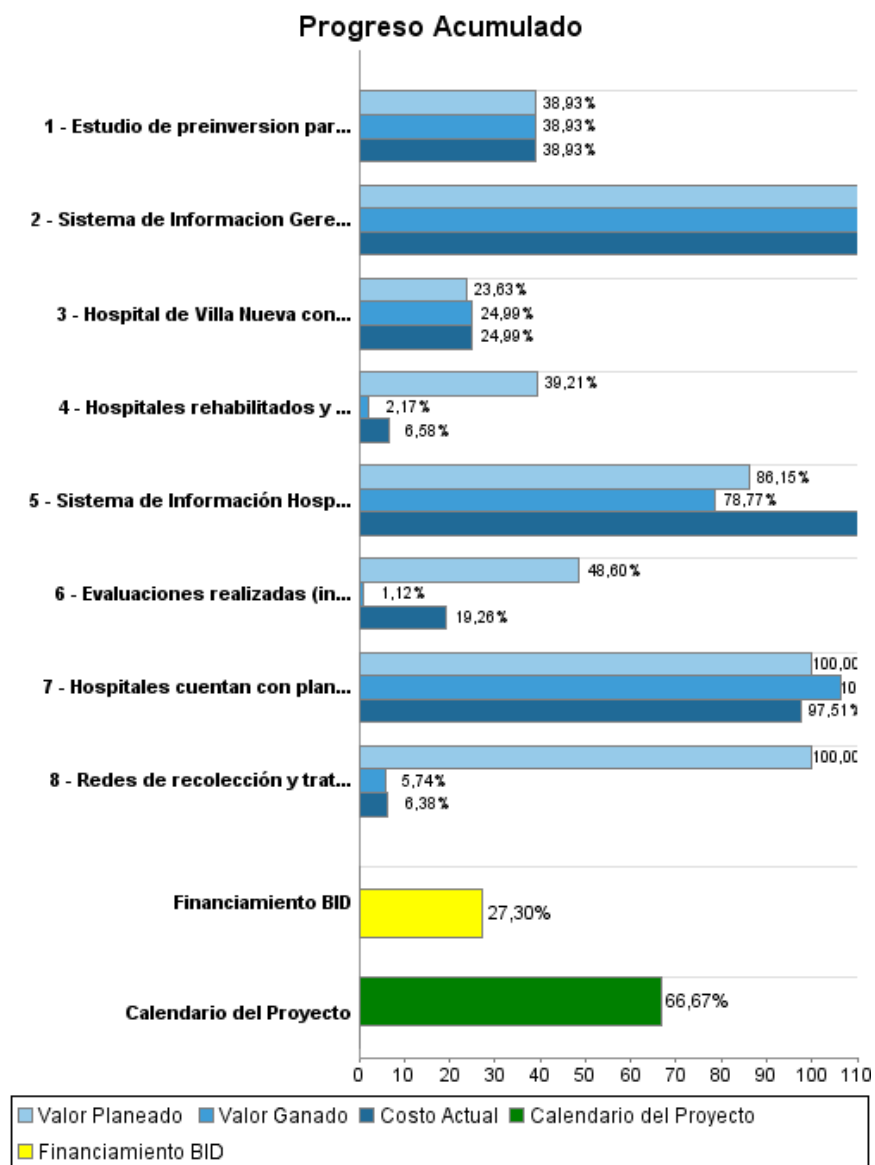

Resultados

Resultado: Red de servicios de salud fortalecidos

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Pacientes de procedencia de Mixco y Villa Nueva atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	34.00	2006	P A				20,00
Consultas externas sobre total de atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	36.00	2006	P A				20,00
Volumen total de atención (externa, emergencia, internaciones) en hospitales rehabilitados	Individuals	159,839.00	2008	P A				191.807,00
Deterioro de la red hospitalaria regional y departamental	%	0.58	2006	P A				0,40

Resultado: Mantenimiento y manejo de desechos solidos hospitalarios mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Presupuesto total para mantenimiento de los hospitales rehabilitados	%	1.63	2007	P A		2.00		3,00
Ejecucion del presupuesto anual de mantenimiento	%	100.00	2008	P A	100.00	100.00	100.00	100,00

Resultado: Gestión hospitalaria fortalecida

Observaciones: Para el caso específico del indicador de Giro Cama GC 2011 (90%), debido a la mejora en la atención de los servicios de salud de los hospitales intervenidos, la atención de partos eutócicos simples se ha trasladado a los servicios del primer y segundo nivel, disminuyendo esta producción en los hospitales y aumentando la atención de partos distócicos que requieren atención quirúrgica. Al aumentar las cirugías aumenta el número de días de ocupación y como consecuencia disminuye el giro cama.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Giro de camas (GC) de los hospitales rehabilitados/GC de los hospitales no intervenidos del mismo nivel	%	94.00	2008	P A		5.00	100.00 90.00	110,00
Cirugías por quirófano (CQ) en los hospitales rehabilitados por el Programa/CQ en los hospitales no intervenidos	%	100.00	2007	P A		5.00	115.00	110,00
Nivel de satisfacción con la atención recibida entre población indígena	%	70.00	2010	P A			95.00	95,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1. Red hospitalaria fortalecida de acuerdo a estándares de calidad y con capacidad resolutive ampliada.									
Hospital de Villa Nueva construido e instalado el equipo fijo	Mts2 construidos y equipados		1.518,00		15.185,00	2.600.000,00	5.877.837,00		24.810.632,00
Hospitales rehabilitados y equipados	hospitales	5,00			13,00	3.600.000,00	671.255,00		15.224.000,00
Estudio de preinversión para la construcción del Hospital de Mixco elaborado	Estudio		1,00		1,00		162.102,00		416.368,00
Componente 2. Capacidad técnica y financiera del MSPAS fortalecida para la gestión del mantenimiento y manejo de desechos.									
Hospitales cuentan con planes de mantenimiento	planes		11,00		13,00	685.075,00	838.436,00		2.471.000,00
Redes de recolección y tratamiento de desechos sólidos hospitalarios	redes	4,00			4,00	2.841.500,00	19.659,00		3.102.000,00
Componente 3. Modelo de gestión hospitalaria desarrollado y extendido a hospitales del Programa (Financiado con la ATN/JO-10292-GU)									
Componente 4. Monitoreo y Evaluación									
Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) alimentado por los 13 hospitales (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación - SIME)	sistema		1,00		1,00		108.000,00		140.000,00
Sistema de Información Hospitalaria (INFHOS) implementado (alimentando a SIME)	sistema	1,00	1,00		1,00	200.000,00	317.102,00		325.000,00
Evaluaciones realizadas (incorpora actividades de capacitación y comunicación)	informes	1,00			2,00	250.000,00	97.053,00		535.000,00
Administración, Auditoría e Imprevistos									
TOTAL						10.176.575,00	8.091.444,00		47.024.000,00
