


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1372	Chief of Operations Validation Date	04/22/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/01/23
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/02/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Integrated Prog for Social Inclusion and Urban Requalification: Fam Paranaense	Loan Number	3129/OC-BR
Executing Agency	ESTADO DO PARANA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	OCHOA, FRANCISCO JOSE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO PARANA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A classificação parcialmente insatisfatória se justifica porque não houve avanços nos aspectos identificados na missão anterior, trazendo riscos de passivos sociais e ambientais ao Programa, tais como: incipiente gestão e monitoramento dos requisitos ambientais e de segurança comunitária em frentes e canteiros de obras, implementação de medidas corretivas aos processos de erosões de solo que requerem soluções construtivas para a conclusão de obras de unidades habitacionais, (iii) melhor engajamento e gestão por parte dos Executores para definição e aquisição de nova área para implantação de 86 (Wenceslau:6, Imbituva: 80) unidades, com vistas à conclusão do reassentamento previsto no Programa. Estes aspectos exigem que o Executor implemente um Plano de Ação para a conclusão a contento das obras e das etapas do reassentamento. Considerando que o Programa possui prazo de encerramento em agosto/2022, será necessário extensão de prazo para serem concluídos dentro do escopo do Programa.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1372	60,000,000	60,000,000	35,866,000	0	95,866,000	60,000,000	58,640,373.46	97.73%	1,359,626.54
Aggregated	60,000,000	60,000,000	35,866,000	0	95,866,000	60,000,000	58,640,373.46	97.73%	1,359,626.54

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

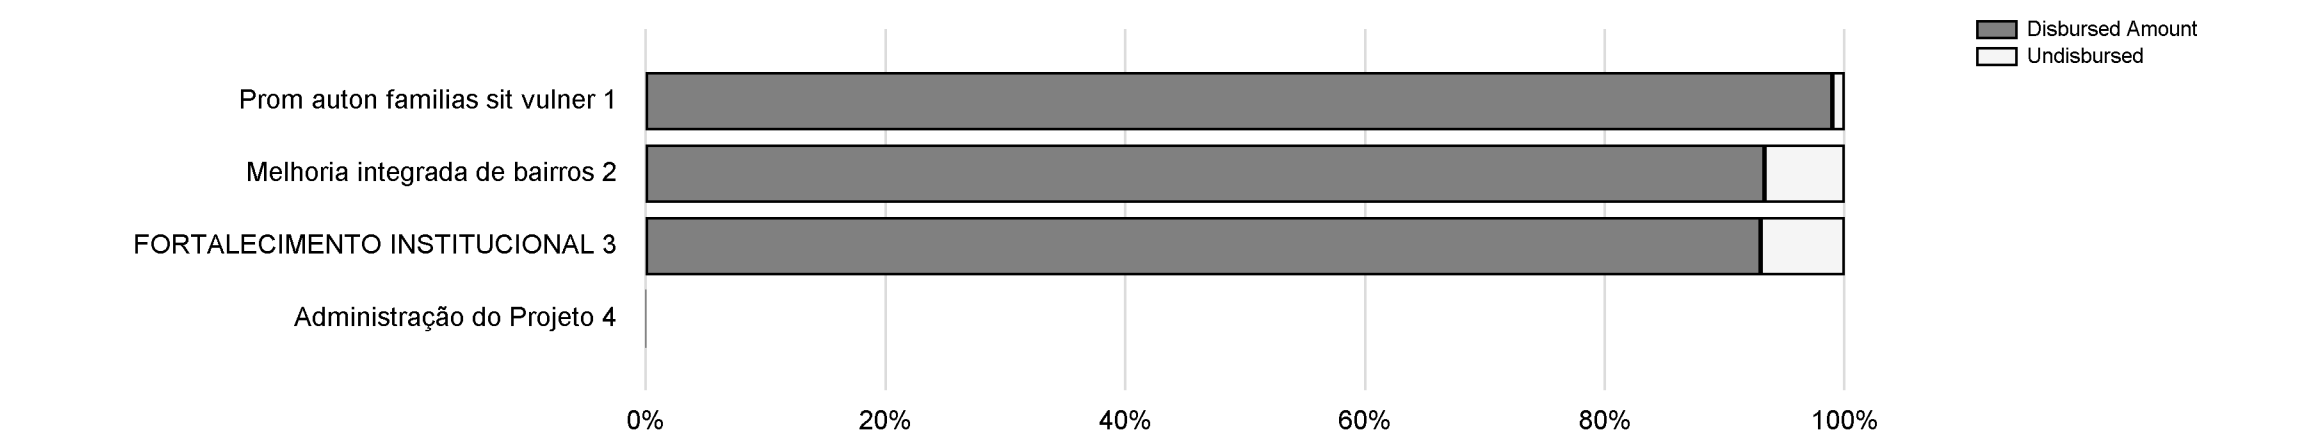

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX							
General Development Objectives							
General Development Objectives Nbr. 0: Condiçao de vida das familias mediante acoes do Governo melhoradas							
Observation:							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Famílias com 24 meses ou mais no programa com acesso e uso de serviços em educação, saúde e documentação civil básica, melhorados	%	30	2016	2023	P	60
						A	-
Details							
Means of Verification: Sistema de informação do Programa							

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Famílias no programa com 24 meses ou mais de acompanhamento, que estão desenvolvendo iniciativas de habilitação social por conta própria			%	53	2016	2023	P	68.9
								A	-
Details									
Means of Verification: Sistema de informação do Programa									

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX										
Specific Development Objectives										
Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 1: Autonomia das Familias vulneraveis melhorado										
Observation:										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Familias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas	%	0	2014	P	-	-	-	-	60
					A	-	-	-	99.69	-
Details										
Means of Verification: Sistema de informação do Programa										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda	%	0	2014	P	-	-	-	-	60
					A	-	-	-	66.97	-
Details										
Means of Verification: Sistema de informação do Programa										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.2	Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento	%	0	2014	P	-	-	-	-	50
					A	-	-	-	62.09	-
Details										
Means of Verification: Sistema de informação do Programa										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						
Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados										
Observation:										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Familias atendidas pelo subcomponente 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes	%	30	2014	P	-	-	-	-	100
					A	-	-	-	76.24	-
Details										
Means of Verification: Relatorio semestral do Programa										
Observations:										
Evaluation Methodology: -										
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.1	Famílias atendidas pelo subcomponente 2.1 com acesso a água potável no domicílio	%	50	2014	P	-	-	-	-	100
					A	-	-	-	76.24	-

Details

Means of Verification: Relatório semestral do Programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 0: Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Participantes da capacitação sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento	%	0	2014	P	-	-	-	-	90
					A	-	-	-	81.77	-

Details

Means of Verification: Testes de conhecimento

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	# of beneficiaries	P	-	22,000	-	14,410,366
			P (a)	-	23,735	-	10,084,484.29
			A	-	23,735	-	10,084,484.29
1.02	Incentivos fundo a fundo para ações da assistência social nos municípios	municípios	P	-	130	-	8,774,200
			P (a)	-	130	-	11,074,356.77
			A	-	156	-	11,074,356.77
1.03	Transferências do Piso Paranaense de Assistência Social	Transferências	P	-	53	-	10,781,000
			P (a)	-	53	-	9,889,482.4
			A	-	122	-	9,889,482.4
1.04	Famílias beneficiadas pelo "Renda Família Paranaense"	famílias	P	-	40,000	-	10,000,000
			P (a)	-	40,000	-	14,859,817.61
			A	1,516	50,315	68,713.86	14,859,817.61
1.05	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	# of beneficiaries	P	-	3,480	-	2,522,478
			P (a)	882	3,947	156,877.47	769,349.45
			A	1,349	3,947	220,138.11	769,349.45
1.06	Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P	-	5,600	-	7,256,760
			P (a)	-	6,294	135,855.25	5,159,626.18
			A	-	6,294	306,420.66	5,159,626.18
1.07	Familias participantes de novos projetos de inclusao socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Familias	P	-	560	-	2,522,154
			P (a)	290	556	230,800	417,717.43
			A	286	556	208,008.69	417,717.43
1.08	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	# of beneficiaries	P	-	-	-	-
			P (a)	60,004	151,487	3,069,137.53	5,133,880.02
			A	61,491	151,487	3,703,017.55	5,133,880.02
1.09	Incentivos fundo a fundo emergencial aos municípios (por COVID-19)	municípios	P	-	-	-	-
			P (a)	-	242	-	1,985,175.83
			A	-	242	-	1,985,175.83
1.10	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	capacitações	P	-	-	-	-
			P (a)	3,500	2,645	622,529.64	431,627.35
			A	2,645	2,645	431,627.35	431,627.35

Component Nbr. 2 Componente II: Melhoria Integrada de Bairros

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P	-	594	-	17,940,000
			P (a)	71	917	1,082,814.2	14,310,706.32
			A	-	846	1,153,855.76	14,230,706.32
2.02	Lotes regularizados	Lotes	P	-	328	-	6,560,000
			P (a)	84	535	1,881,760.08	14,142,884.84
			A	120	381	1,658,999.45	12,882,636.96
2.03	CRAS construídos e em funcionamento	CRAS	P	-	22	-	6,361,544
			P (a)	9	22	513,495.99	3,703,498.83
			A	9	22	545,743.11	3,679,498.83
2.04	CREAS construídos e em funcionamento	CREAS	P	-	8	-	3,238,498
			P (a)	2	8	245,382.03	1,713,910.01
			A	2	8	249,112.82	1,707,910.01

Component Nbr. 3 Componente III: Fortalecimento Institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Investigações e estudos realizados	Estudos	P	-	7	-	1,620,000
			P (a)	1	7	62,791	366,788.03
			A	1	7	41,541.93	347,581.65
3.02	Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P	-	12,300	-	2,113,000
			P (a)	2,500	11,000	237,297.09	1,837,521.8
			A	2,299	10,281	161,933.73	1,694,711.8
3.03	Módulos do Sistema de informações Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P	-	6	-	900,000
			P (a)	1	7	259,000	588,750.64
			A	1	7	249,484.52	579,250.64

Component Nbr. 4 Componente IV: Administração do Projeto

				FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP
4.00			P	-
			P (a)	-
			A	-

Other Cost				
	Administração	P		4,000,000
		P (a)		0
		A	0	0
	Contingencia	P		1,000,000
		P (a)		0
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	100,000,000
		P (a)	8,497,740.28	96,469,577.8
		A	8,998,597.54	94,927,813.54

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	CREAS construidos e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/24/2023
	Famílias beneficiadas por transferência de renda emergencial (por COVID-19)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	3/17/2023
	Famílias com casas novas recebidas	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	3/24/2023
	Famílias participantes de novos projetos de inclusao socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	3/24/2023
	Investigações e estudos realizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/24/2023
	Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/24/2023
	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	3/27/2023
	Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas em 243 municípios (Por COVID 19)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KATIAS	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	KATIAS	3/27/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	1	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Inactive		Technical Design		
	Response Actions				
	5	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	6	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
