
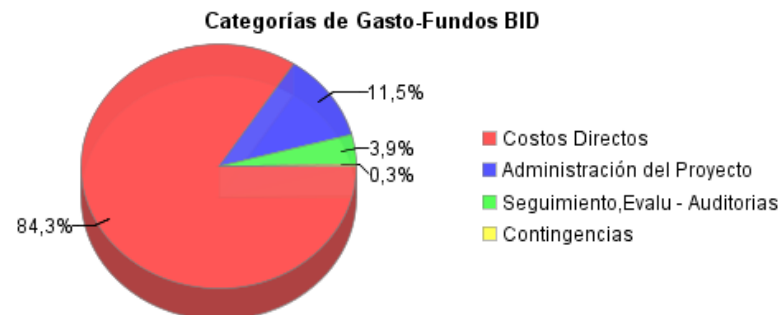
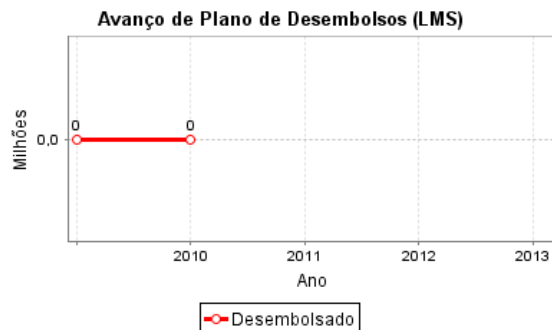



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Empresa Misticuni		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS		
Número da Operação: 2241/BL-BO	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada: RG-P1400	Saldo: 5.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 5.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

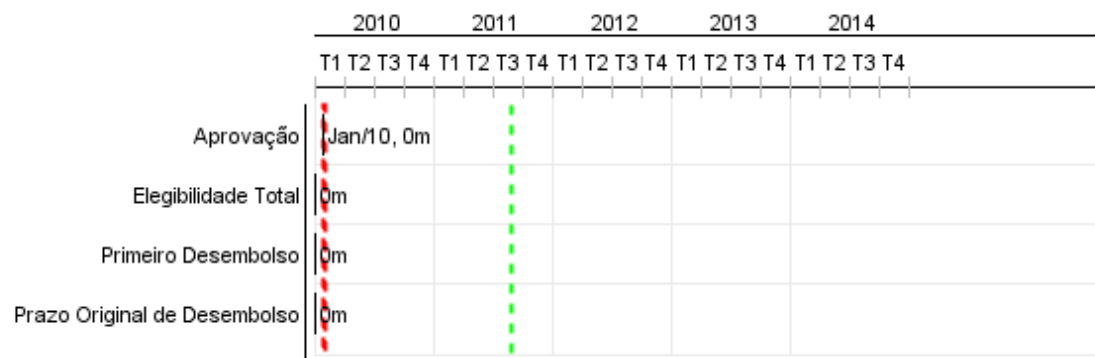

Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: Cuenca de Misicuni conservada y protegida

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	Final do Projeto
Area de la cuenca con medidas de conservación de suelos y regulación del agua de escorrentía aplicadas	Porcentaje		2010	P A	7,50	15,00	15,00

Resultado: Cuenca manejada sosteniblemente

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	Final do Projeto
Comunidades que cuentan con proyectos económicos piloto con conservación de suelos y aguas en 50 % de las áreas productivas	Comunidades		2010	P A	2,00	8,00	8,00
Hogares que han incorporado nuevas actividades productivas	%		2010	P A	5,00	10,00	10,00

Resultado: Agricultores con acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	Final do Projeto
Indígenas con acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	Persona		2010	P A	700,00		1.400,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Obras de conservación y protección de la cuenca									
Cárcavas estabilizadas	ha				358,00				285.711,00
Taludes de cárcavas estabilizadas	ha				28,00				653.906,00
Áreas degradadas intervenidas	ha				115,00				182.000,00
Obras de control hidráulico para el manejo de agua de escorrentía	ha				73,30				346.002,00
Obras de protección de hábitats prioritarios									
Plantaciones con especies nativas en zonas de alta pendiente	ha				100,00				150.000,00
Medidas de conservación de suelos y aguas									
Medidas de conservación de suelos y aguas aplicadas	ha				145,00				900.000,00
Recuperación de bofedales									
Bofedales recuperados	bofedal				2,00				760.000,00
Pesca y piscicultura									
Proyectos piloto de pesca y piscicultura en operación	proyecto				2,00				290.000,00
Carpas solares									
Proyectos piloto de producción de hortalizas en carpas solares en operación	proyecto				3,00				645.000,00
Apoyo institucional a la Empresa Misicuni para la ejecución del Programa									
Auditoría externa, monitoreo y evaluación									
Sistema de M&E implementado y operando	sistema				1,00				157.000,00
Imprevistos									
TOTAL									4.369.619,00
