


Progrès Cumulé à 2011

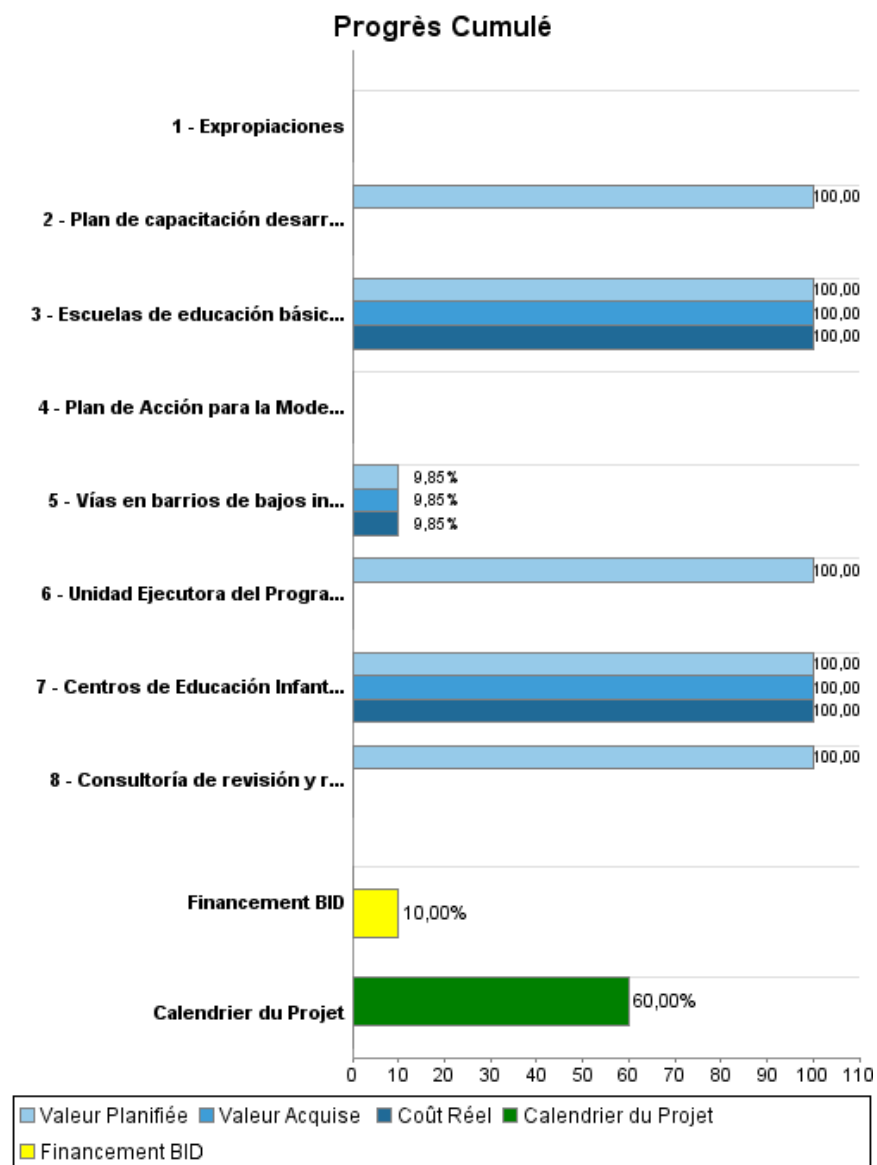

Résultats

Résultat:	Mobilidad del municipio de Ponta Grossa mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de viaje de autobuses que circulan en los tramos pavimentados	Minutos/viaje	40,00	2007	P A	38,00

Résultat:	Red de infraestructura escolar basica (tanto educación fundamental como educación infantil) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Alumnos de educación básica beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar	Estudiantes		2007	P A	10.420,00
Alumnos de educación infantil beneficiados con las mejoras de infraestructura escolar	Estudiantes	3.285,00	2007	P A	3.876,00

Résultat:	Eficiencia de la gestión municipal de Ponta Grossa mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo medio de los procesos de licitación de la Prefeitura	Dias	65,00	2007	P A	50,00
Media de procesos de licitación de la Prefeitura realizados por año	Procesos por año	840,00	2007	P A	798,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Educación									
Escuelas de educación básica remodeladas	Escuela	26,00	26,00		26,00	5.330.000,00	5.330.000,00		5.330.000,00
Centros de Educación Infantil (CEMEIs) remodelados	Students	5,00	5,00		5,00	1.065.000,00	1.065.000,00		1.065.000,00
Mobilidad y Transporte									
Vías en barrios de bajos ingresos pavimentadas	Kilometers				35,00	750.000,00	750.000,00		7.612.500,00
Fortalecimiento Institucional									
Consultoría de revisión y racionalización de procesos y procedimientos de la PMPG realizada	Consultoría	1,00			1,00	105.000,00			105.000,00
Unidad Ejecutora del Programa dotada con equipos de computación	Unidad Ejecutora	1,00			1,00	157.000,00			157.000,00
Plan de Acción para la Modernización del Catastro Inmobiliario elaborado	Plan				1,00				210.000,00
Plan de capacitación desarrollado	Plan				1,00	52.500,00			52.500,00
Otros									
Expropiaciones	No aplica								6.000,00
TOTAL						7.459.500,00	7.145.000,00		14.538.000,00
