
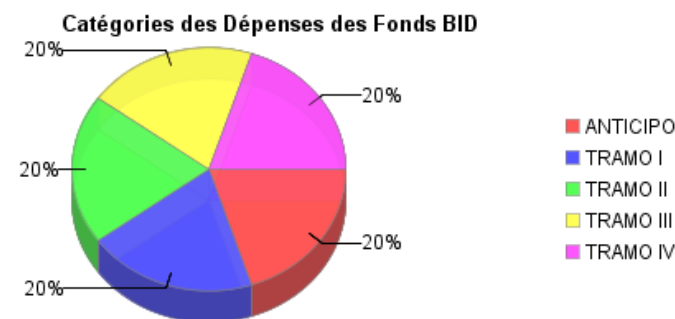
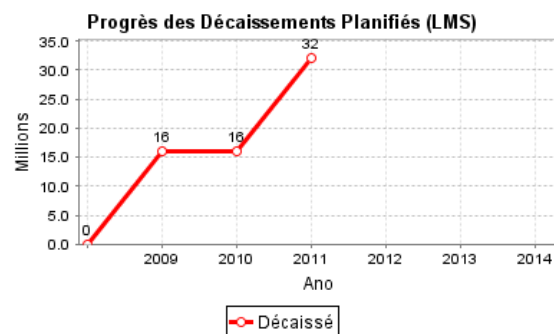



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES				
Numéro(s) de Prêt(s):	1952/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	80.000.000,00	Initial BID:	80.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	32.000.000,00	Courant BID:	80.000.000,00
Type d' Opération:	PDL - Performance Driven Loan	% Décaissé:	40,00	Pari Passu:	80,00
Opération(s) Connexe(s):	CH-L1018, CH-L1025, CH-L1026, CH-X1001, CH-L1033	Solde:	48.000.000,00	Cofinancement/Pays:	20.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PDL - Performance Driven Loan			Estimation Initiale:	100.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	48

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 17-abr-2012
		Validé par le Représentant: 27-abr-2012

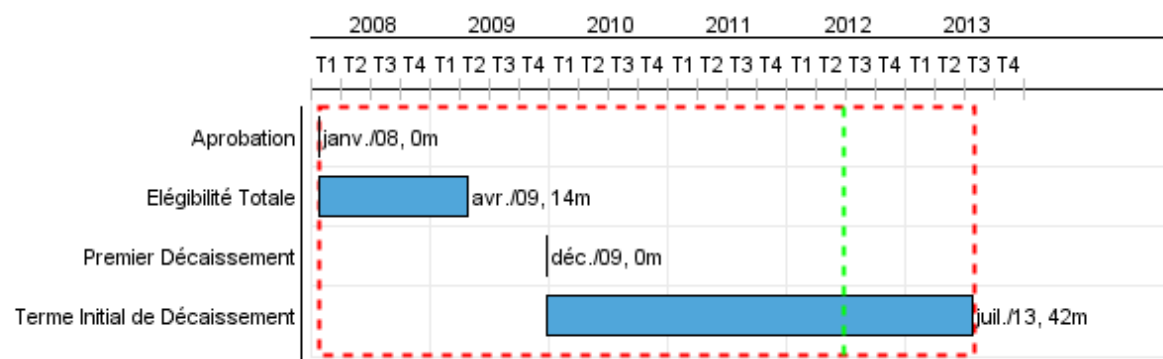

Progrès Cumulé à 2011

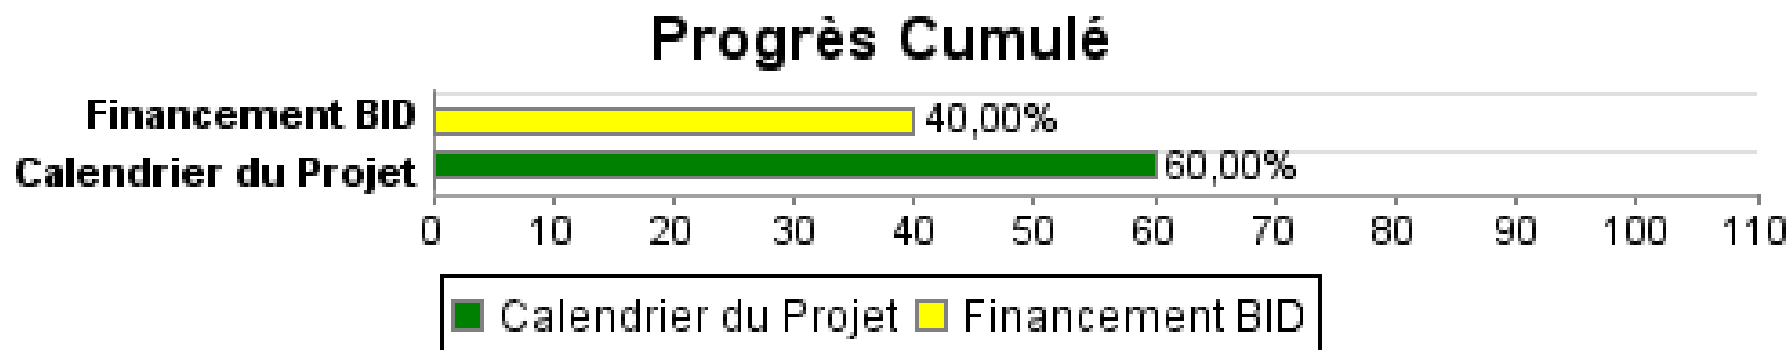

Résultats

Résultat:	Bienes patrimoniales puestos en uso
Observações:	Los bienes contribuirán al desarrollo de las regiones

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Carteras regionales plurianuales de inversión en puesta en valor del patrimonio validadas por el Gobierno Regional (GORE) respectivo	Carteras regionales		2007	P A	8.00	8.00 15.00	12.00		15.00 15.00	15.00
Activos patrimoniales puestos en valor tienen en funcionamiento mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad.	%		2007	P A		30.00	50.00 100.00	70.00	80.00	80.00
Población del entorno de los bienes patrimoniales beneficiados por el programa valora positivamente las inversiones .	%		2007	P A			10.00	20.00	30.00	30.00
Metodología de evaluación de proyectos de puesta en valor aprobada por MIDEPLAN	Metodología		2007	P A					1.00	1.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP
Protección y puesta en valor del patrimonio					
Obras de Bienes patrimoniales terminadas	bienes patrimoniales	32,00	21,00		55,00
Fortalecimiento institucional					
Planes de gestión de bienes patrimoniales puestos en vigencia	Planes de gestión	10,00	13,00		44,00
Metodología de evaluación elaborada	Metodología				
