

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-NATURAL DISASTERS PREVENTION RELIEF
Número(s) de Préstamo:	1642/SF-HA;2389/GR-HA
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	HA-T1096, HA-T1156
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	5.055.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	3.439.815,57
% Desembolsado:	68,05
Saldo:	1.615.184,43

Costo total y Fuente

BID Original:	8.491.259,81
Actual BID:	5.055.000,00
Pari-passu:	99,00
Co-financiamiento/País:	50.000,00
Estimado Original:	8.541.259,81
Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 19-abr-2012
Validado por Representante de País: 30-abr-2012

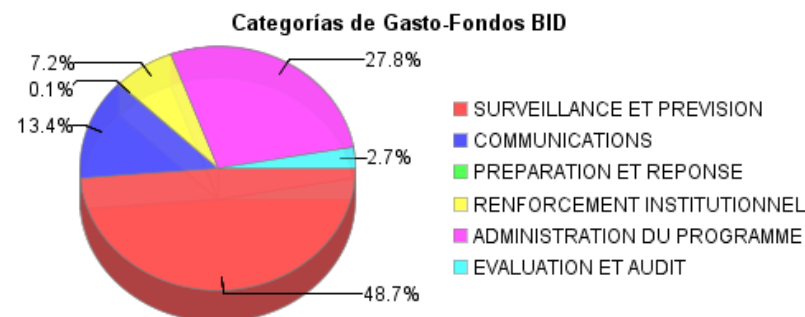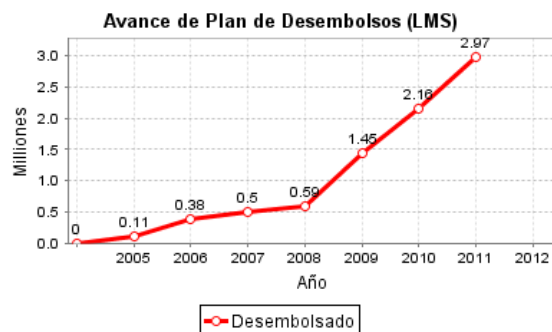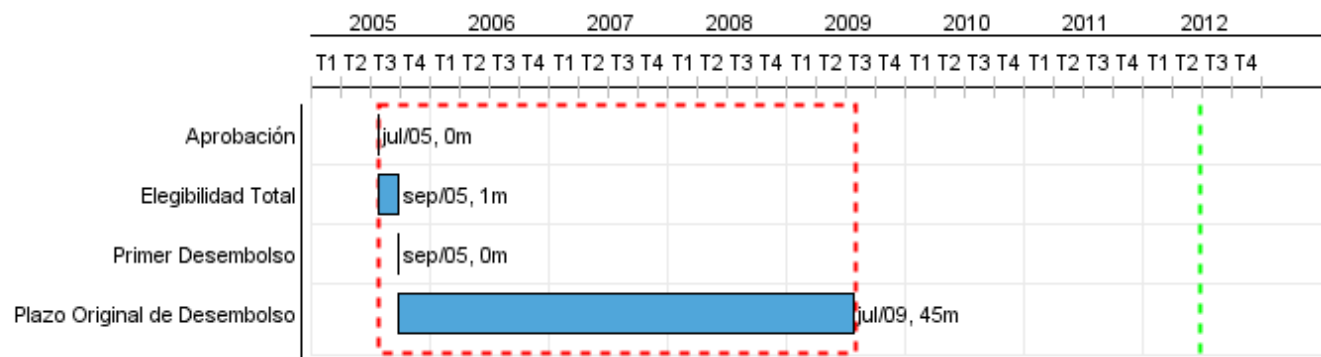

Progreso Acumulado al 2011

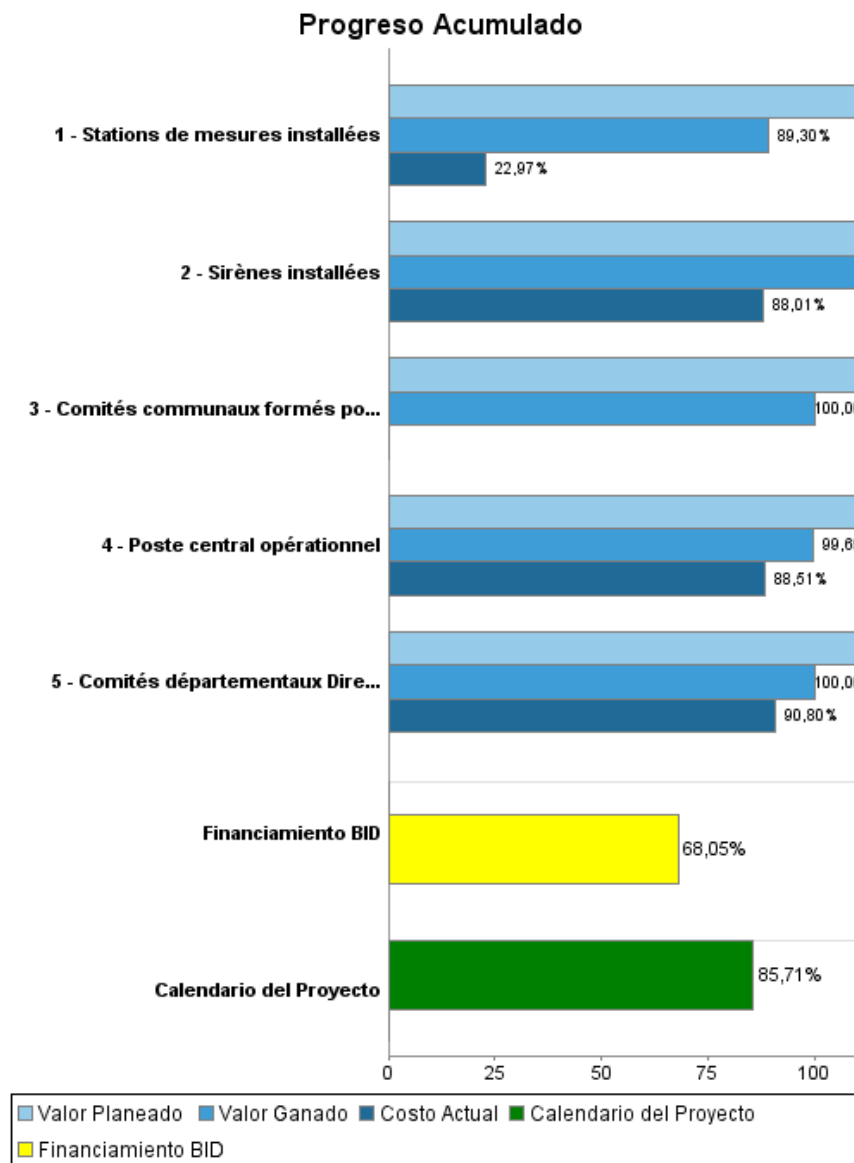

Resultados

Resultado: Un dispositif d'alerte au risque d'inondation est opérationnel dans les 35 communes ciblées des 13 bassins versants vulnérables.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Sites ciblés équipés et connectés au réseau central	%		2005	P A						100.00	100,00

Resultado: Les populations des zones vulnérables ciblées ont la capacité de répondre à l'alerte.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Populations des zones ciblées qui ont une compréhension suffisante du dispositif alerte + plan d'évacuation	%		2005	P A						90.00	90,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
2. Communications									
Poste central opérationnel	Poste de commande	1,00	1,00		1,00	226.000,00	73.272,00		250.000,00
3. Etat de préparation et réponse de la population en cas d'avertissement précoce.									
Comités communaux formés pour la réponse	Comités communaux	35,00	35,00		35,00	100.000,00			100.000,00
Renforcement Institutionnel pour le Fonctionnement du Système d'Alerte Précoce									
Comités départementaux Direction de la Protection Civile dotés en équipement de communication pour la saison cyclonique	Comités départementaux	6,00	6,00		10,00	120.150,00	58.012,00		220.150,00
Campagne de sensibilisation et éducation du public									
Surveillance et prévision des inondations									
Sirènes installées	Sirènes	29,00	30,00		47,00	956.000,00	279.582,00		1.800.000,00
Stations de mesures installées	Stations de mesure	41,00	58,00		55,00	860.000,00	279.582,00		1.400.000,00
Administration, audit, évaluation									
TOTAL						2.262.150,00	690.448,00		3.770.150,00
