
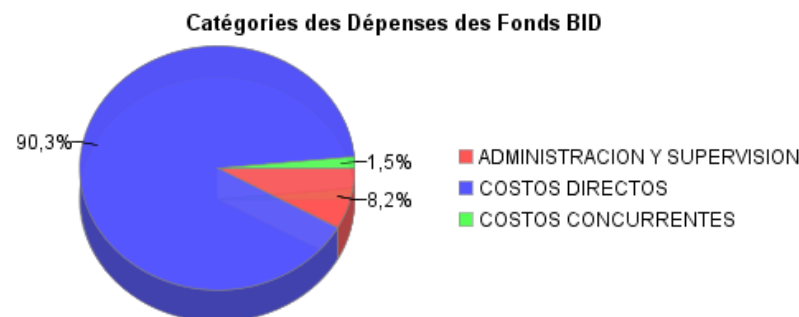
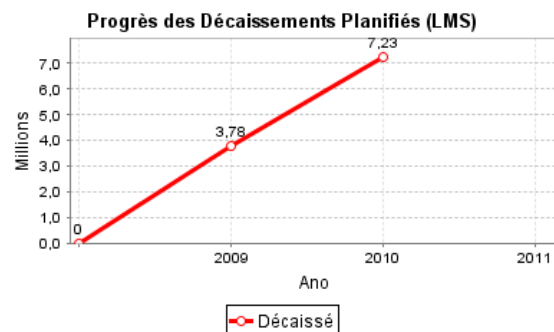



Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACION ARGENTINA				
Secteur:	TOURISM-DEVELOPMENT & MNGMT TOURISM DESTIN				
Numéro(s) de Prêt(s):	1648/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	33.000.000,00	Initial BID:	33.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	14.659.039,61	Courant BID:	33.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	44,42	Pari Passu:	64,63
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	18.340.960,39	Cofinancement/Pays:	23.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	56.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 22, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 26, 2011

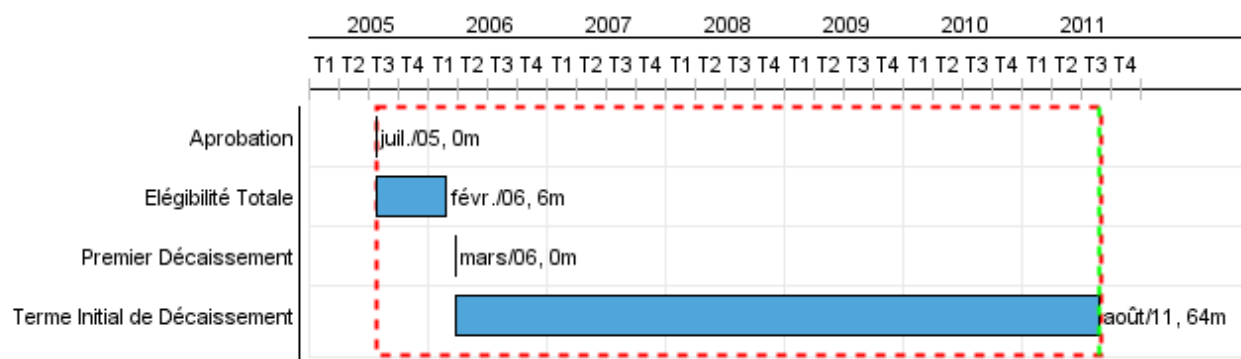

Progrès Cumulé à 2010

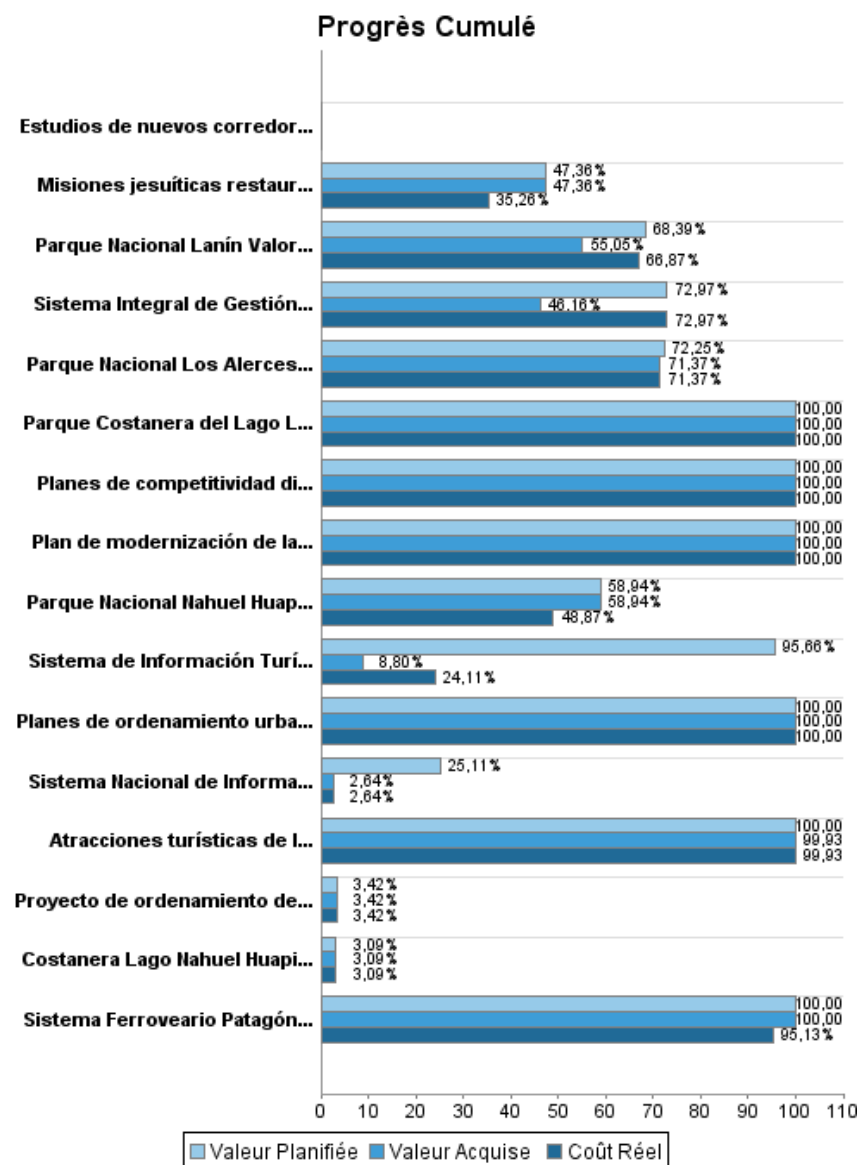

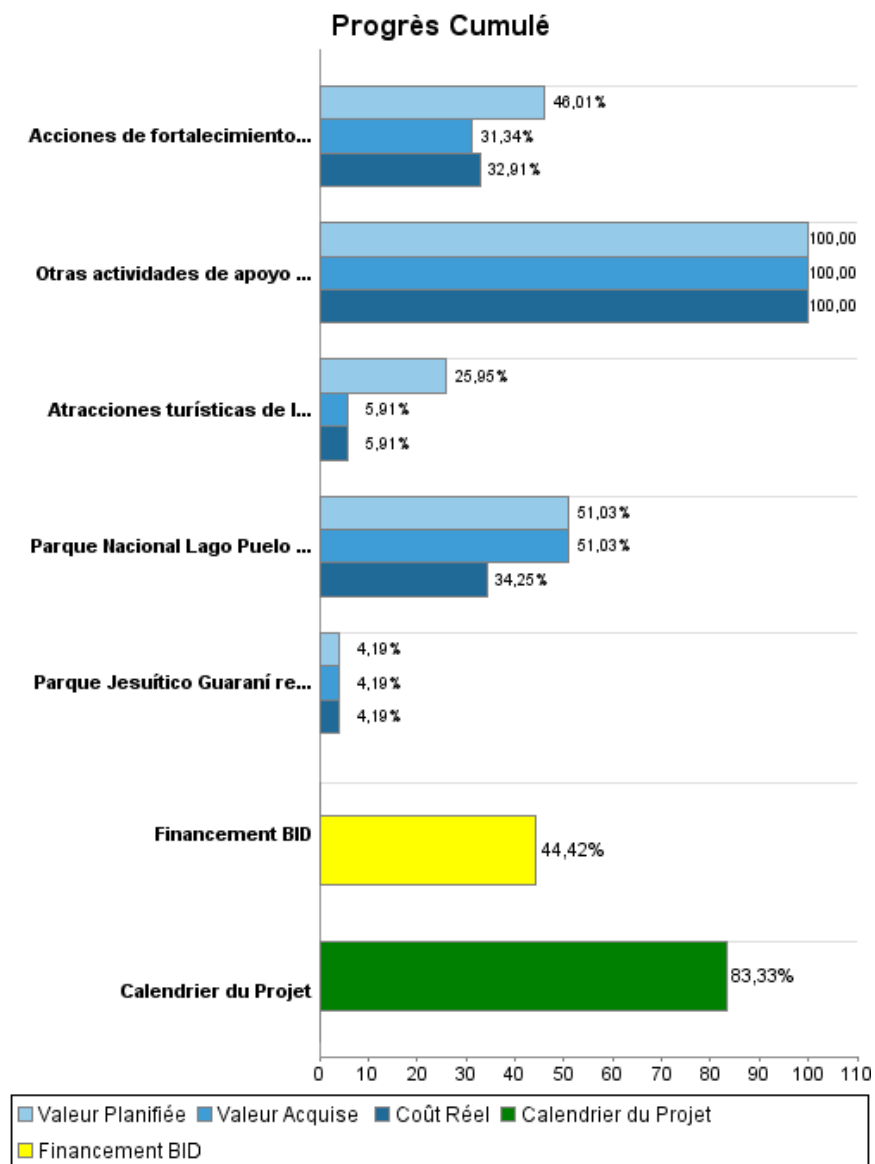

Résultats

Résultat:	Generación de divisas provenientes de la actividad turística en los Corredores de los Lagos e Iguazú-Misiones incrementada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Visitantes a Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Esquel	visitantes	990.250,00	2004	P A	1.150.000,00	1.150.000,00
Ingresos generados por los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi-Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.	US\$	1.130.000,00	2004	P A	2.340.000,00	2.340.000,00
Visitantes a San Ignacio Miní, en el área de las Misiones Jesuíticas Guaraníes.	visitantes	202.831,00	2004	P A	368.400,00 113.120,00	368.400,00
Tarifa de entrada para visitante extranjero a las Misiones Jesuíticas.	US\$	4,00	2004	P A	5,30 7,50	5,30
Ingresos totales provenientes de recaudación de uso (pasajeros), servicios especiales y concesiones del Viejo Expreso Patagónico.	US\$	224.160,00	2004	P A	991.600,00	991.600,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Valorización y gestión de atracciones turísticas públicas									
Parque Nacional Lanín Valorizado	Obras	7,00	2,00		13,00	650.000,00	596.998,00		3.480.273,00
Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Arrayanes valorizados	Obras	10,00	10,00		22,00	1.000.000,00	460.674,00		5.358.083,00
Parque Nacional Los Alerces valorizado	Obras				11,00	72.000,00	52.586,00		2.216.055,00
Parque Nacional Lago Puelo valorizado	Obras	1,00	1,00		5,00	460.000,00	117.262,00		2.042.226,00
Atracciones turísticas de la provincia de Misiones valorizadas	Obras				4,00	289.222,00	45.667,00		1.215.407,00
Atracciones turísticas de la provincia del Neuquén valorizadas	Obras				5,00	25.000,00	24.319,00		1.007.731,00
Atracciones turísticas de la provincia de Río Negro valorizadas	Obras				2,00				200.000,00
Atracciones turísticas de la provincia del Chubut valorizadas	Obras				11,00				801.801,00
Sistema Ferrovieario Patagónico La Trochita restaurado	Expresos reaccionicionados	1,00	1,00		1,00	170.000,00	72.478,00		2.004.404,00
Parque Costanera del Lago Lácar construído	Parques costeros				1,00	150.000,00	150.000,00		1.559.517,00
Acceso a Cerro Catedral mejorado	Accesos				1,00				1.351.674,00
Misiones jesuíticas restauradas (San Ignacio Mini y Santa Ana)	Misiones	2,00	2,00		4,00	600.000,00	232.018,00		3.039.676,00
Parque Jesuítico Guaraní rehabilitado y ampliado	Parques				1,00	43.686,00	43.686,00		1.043.686,00
Costanera Lago Nahuel Huapi construída	Costaneras				1,00	27.692,00	27.692,00		2.063.721,00
Parque lineal Pocahullo construído	Parques				1,00				2.017.676,00
Proyecto de ordenamiento del entorno de las ruinas de San Ignacio implementado	Reordenamientos				1,00	70.757,00	70.757,00		2.070.757,00
Apoyo a la estructuración y promoción de los corredores									
Planes de competitividad diseñados (Corredor Los Lagos y Corredor Iguazú-Misiones)	Planes				2,00				278.164,00
Acciones de fortalecimiento, capacitación y sensibilización realizadas	Proyectos	1,00			5,00	125.000,00	13.376,00		852.081,00
Sistema de Información Turística (SITU) implementado	Sistemas	1,00			1,00	300.000,00	52.896,00		345.386,00
Planes de ordenamiento urbano elaborados	Planes				15,00				167.659,00
Estudios de nuevos corredores completados	Estudios				5,00				
Otras actividades de apoyo a la estructuración y promoción de los corredores	Actividades	1,00	1,00		7,00				796.600,00

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1004 - Improvement of the Competitiveness of Tourism
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 22/03/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la administración turística nacional									
Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGINA) implementado	Sistemas	1,00			2,00	297.462,00	297.462,00		1.109.694,00
Plan de modernización de la gestión de los Recursos Humanos de la SECTUR implementado	Planes				4,00	60.201,00	60.201,00		321.361,00
Sistema Nacional de Información Turística (SITA) desarrollado	Sistemas				1,00	300.000,00			1.335.242,00
Administración, auditoría y costos financieros									
TOTAL						4.641.020,00	2.318.072,00		36.678.874,00
