
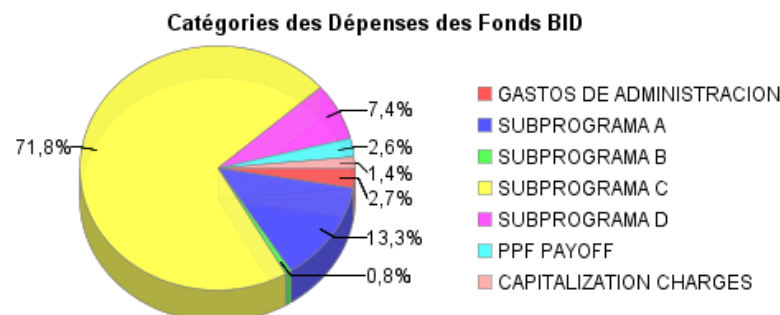
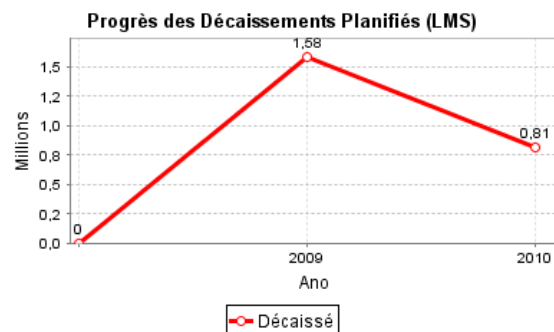



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN DEVELOPMENT CREDIT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1006/SF-BO	Montant Courant Approuvé:	42.067.706,19	Initial BID:	45.800.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	42.067.706,19	Courant BID:	42.067.706,19
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	BO0026, BO0183	Solde:		Cofinancement/Pays:	11.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	56.800.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 20, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 19, 2011

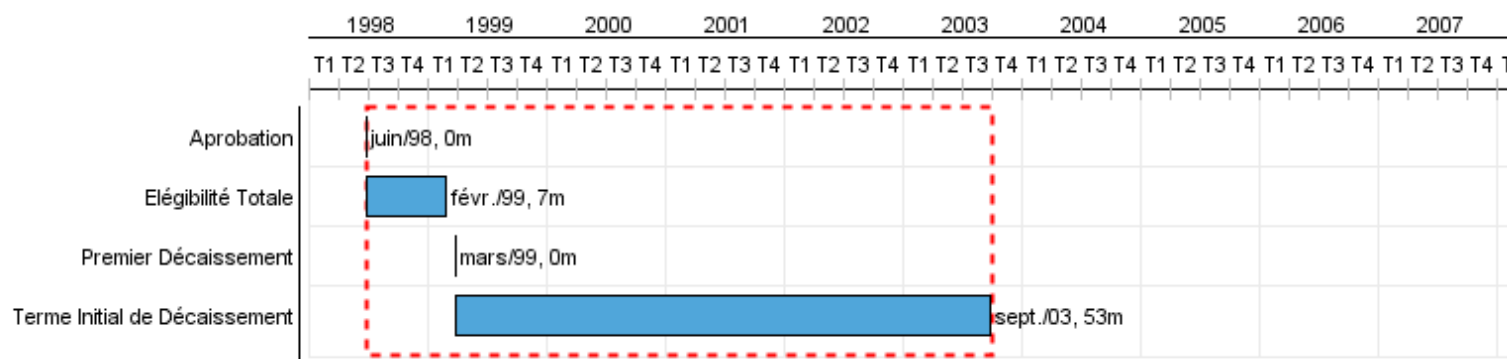

Progrès Cumulé à 2010

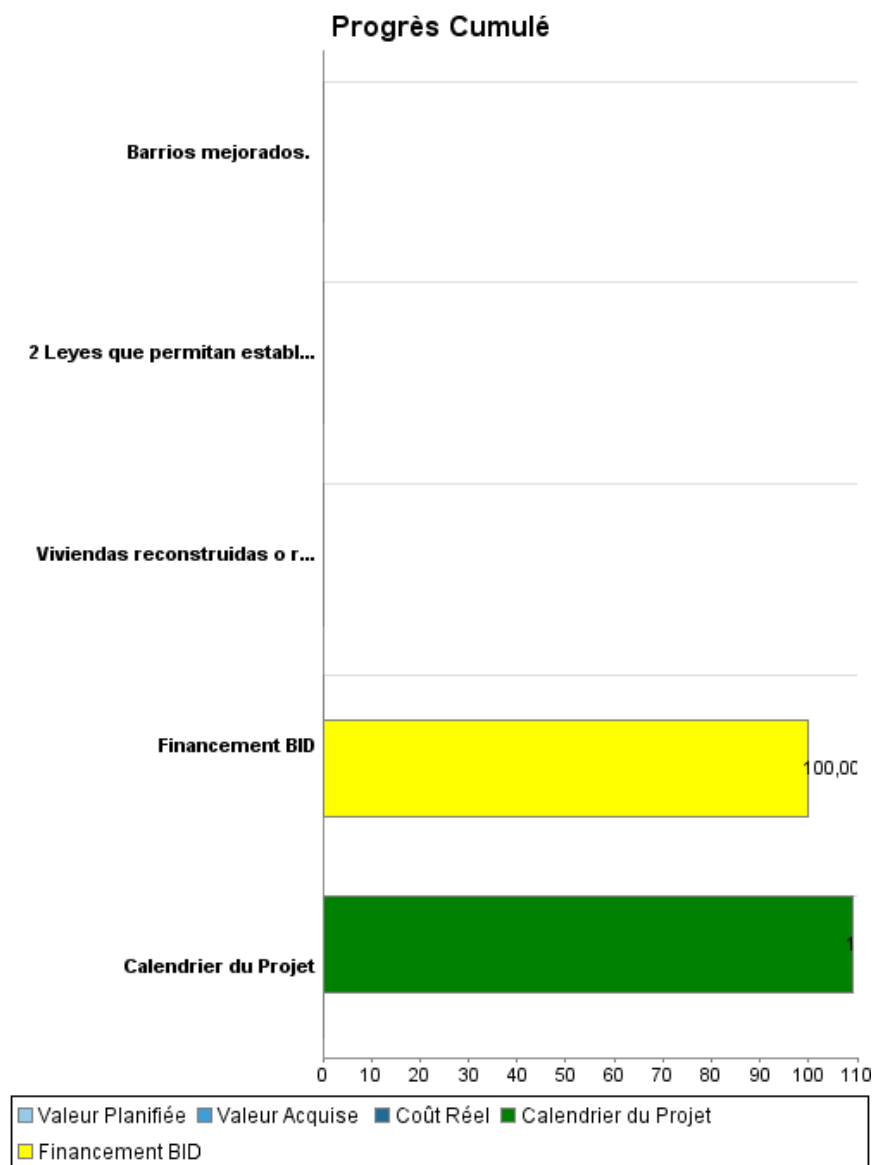

Résultats

Résultat:	Contribuir a elevar la situación habitacional de la población, particularmente de aquella de más bajos ingresos.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	Fin du Projet
Acceso a servicios de saneamiento básico por parte de las familias beneficiarias del Programa.	Familias			P	23.000,00	0,00
				A	56.000,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sub-Programa A. Implementación de la Política de Reforma del Sector Habitacional									
2 Leyes que permitan establecer una reforma legal e institucional que reduzca los costos de producción, transacción y financiamiento de la vivienda en Bolivia (en %).	Leyes				100,00				
Sub-Programa C. Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.									
Barrios mejorados.	Barrios				81,00				
Sub-Programa D. Reconstrucción de Viviendas en zonas urbanas de Aiquile, Mizque y Totora.									
Viviendas reconstruidas o refaccionadas en las zonas afectadas.	Viviendas				1.400,00				
Sub-Programa B. Desarrollo del Mercado Secundario (se canceló)									
TOTAL									
