
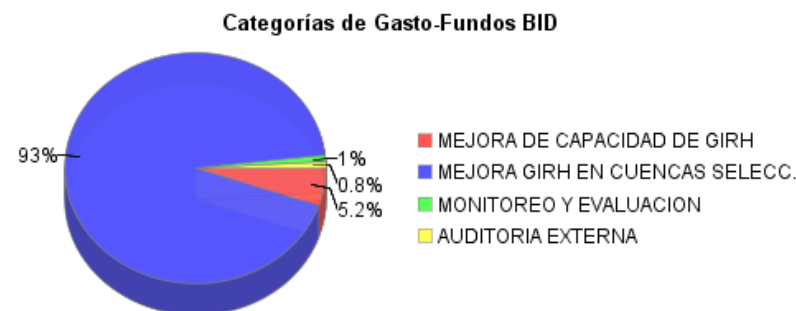
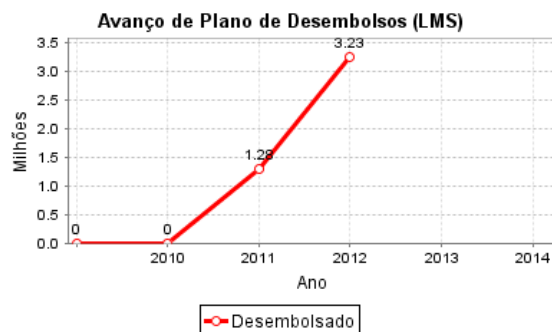



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Autoridad Nacional del Agua		
Setor: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 2166/OC-PE	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.760.080,33	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 27,60	Pari-passu: 51,00
Operação Relacionada:	Saldo: 7.239.919,67	Cofinanciamento/País: 9.579.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 19.579.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2012

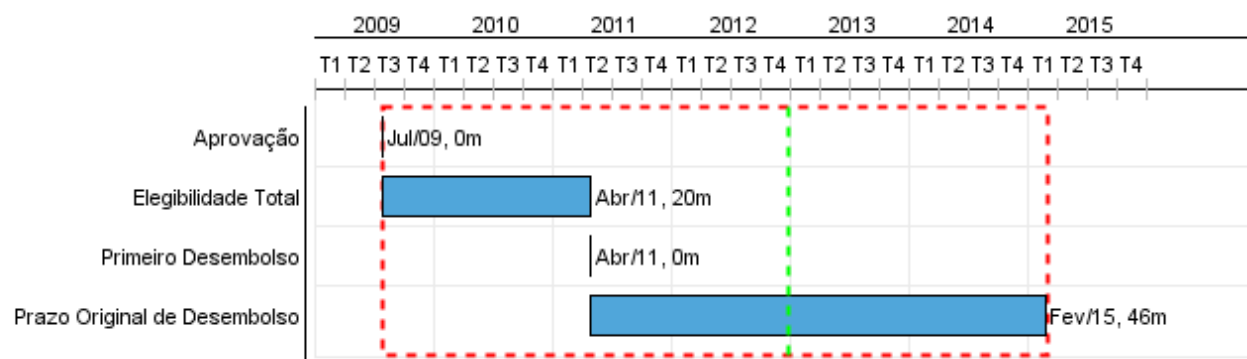

Progresso Acumulado até 2012

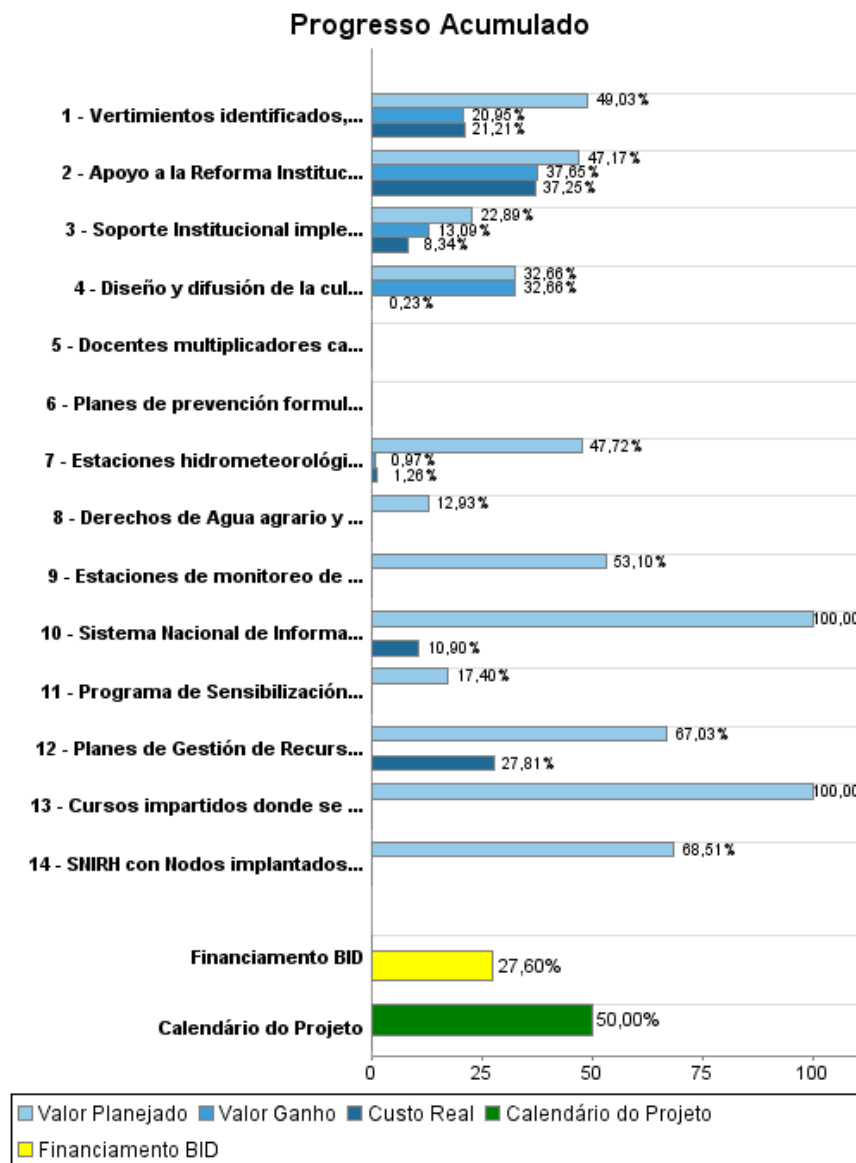

Resultados

Resultado:	Capacidad en la gestion de Recursos Hídricos en las cuencas Chira-Piura, Tacna y Puyango Tumbes mejorada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2015	Final do Projeto
Valor unitario promedio de la recaudacion en las tres cuencas.	Centavos de US\$/m3	3.00	2009	P A	3.90	4.50	4.50
Planes de Gestion aprobados por la Autoridad Nacional del Agua	Planes		2009	P A		3.00	3.00
Conflictos locales en las Cuencas por el uso de agua con actas de acuerdos firmados por las partes	Actas		2009	P A	4.00	6.00	10.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Mejora de la Capacidad de GIRH a nivel nacional - Apoyo a la Reforma Institucional									
Apoyo a la Reforma Institucional para la GIRH	Informes	2,00	1,00		12,00	399.000,00	191.000,00		2.097.208,00
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) diseñado	Sistemas	1,00			1,00	321.000,00	35.000,00		321.000,00
SNIRH con Nodos implantados y operando en las cuencas piloto (Adquisición de hardware y software, acondicionamiento de local en 3 cuencas)	Nodo	2,00			3,00	502.000,00			732.749,00
Diseño y difusión de la cultura del agua a nivel nacional	Campaña	2,00	2,00		6,00	207.000,00			638.291,00
2 Mejora GIRH en cuencas seleccionadas-GIRH en 3 cuencas piloto (Chira-Piura,Puyango-Tumbes,Tacna)									
Soporte Institucional implementado para adecuado funcionamiento de CRHC	Informe	2,00	1,00		10,00	1.479.912,00	381.000,00		7.551.859,00
Planes de Gestión de Recursos Hídricos aprobados	Plan de Gestión	1,00			3,00	1.328.190,00	551.000,00		1.981.500,00
Derechos de Agua agrario y no agrario otorgados (títulos) y registrados (RADA) en las 3 cuencas piloto	Nro. de derechos de agua otorgados	20,00			100,00	80.000,00			618.950,00
Estaciones hidrometeorológicas adquiridas en las Cuencas Seleccionadas	Numero	25,00			53,00	1.418.849,00	9.000,00		3.034.849,00
Vertimientos identificados, clasificados y monitoreados en las 3 Cuencas Piloto	Puntos de vertimiento/ Año	40,00	7,00		120,00	345.080,00	63.000,00		1.013.984,00
Estaciones de monitoreo de calidad del agua operando en las 3 Cuencas Piloto	Estaciones	12,00			20,00	229.896,00			432.916,00
Cursos impartidos donde se ha incorporado la cultura del agua en la currícula	Número de cursos	9,00			9,00	15.000,00			15.000,00
Docentes multiplicadores capacitados en cultura del agua	Nro. de docentes				360,00				90.000,00
Programa de Sensibilización, Capacitación y Difusión de la cultura de agua ejecutados y operando en las Cuencas Piloto	Programa/ Cuenca	3,00			3,00	166.445,00			956.384,00
Planes de prevención formulados para la protección de equipos y obras hidráulicas ante eventos extremos máximos en las cuencas piloto	Plan/Cuenca				3,00				94.000,00
TOTAL						6.492.372,00	1.230.000,00		19.578.690,00
