
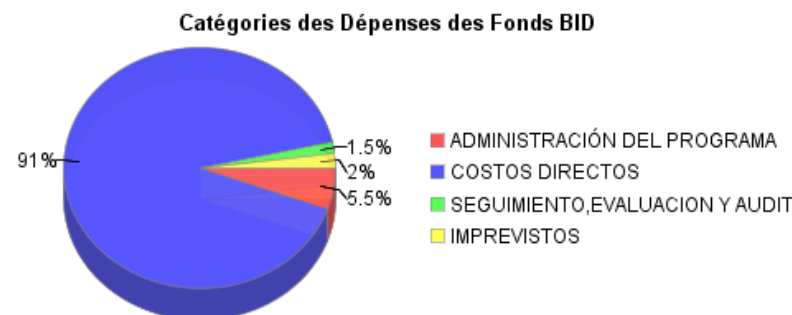
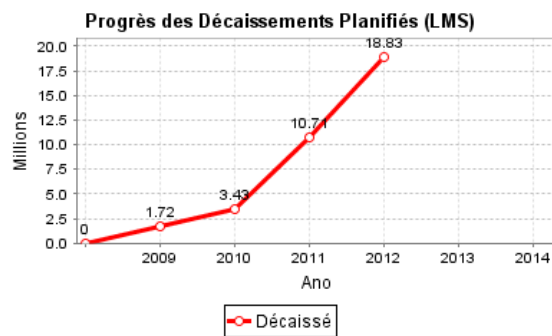



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DEL AGUA				
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2057/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	34.300.000,00	Initial BID:	34.300.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	15.471.767,44	Courant BID:	34.300.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	45,11	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-P1012	Solde:	18.828.232,56	Cofinancement/Pays:	1.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	35.800.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 Validé par le Représentant: 26-sep-2012

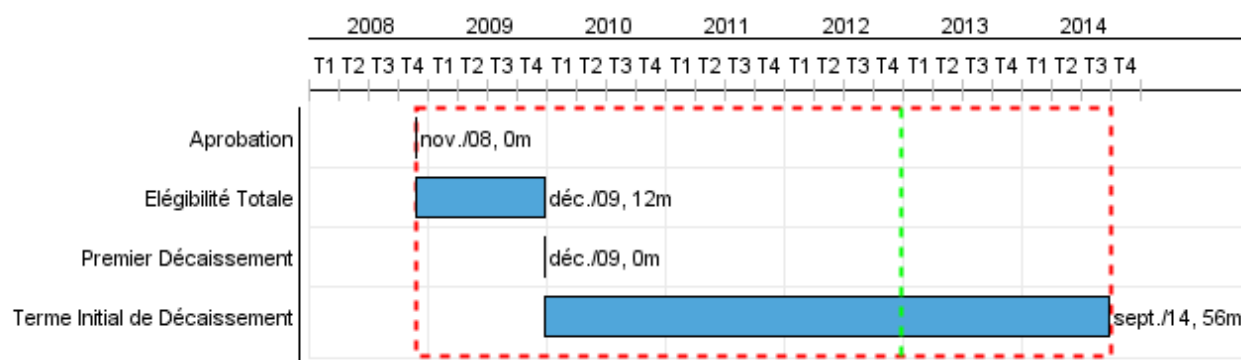

Progrès Cumulé à 2012

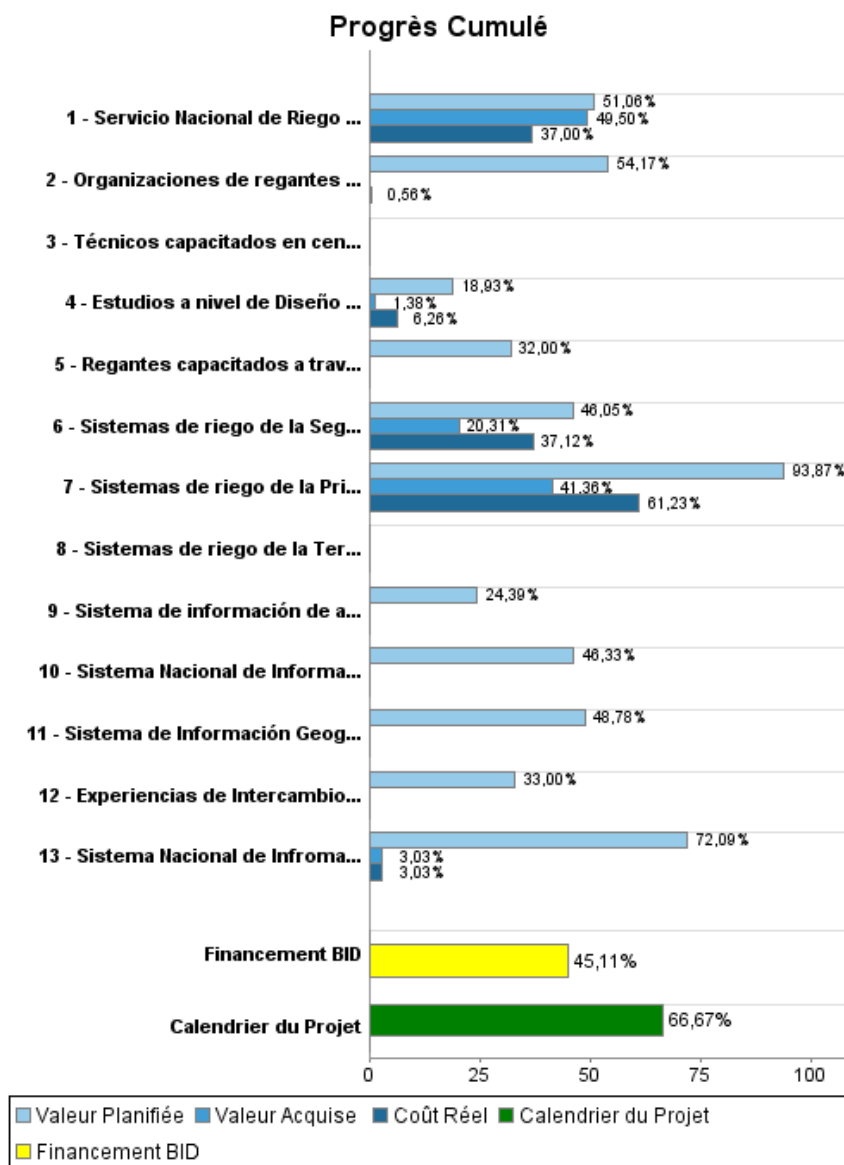

Résultats

Résultat: Ingresos por actividades agropecuarias mejorados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	Fin du Projet
Ingresos promedio por hectárea en actividades agropecuarias específicas	USD/ha	500.00	2008	P A		1,000.00	1,500.00
Hectáreas incrementales bajo riego	Hectarea		2008	P A		3,500.00	9,000.00

Résultat: Rendimiento de los cultivos y pastizales mejorado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	Fin du Projet
Crecimiento promedio del rendimiento de los cultivos (toneladas/hectárea)	Porcentaje promedio		2008	P A		10.00	20.00

Résultat: Organizaciones de regantes fortalecidas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2013	Fin du Projet
Sistemas de riego administrados por regantes	Sistemas		2008	P A	12.00		33.00
Sistemas de riego administrados por beneficiarios que recibieron asistencia técnica integral	Sistemas		2008	P A	12.00		33.00
Registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua de riego otorgados.	Registro		2008	P A	33.00		45.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Inversiones para el Desarrollo de Riego Comunitario									
Sistemas de riego de la Primera Cartera construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego	6,00	1,00		9,00	3.159.618,50	784.802,48		6.126.168,43
Sistemas de riego de la Segunda Cartera construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego	4,00			24,00	3.601.681,68	2.351.813,09		13.995.082,71
Sistemas de riego de la Tercera Cartera construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego				4,00				5.695.653,86
Estudios a nivel de Diseño Final, ya sea Estudio de Identificación (EI) o Técnico, económico, social y ambiental (TESA) elaborados	Estudios	12,00			35,00	250.000,00	16.451,68		1.506.095,00
Apoyo a la institucionalidad y la gestión de agua para riego con enfoque de cuenca									
Organizaciones de regantes capacitadas en temas de gestión de riego (Asistencia Técnica Integral - ATI).	Organizaciones	13,00			33,00	197.541,97			438.500,00
Experiencias de Intercambio entre los Regantes realizadas.	Intercambios	13,00			48,00	25.000,00			100.000,00
Regantes capacitados a través de la Escuela Nacional de Riego (ENR) mediante cursos y talleres.	Agricultores				2.000,00				250.000,00
Técnicos capacitados en centros académicos mediante cursos y talleres.	Técnicos				70,00				350.000,00
Marco operativo e institucional departamental definido									
Servicio Nacional de Riego (SENARI) y Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs) funcionando.	SEDERI	8,00	2,00		8,00	785.000,00	114.791,01		2.931.000,00
Implementación del Sistema Nacional de información de Riego (información geográfica, gerencial y administración de proyectos)									
Sistema Nacional de Información de Riego diseñado	Documento	1,00			1,00	49.500,00			71.670,00
Sistema Nacional de Información de Riego (SNIR) implementado.	Sistema				1,00				215.830,00

RAPPORT DE SUIVI

BO-L1021 - National Irrigation Program with a Watershed Approach
2012 1^o período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 20/09/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistema de Información Geográfica para riego instalado y funcionando en el Servicio Nacional de Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SENARIs) y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR)	Sistema				1,00				410.000,00
Sistema de información de administración de proyectos instalado y funcionando en el Servicio Nacional del Riego (SENARI), en los Servicios Departamentales de Riego (SENARIs), y en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) compatible con el Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social	Sistema				1,00				410.000,00
Administración, evaluación, seguimiento y auditorias	N/A					250.000,00	170.147,70		2.600.000,00
Imprevistos	N/A								700.000,00
TOTAL						8.318.342,15	3.438.005,96		35.800.000,00
