
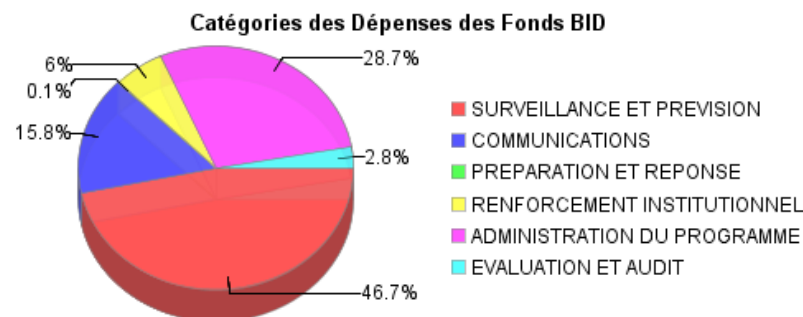
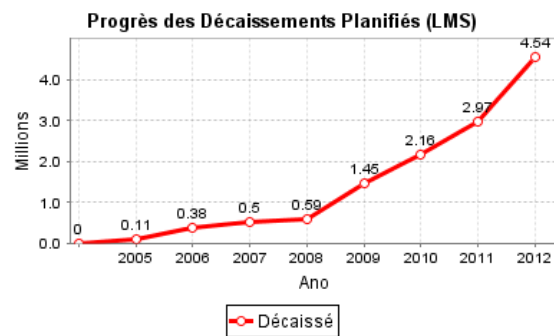



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL		
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	1642/SF-HA;2389/GR-HA	Montant Courant Approuvé: 5.000.000,00	Initial BID: 8.436.259,81
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour: 4.104.328,97	Courant BID: 5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé: 82,09	Pari Passu: 99,00
Opération(s) Connexe(s):	HA-T1096, HA-T1156	Solde: 895.671,03	Cofinancement/Pays: 50.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility		Estimation Initiale: 8.486.259,81
			Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 Validé par le Représentant: 26-sep-2012

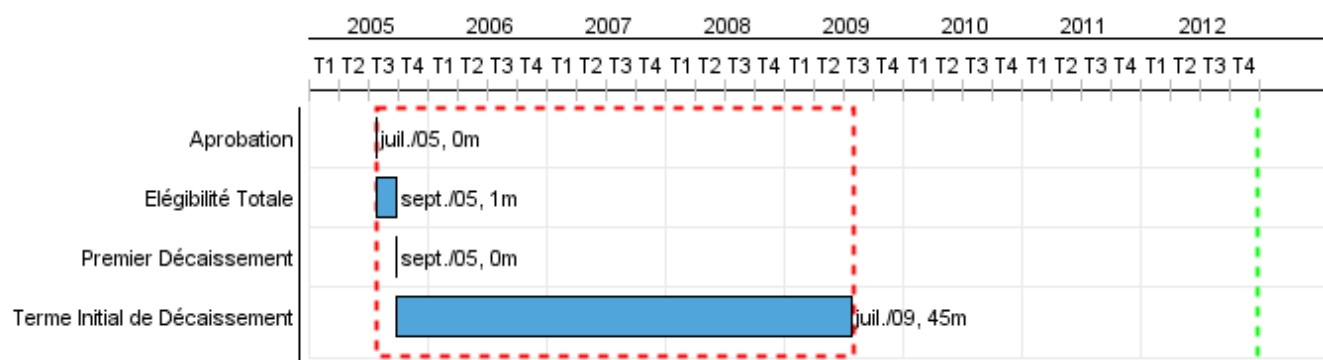

Progrès Cumulé à 2012

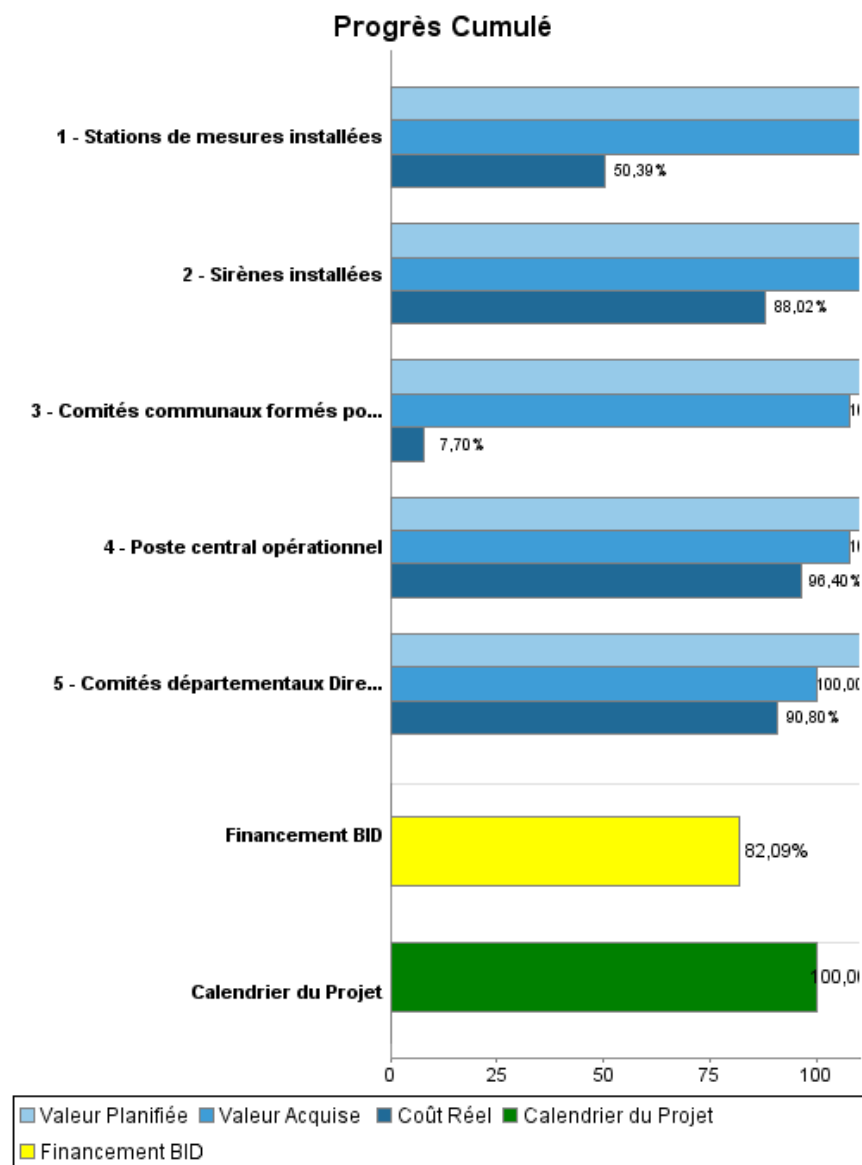

Résultats

Résultat: Un dispositif d'alerte au risque d'inondation est opérationnel dans les 35 communes ciblées des 13 bassins versants vulnérables.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Sites ciblés équipés et connectés au réseau central	%		2005	P A						100.00	100.00

Résultat: Les populations des zones vulnérables ciblées ont la capacité de répondre à l'alerte.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Fin du Projet
Populations des zones ciblées qui ont une compréhension suffisante du dispositif alerte + plan d'évacuation	%		2005	P A						90.00	90.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
2. Communications									
Poste central opérationnel	Poste de commande				1,00	92.000,00	19.740,00		250.000,00
3. Etat de préparation et réponse de la population en cas d'avertissement précoce.									
Comités communaux formés pour la réponse	Comités communaux				35,00	17.000,00	7.700,00		100.000,00
Renforcement Institutionnel pour le Fonctionnement du Système d'Alerte Précoce									
Comités départementaux Direction de la Protection Civile dotés en équipement de communication pour la saison cyclonique	Comités départementaux				10,00				220.150,00
Campagne de sensibilisation et éducation du public									
Surveillance et prévision des inondations									
Sirènes installées	Sirènes				47,00	216,00	216,00		1.800.000,00
Stations de mesures installées	Stations de mesure				55,00	1.743.000,00	383.865,00		1.400.000,00
Administration, audit, évaluation									
Administration, audit, évaluation	N/A					220.000,00	31.785,00		1.285.000,00
TOTAL						2.072.216,00	443.306,00		5.055.150,00
