
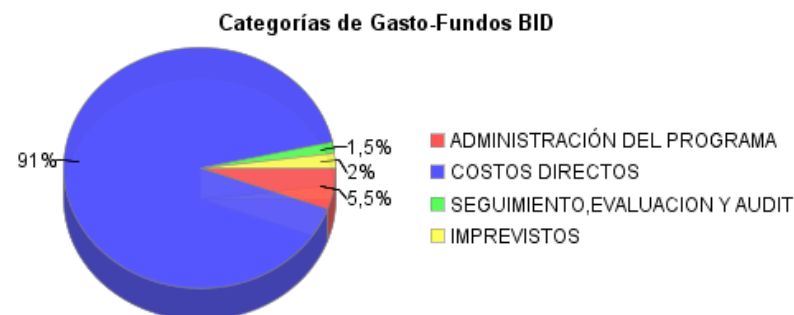
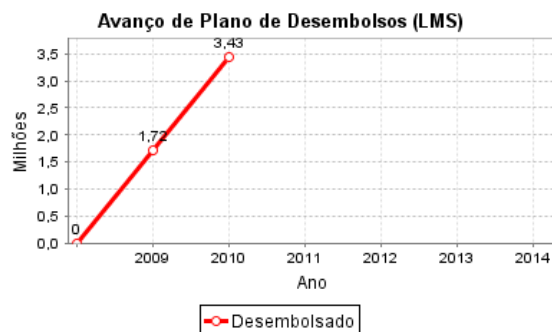



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DEL AGUA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-IRRIGATION AND DRAINAGE		
Número da Operação: 2057/BL-BO	Atual: 34.300.000,00	Original BID: 34.300.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.430.000,00	Corrente BID: 34.300.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 10,00	Pari-passu: 97,66
Operação Relacionada: BO-P1012	Saldo: 30.870.000,00	Cofinanciamento/País: 1.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 35.800.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011

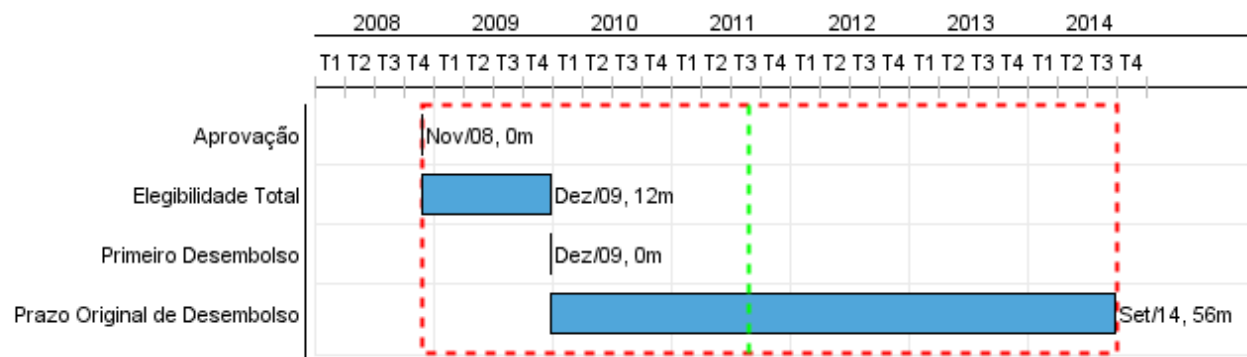

## Progresso Acumulado até 2010

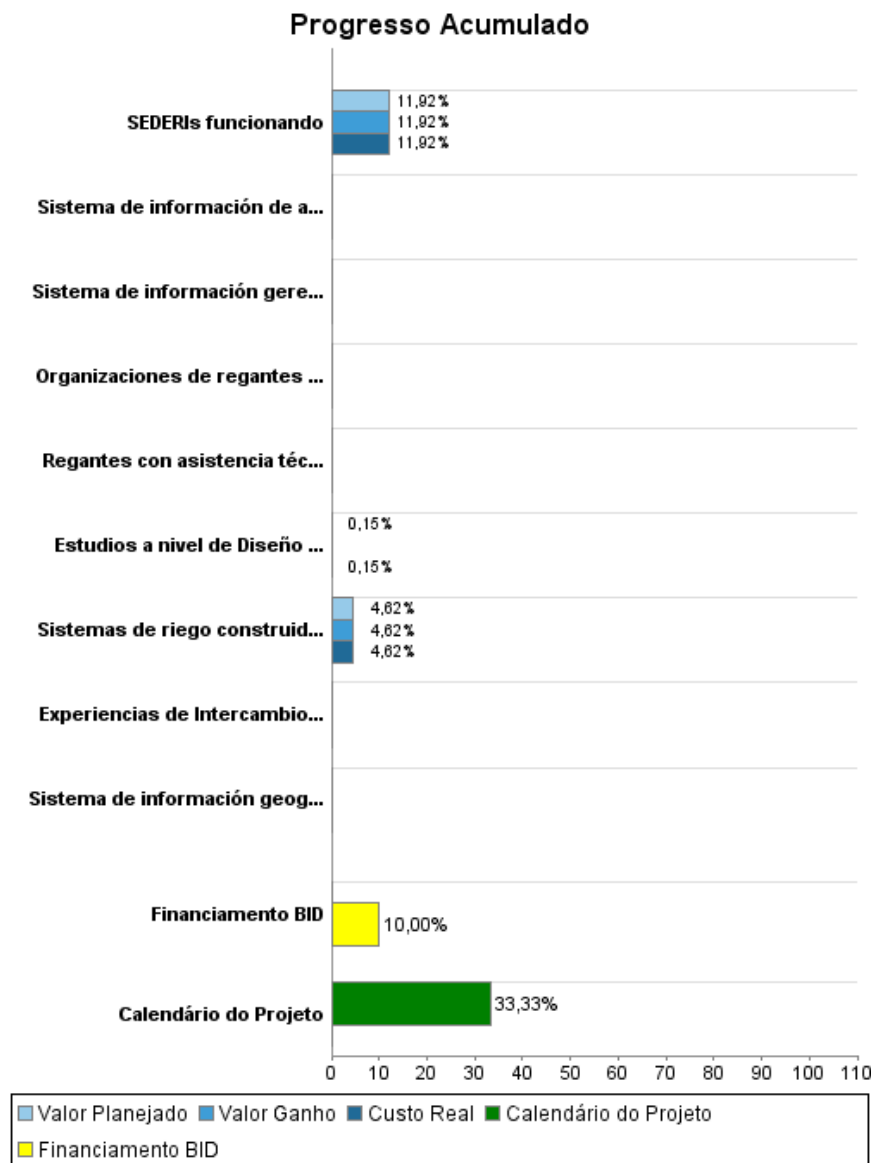

## Resultados

**Resultado:** Aumento en los ingresos por actividades agropecuarias

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Incremento de ingresos por hectárea en actividades agropecuarias específicas	Porcentaje promedio		2010	P A		0,00
Hectáreas incrementales de riego	Hectarea		2010	P A	3.500,00	9.000,00

**Resultado:** Incremento del rendimiento de los cultivos y pastizales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Incremento del rendimiento de los cultivos (toneladas/hectárea)	Porcentaje promedio		2010	P A		20,00
Incremento del rendimiento de los pastizales (materia seca/hectárea)	Porcentaje promedio		2010	P A		20,00

**Resultado:** Organizaciones de regantes fortalecidas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Sistemas de riego administrados por regantes	Sistemas		2009	P A		33,00
Sistemas de riego operados y mantenidos por regantes	Sistemas		2009	P A		33,00
Registros y autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua de riego otorgados.	Registro		2009	P A	33,00	45,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Inversiones para el Desarrollo de Riego Comunitario</b>									
Sistemas de riego construidos y transferidos a los regantes	Sistemas de riego				33,00		1.131.324,00		24.470.680,00
Estudios a nivel de Diseño Final ya sea EI ( Estudio de Identificación) o TESA	Estudios	5,00			45,00		2.509,00		1.629.320,00
<b>Apoyo a la institucionalidad y la gestión de agua para riego con enfoque de cuenca</b>									
Organizaciones de regantes capacitadas en temas de gestión de riego.	Organizaciones				33,00				300.000,00
Experiencias de Intercambio entre los Regantes realizadas.	Intercambios				48,00				200.000,00
Regantes con asistencia técnica de parte del SENARI en operaciones de riego.	Agricultores				2.000,00				1.968.750,00
<b>Marco operativo e institucional departamental definido</b>									
SEDERIs funcionando	SEDERI		1,00		7,00		349.497,00		2.931.250,00
<b>Implementación del Sistema Nacional de información de Riego (información geográfica, gerencial y administración de proyectos)</b>									
Sistema de información geográfica para riego instalado y funcionando en el SENARI, SEDERIs y VMCA	Sistemas				1,00				500.000,00
Sistema de información gerencial para administración y monitoreo de riego instalado y funcionando en el SENARI, SEDERIs y VMCA	Sistema				1,00				250.000,00
Sistema de información de administración de proyectos instalado y funcionando en el SENARI, SEDERIs y VMCA compatible con el FPS	Sistema				1,00				250.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.483.330,00</b>		<b>32.500.000,00</b>
