
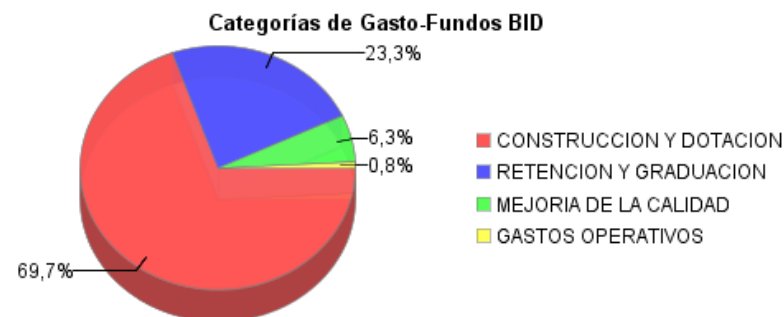



Relatório Resumido

| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | | Custo Total e Fonte | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Executor: | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE BOGOTA | | | | |
| Setor: | EDUCATION | | | | |
| Número da Operação: | 1812/OC-CO | Atual: | 60.000.000,00 | Original BID: | 60.000.000,00 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: | 52.572.027,45 | Corrente BID: | 60.000.000,00 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | % Desembolsado: | 87,62 | Pari-passu: | 67,00 |
| Operação Relacionada: | CO-T1041 | Saldo: | 7.427.972,55 | Cofinanciamento/País: | 30.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | | Original Estimado: | 90.000.000,00 |
| | | | | Período de Amortização (meses): | 240 |

| Categoria do impacto social | | Reformulação | Validação | |
|------------------------------|--------|---|--------------------------------------|-------------|
| Categoria do impacto social: | Nenhum | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: | 10-abr-2013 |
| | | | Validado pelo Representante do País: | 10-abr-2013 |

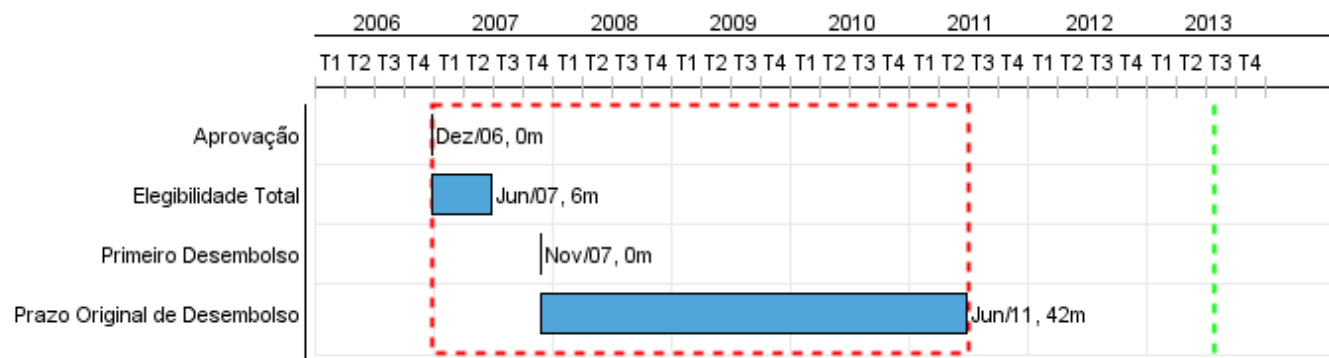

Progresso Acumulado até 2012

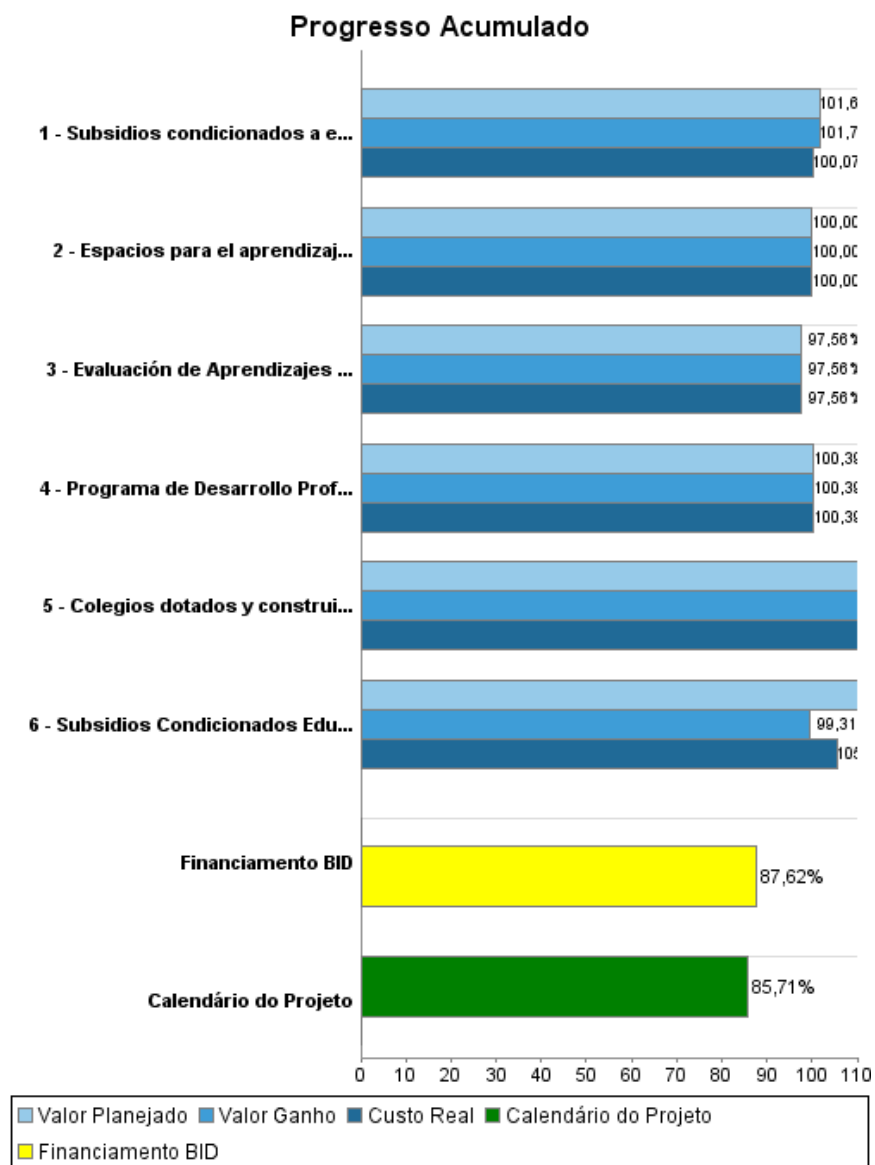

Resultados

| | |
|---------------------|---|
| Resultado: | Resultados del nivel de educación preescolar, básica y media y superior en Bogotá en términos de acceso más equitativos. |
| Observações: | En el segundo semestre de 2010 la Secretaría de Educación de Bogotá esta realizando los trámites requeridos para adelantar la evaluación de impacto del programa. |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Acumulado 2007 - 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| Cupos para alumnos pertenecientes a estratos 1 y 2 en las localidades en que el Programa construye nuevos colegios aumentados. | Cupos | | | P | | 38.000,00 | 23.100,00 | | | | 61.100,00 |
| | | | | A | 47.700,00 | 38.000,00 | 9.700,00 | 57.000,00 | | | |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Resultados del nivel de educación preescolar, básica y media y superior en Bogotá en términos retención más equitativos. |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Acumulado 2007 - 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|-----------------------|------------|------------|----------|------|------|------------------|
| Tasa de asistencia y promoción de alumnos beneficiados del programa de subsidios condicionados en al menos 1 % con referencia al grupo de control. | alumnos | | | P | | | | | | | 45.000,00 |
| | | | | A | 116.078,00 | 132.727,00 | 125.759,00 | 9.165,00 | | | |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Resultados de graduación del nivel de educación preescolar, básica y media y superior en Bogotá equitativos. |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Acumulado 2007 - 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|-----------------------|--------|-------|--------|------|------|------------------|
| Tasa de asistencia a educación superior de alumnos beneficiarios del programa. | alumnos | | | P | | | | | | | 830,00 |
| | | | | A | 365,00 | 645,00 | 86,00 | 650,00 | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Resultados del nivel de educación preescolar, básica y media y superior en Bogotá en términos de pertinencia más equitativos. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | Acumulado 2007 - 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|-----------------------|-------|------|------|------|------|------------------|
| Colegios construidos por el Programa realizan mejoras organizacionales durante la ejecución del mismo, con relación a los objetivos de sus PEIS, como consecuencia de la capacitación de docentes. | colegios | | | P | | | | | | | 20,00 |
| | | | | A | | 13,00 | 2,00 | 1,00 | | | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Construcción de Infraestructura Educativa | | | | | | | | | |
| Colegios dotados y construidos. | colegios | 4,00 | | | 20,00 | | 680.318,27 | | 61.894.819,93 |
| Aumento de la retención y graduación | | | | | | | | | |
| Subsidios condicionados a educación básica y media entregados e implementados. | Subsidios | | | | 45.000,00 | | -5.000,00 | | 15.429.547,31 |
| Subsidios Condicionados Educación superior, técnica y tecnológica entregados e implementados. | Subsidios | | -2,00 | | 830,00 | | 2.501.040,16 | | 5.726.069,08 |
| Mejoría de la calidad | | | | | | | | | |
| Espacios para el aprendizaje instalados. | espacios | | | | 60,00 | | | | 3.758.187,90 |
| Programa de Desarrollo Profesional Docente y Directivo implementado | Programa | | | | 1,00 | | | | 1.378.000,00 |
| Evaluación de Aprendizajes como Insumo para la Práctica Docente, implementada. | evaluación | | | | 1,00 | | | | 502.000,00 |
| Gastos Operativos | | | | | | | | | |
| Administración, Auditoria y Evaluación | N/A | | | | | | 135.293,55 | | 1.172.375,78 |
| Imprevistos | | | | | | | | | |
| Imprevistos | N/A | | | | | 868.000,00 | | | 139.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 868.000,00 | 3.311.651,98 | | 90.000.000,00 |
