
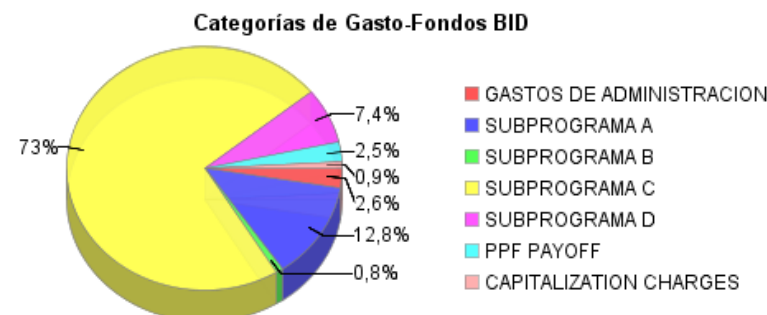



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN DEVELOPMENT CREDIT				
Número(s) de Préstamo:	1006/SF-BO	Monto Aprobado Actual:	42.067.706,19	BID Original:	45.800.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	42.067.706,19	Actual BID:	42.067.706,19
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO0026, BO0183	Saldo:		Co-financiamiento/País:	11.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	56.800.000,00
				Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	09-abr-2013
		Validado por Representante de País:	10-abr-2013

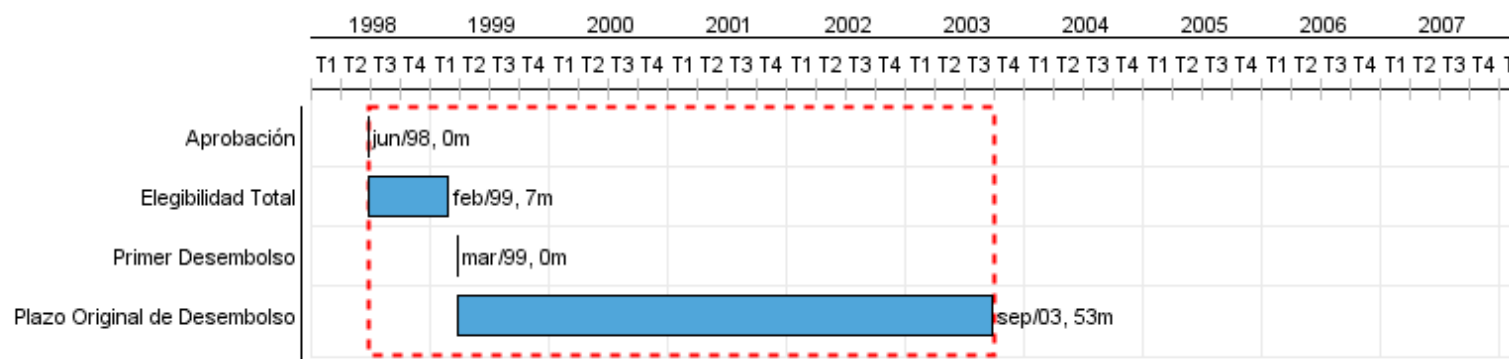

Progreso Acumulado al 2012

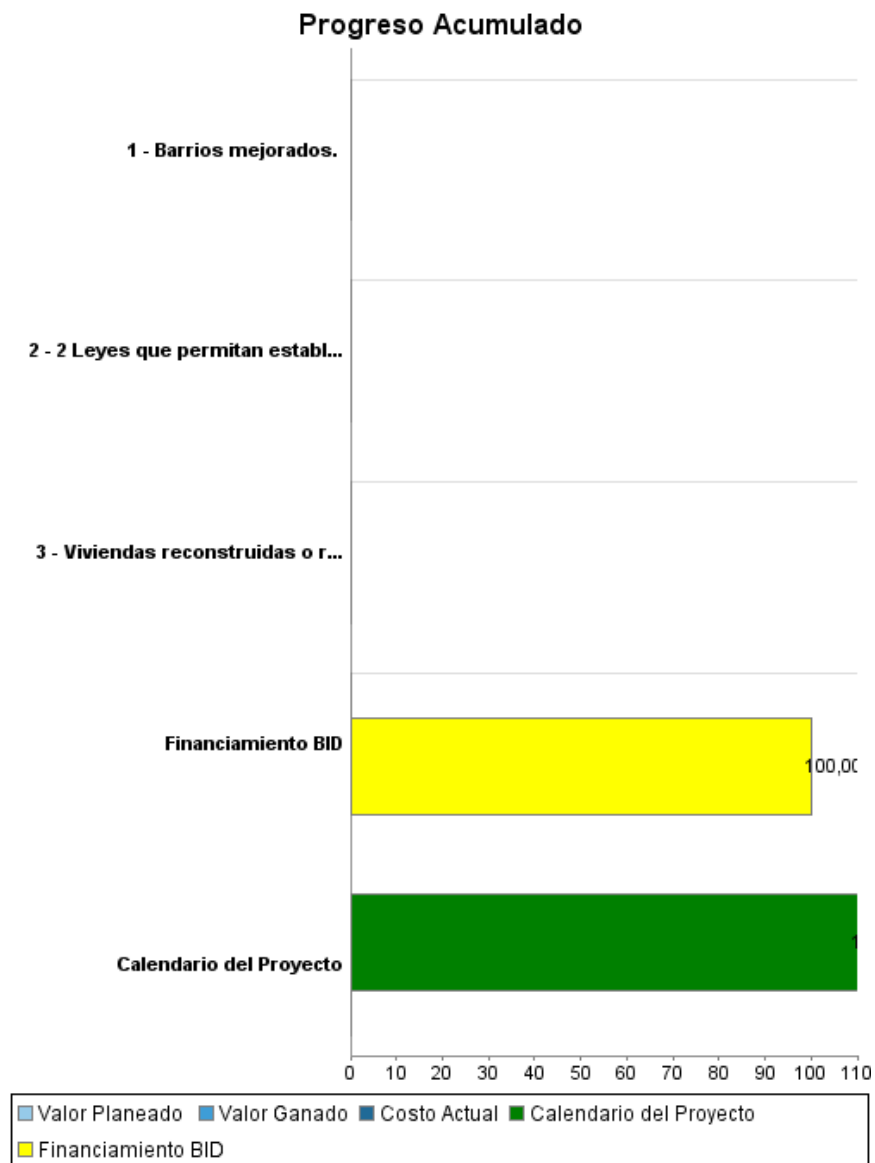

Resultados

Resultado:	Contribuir a elevar la situación habitacional de la población, particularmente de aquella de más bajos ingresos.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	Fin de Proyecto
Acceso a servicios de saneamiento básico por parte de las familias beneficiarias del Programa.	Familias			P	23.000,00	
				A	56.000,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sub-Programa A. Implementación de la Política de Reforma del Sector Habitacional									
2 Leyes que permitan establecer una reforma legal e institucional que reduzca los costos de producción, transacción y financiamiento de la vivienda en Bolivia (en %).	Leyes				100,00				
Sub-Programa C. Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.									
Barrios mejorados.	Barrios				81,00				
Sub-Programa D. Reconstrucción de Viviendas en zonas urbanas de Aiquile, Mizque y Totora.									
Viviendas reconstruidas o refaccionadas en las zonas afectadas.	Viviendas				1.400,00				
Sub-Programa B. Desarrollo del Mercado Secundario (se canceló)									
TOTAL									
