

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
Sector:	TRANSPORT
Número da Operação:	2041/OC-UR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	PDL - Performance Driven Loan
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	PDL - Performance Driven Loan

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	100.000.000,00
Desembolsado:	95.999.687,69
% Desembolsado:	96,00
Saldo:	4.000.312,31

Custo Total e Fonte

Original BID:	100.000.000,00
Corrente BID:	100.000.000,00
Pari-passu:	80,00
Cofinanciamento/País:	25.000.000,00
Original Estimado:	125.000.000,00
Período de Amortização (meses):	78

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B13

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

26-sep-2013


Validado pelo Representante do País:

30-sep-2013

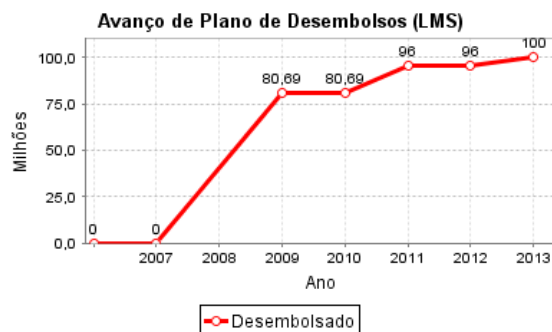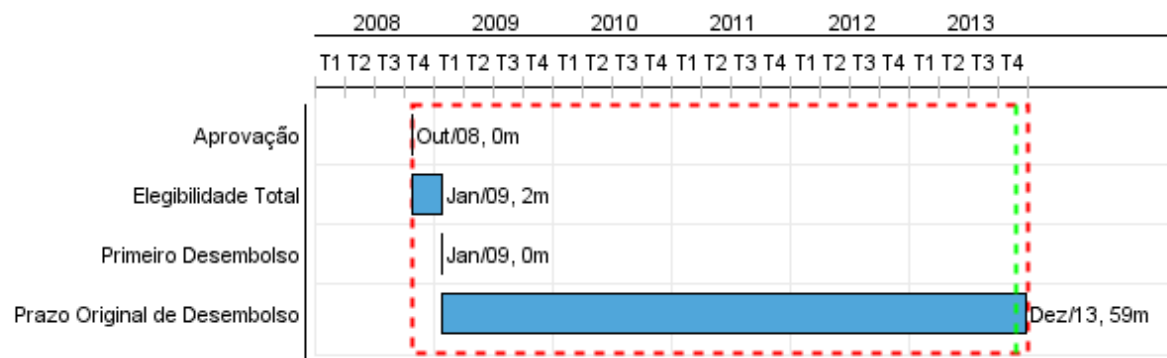

Progresso Acumulado até 2013

Progresso Acumulado

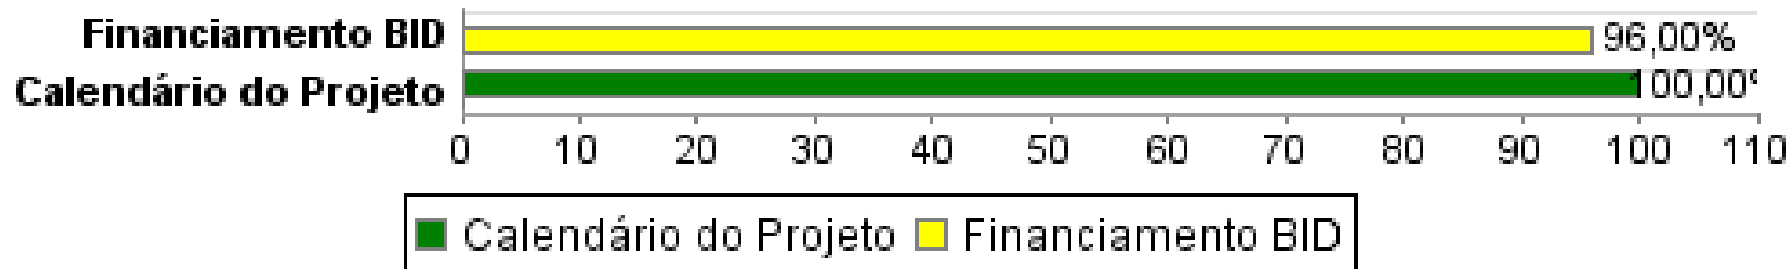

Resultados

Resultado: Valor del patrimonio vial a mantenido a un nivel óptimo

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Patrimonio Vial Optimo [Patrimonio Vial Actual (PVA)/Patrimonio Vial Medio (PVM)]	Indice	1,00	2008	P	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				A	1,07	1,07	1,08	1,08	

Resultado: Nivel de servicio de la red vial mantenido en guarismos adecuados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Nivel de Servicio	Indice	70,00	2008	P	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
				A	90,80	90,80	90,50	90,50	

Resultado: Cobertura del mantenimiento ampliada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Indice de Cobertura	Porcentaje	45,00	2008	P	90,00	90,00	90,00	180,00	90,00
				A		90,00	100,00	100,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Obras y mantenimiento					
Carreteras con contratos de mantenimiento por niveles de servicio vigentes	Kilómetros				1.440,00
Fortalecimiento Institucional					
Sistema de gestión instalado	Sistema				1,00
Consultoría de evaluación de desempeño					
Informes de consultoría de evaluación de desempeño presentados	Informes				4,00
Contingencias y escalamiento de obras.					
Contingencias y escalamiento de obras.	na				
