

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Ministerio de Transporte
Sector: TRANSPORTATION-SECONDARY ROADS
Número(s) de Préstamo: 1963/OC-CO
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 10.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 6.549.438,23
% Desembolsado: 65,49
Saldo: 3.450.561,77

Costo total y Fuente

BID Original: 10.000.000,00
Actual BID: 10.000.000,00
Pari-passu: 84,37
Co-financiamiento/País: 2.000.000,00
Estimado Original: 12.000.000,00
Período de Amortización (meses): 246




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Apr 14, 2011
Validado por Representante de País: Apr 15, 2011

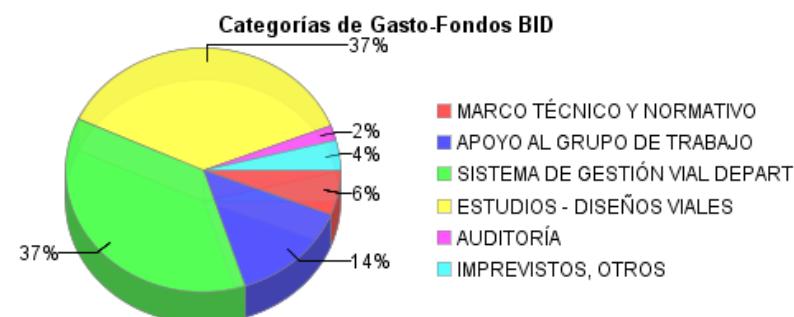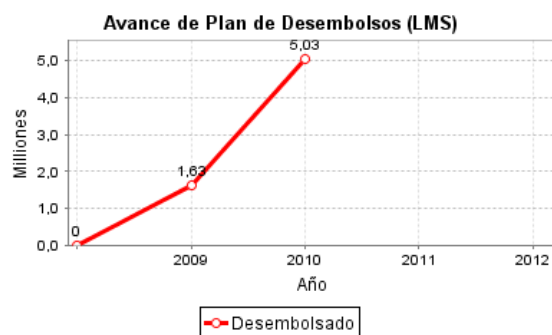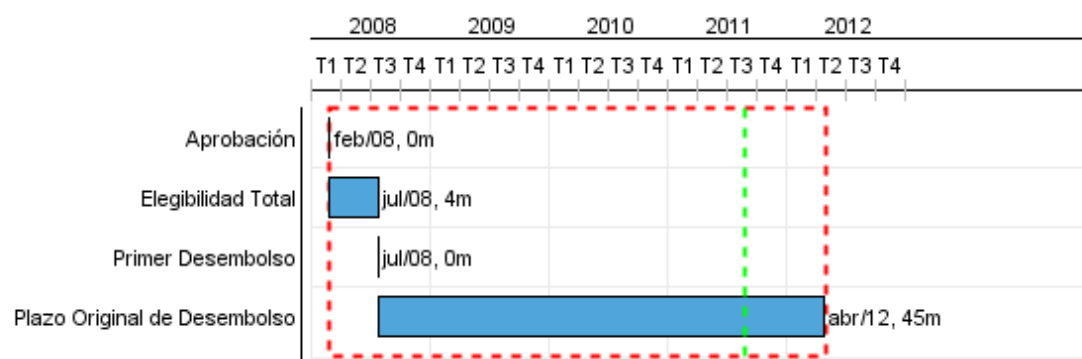

Progreso Acumulado al 2010

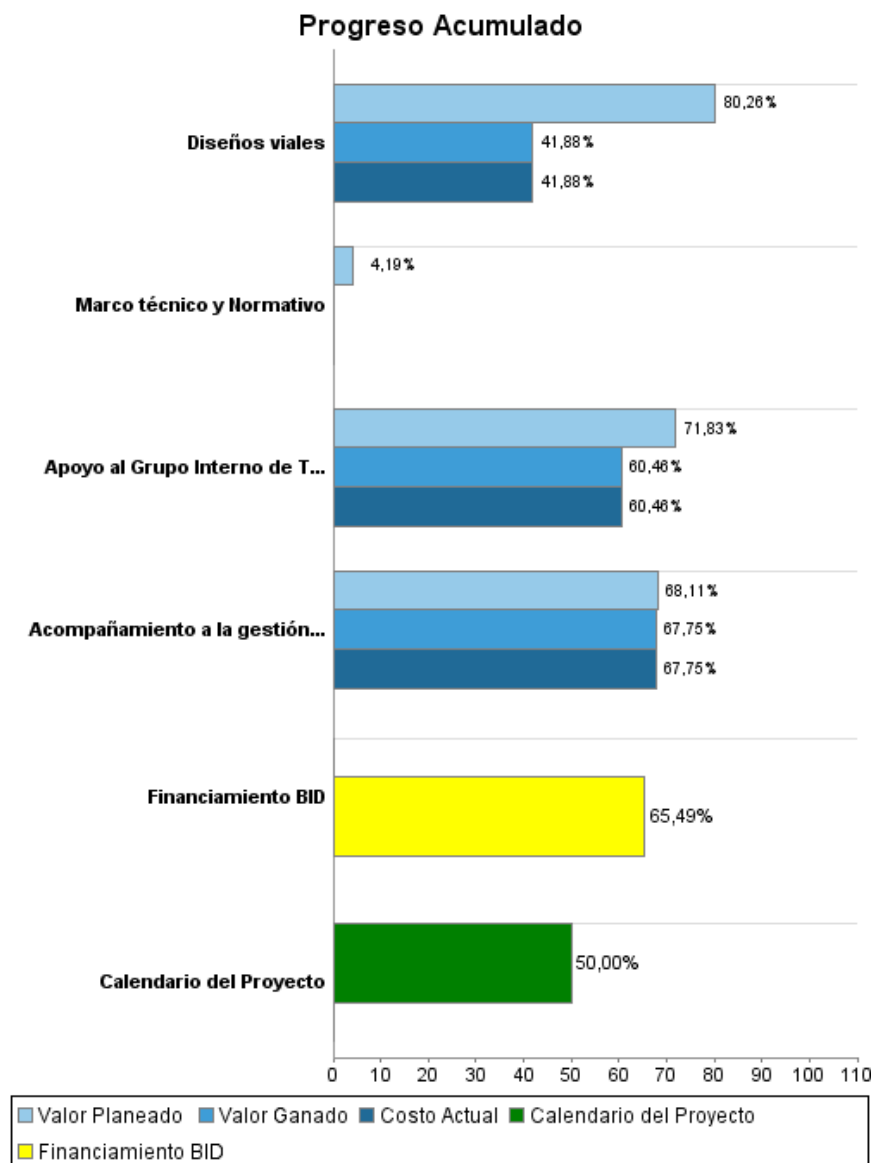

Resultados

Resultado:	Asistir al Ministerio de Transporte en el desarrollo de las herramientas técnicas e institucionales de gestión de la red vial secundaria
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2012	Fin de Proyecto
12 departamentos trabajan con el apoyo del MT en la mejora de la gestión vial a su cargo	departamentos	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos trabajan con apoyo del MT en la sostenibilidad del Sistema de Información Geográfico-SIG de su inventario vial	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos actualizan periódicamente sus planes viales regionales con asistencia técnica del MT	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos financian la ejecución de sus planes viales regionales con asistencia técnica del MT	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1022 - Programa Asistencia Técnica Ministerio de Transporte para la Ejecución Plan Vial
2010 2º periodo con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 07/04/2011

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Marco técnico y Normativo									
Marco técnico y Normativo	Marco				1,00	29.301,00			700.000,00
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo									
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo - GT	Numero de Profesionales		12,00		10,00	1.364.770,00	1.148.828,00		1.900.000,00
Acompañamiento a la gestión vial departamental									
Acompañamiento a la gestión vial departamental	Departamento s		22,00		22,00	3.201.200,00	3.184.183,00		4.700.000,00
Diseños viales									
Diseños viales	Departamento s		10,00		16,00	3.210.200,00	1.675.388,00		4.000.000,00
Gastos Administrativos									
TOTAL						7.805.471,00	6.008.399,00		11.300.000,00
