




Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: BANCO NACIONAL DE COSTA RICA		
Sector: EDUCATION-SECONDARY EDUCATION		
Número da Operação: 2824/OC-CR	Atual: 167.000.000,00	Original BID: 167.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 167.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: DR-L1007, RG-T2011, CR-T1092	Saldo: 167.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 167.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 11-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 15-abr-2013

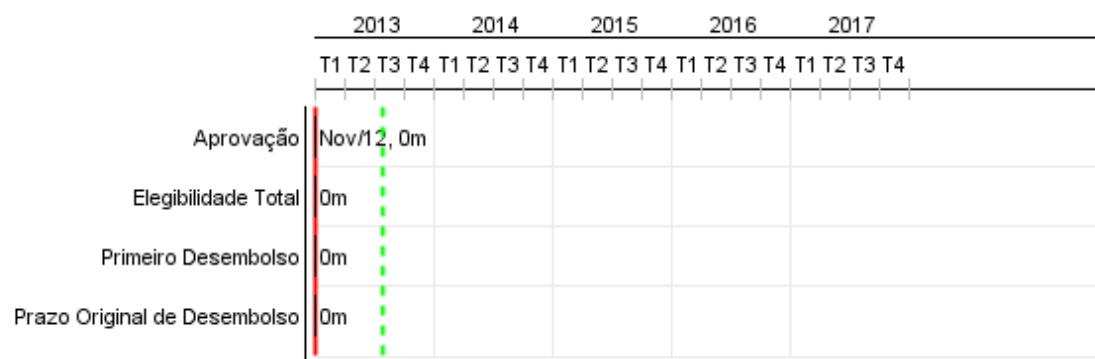

Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Melhorar el clima escolar en los establecimientos beneficiados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Mejora del índice de clima escolar en las instituciones educativas beneficiadas.	porcentaje		2013	P A	10,00

Resultado: Estudiantes de las escuelas beneficiarias con acceso a instalaciones recreativas, culturales y deportivas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Número de estudiantes con acceso a instalaciones recreativas, culturales y deportivas	Estudiantes		2011	P A	11.837,00

Resultado: Alumnos que reportan progreso escolar en las escuelas beneficiarias.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje de alumnos que reportan progreso escolar en las escuelas beneficiarias	porcentaje		2013	P A	5,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Construc y equipam esc primarias, esc educ especial e inst de enseñanza general									
Número de escuelas de primaria construidas y equipadas.	número de escuelas				13,00				23.594.013,00
Número de unidades pedagógicas (educación general básica completa, 1º a 9º) construidas y equipadas.	Número de unidades				2,00				3.571.640,00
Número de centros de educación especial construidos y equipados.	numero de centros				2,00				3.717.542,00
Número de cupos adicionales creados en escuelas existentes.	cupos				8.450,00				
Construcción y equipamiento de colegios de secundaria en áreas rurales y urbano marginales									
Liceos rurales que reemplazan centros de telesecundaria construidos y equipados.	Número de liceos				35,00				38.681.984,00
Colegios técnicos profesionales construidos y equipados.	número de colegios				5,00				28.266.956,00
Colegios de secundaria construidos y equipados	número de colegios				22,00				49.325.266,00
Número de cupos adicionales creados en colegios existentes y nuevos centros.	CUPOS				7.710,00				
Construcción de espacios culturales y deportivos									
Canchas multiusos construidas.	número canchas				24,00				8.870.016,00
Gastos Administrativos									
Costos financieros, administración, monitoreo e imprevistos.	N/A								10.972.583,00
TOTAL									167.000.000,00
