





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA				
Sector:	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION				
Loan Number(s):	2824/OC-CR	Current Approved Amount:	167.000.000,00	Original IDB:	167.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	167.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	DR-L1007, RG-T2011, CR-T1092	Balance:	167.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	167.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-abr-2013 Validated by Country Representative: 15-abr-2013

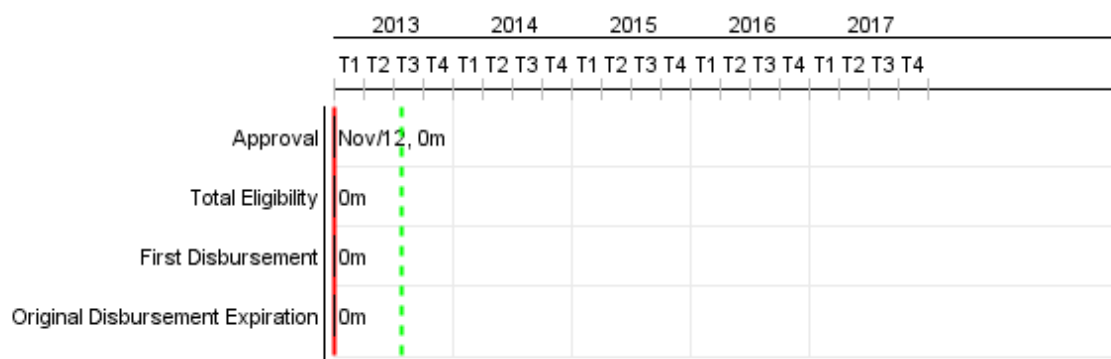

## Accumulated Progress as of 2012

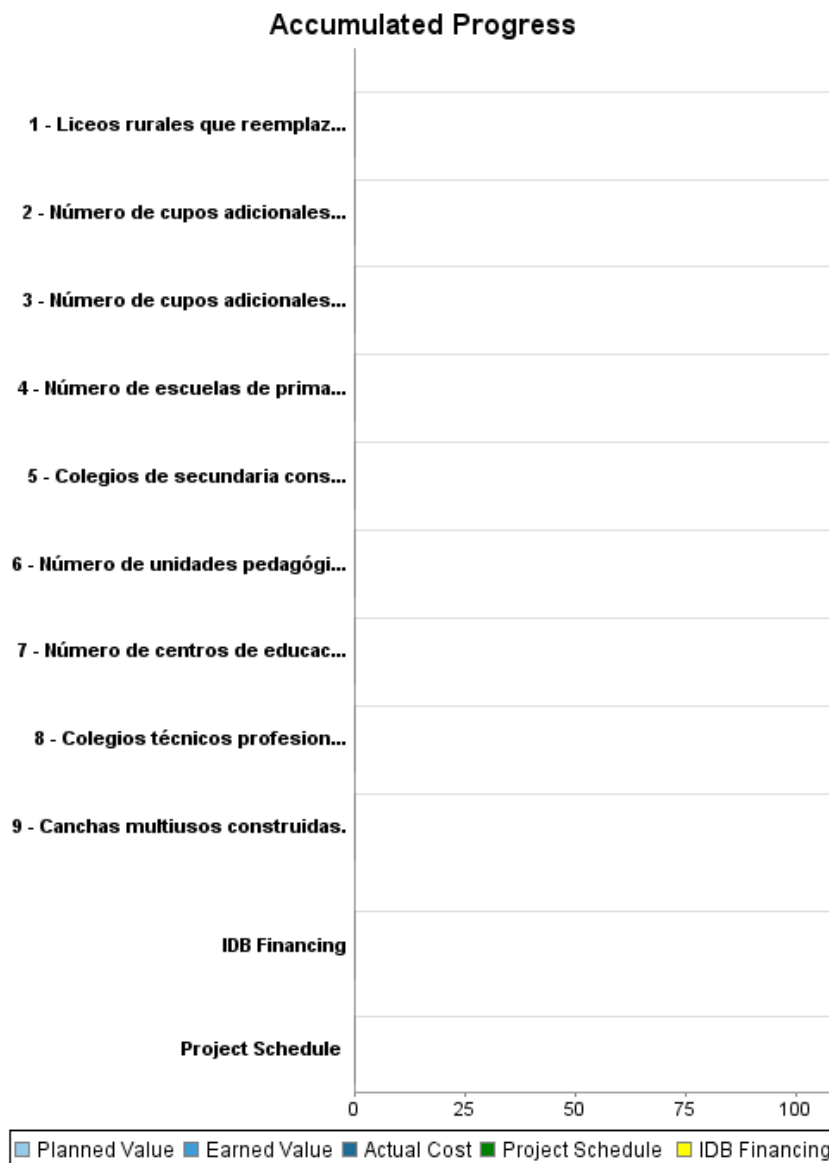

## Outcomes

**Outcome:** Mejorar el clima escolar en los establecimientos beneficiados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Mejora del índice de clima escolar en las instituciones educativas beneficiadas.	porcentaje		2013	P A	10,00

**Outcome:** Estudiantes de las escuelas beneficiarias con acceso a instalaciones recreativas, culturales y deportivas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Número de estudiantes con acceso a instalaciones recreativas, culturales y deportivas	Estudiantes		2011	P A	11.837,00

**Outcome:** Alumnos que reportan progreso escolar en las escuelas beneficiarias.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de alumnos que reportan progreso escolar en las escuelas beneficiarias	porcentaje		2013	P A	5,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Construc y equipam esc primarias, esc educ especial e inst de enseñanza general</b>									
Número de escuelas de primaria construidas y equipadas.	número de escuelas				13,00				23.594.013,00
Número de unidades pedagógicas (educación general básica completa, 1º a 9º) construidas y equipadas.	Número de unidades				2,00				3.571.640,00
Número de centros de educación especial construidos y equipados.	numero de centros				2,00				3.717.542,00
Número de cupos adicionales creados en escuelas existentes.	cupos				8.450,00				
<b>Construcción y equipamiento de colegios de secundaria en áreas rurales y urbano marginales</b>									
Liceos rurales que reemplazan centros de telesecundaria construidos y equipados.	Número de liceos				35,00				38.681.984,00
Colegios técnicos profesionales construidos y equipados.	número de colegios				5,00				28.266.956,00
Colegios de secundaria construidos y equipados	número de colegios				22,00				49.325.266,00
Número de cupos adicionales creados en colegios existentes y nuevos centros.	CUPOS				7.710,00				
<b>Construcción de espacios culturales y deportivos</b>									
Canchas multiusos construidas.	número canchas				24,00				8.870.016,00
<b>Gastos Administrativos</b>									
Costos financieros, administración, monitoreo e imprevistos.	N/A								10.972.583,00
<b>TOTAL</b>									<b>167.000.000,00</b>
